

**LIGJ**  
**Nr. 92/2018**

**PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS  
SË SHQIPËRISË, ISH-REPUBLIKËS JUGOSLLAVE TË MAQEDONISË DHE  
KOMISIONIT EVROPIAN PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT  
NDËRKUFITAR IPA II, ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË  
- REPUBLIKA E SHQIPËRISË, 2014–2020, ALOKIMET E VITIT 2017**

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

**KUVENDI**  
**I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË**

**VENDOSI:**

**Neni 1**

Ratifikohet marrëveshja e financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë, 2014–2020, alokimet e vitit 2017, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

**Neni 2**

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Miratuar në datën 3.12.2018

**Shpallur me dekret nr. 11003, datë 18.12.2018 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta**

**MARRËVESHJE FINANCIMI**  
**KUSHTET E VEÇANTA**

Komisioni Evropian, në vijim i referuar si “Komisioni” ose “Pala” e cila vepron në emër të Bashkimit Evropian, në vijim i referuar si “Bashkimi”,

nga njëra anë, dhe

ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, e përfaqësuar nga Sekretariati për Çështjet Evropiane dhe Republika e Shqipërisë e përfaqësuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; në vijim të referuar bashkërisht si “Përfituesit e IPA II” ose individualisht si “përfituesja e IPA II” ose “Pala”,

nga ana tjetër,

dhe bashkërisht të referuara si “Palët”,

kanë rënë dakord si më poshtë:

**Neni 1**

**Programi i Veprimit**

1. Bashkimi bie dakord të financojë dhe përfituesit e IPA II bien dakord të pranojnë financimin e lëvrimit për vitin 2017 të Programit të Veprimit në vijim, siç përshkruhet në shtojcën I:

Programi i Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar ndërmjet ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë për vitet 2015–2017

IPA/2017/038-164

Ky Program Veprimi financohet nga Buxheti i Bashkimit në bazë të aktit themelor në vijim: Instrumenti për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II)<sup>1</sup>.

2. Kostoja e përgjithshme e vlerësuar e lëvrimit për vitin 2017 të këtij Program Veprimi është 1 400

<sup>1</sup> Rregullorja nr. 231/2014 (BE) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 2014 që krijon një Instrument për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA II), OJ L 77, 15.3.2014, fq. 11.

000 euro dhe kontributi maksimal i Bashkimit për këtë Program Veprimi është caktuar në 1 190 000 euro.

Nuk kërkohet kontribut financiar nga përfituesit e IPA II.

#### Neni 2

##### **Periudha e ekzekutimit dhe periudha e zbatimit operacional**

1. Siç përcaktohet në nenin 1 (1) të shtojcës II, periudha e ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje Financimi është caktuar 12 vjet nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje Financimi.

2. Siç përcaktohet në nenin 1 (2) të shtojcës II, periudha e zbatimit operacional të kësaj Marrëveshjeje Financimi është caktuar 6 vjet nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje Financimi.

#### Neni 3

##### **Adresat dhe komunikimi**

I gjithë komunikimi në lidhje me zbatimin e kësaj marrëveshjeje financimi duhet të jenë në formë të shkruar dhe do t'i referohet shprehimisht Programit të Veprimit siç identifikohet në nenin 1 (1), dhe do të dërgohet në adresat e mëposhtme:

a) Për Komisionin:

Drejtoria e Përgjithshme e Fqinjësisë dhe Negociatave të Zgjerimit,  
15, Rue de la Loi  
B – 1049 Brussels  
Belgium (Belgjikë)  
Drejtoria D, e-mail: [NEAR-D@ec.europa.eu](mailto:NEAR-D@ec.europa.eu)

b) Për përfituesit e IPA II:

Sekretariati për Çështjet Evropiane,  
Quai Dimitar Vlahov No.4,  
1000 Shkup, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë,  
Tel: +389 (0)2 3200 105, Faks: +389(0)2 3114 569,  
e-mail: [cabinet@sep.gov.mk](mailto:cabinet@sep.gov.mk)

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Drejtoria e Fondeve të BE-së  
Bulevardi “Gjergj Fishta”, nr. 6  
Tiranë, Republika e Shqipërisë  
e-mail: [info@mfa.gov.al](mailto:info@mfa.gov.al)

#### Neni 4

##### **Pikat e kontaktit të Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF)**

Pika e kontaktit të përfituesit të IPA II që ka kompetencat e duhura për të bashkëpunuar drejtpërdrejt me Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF), në mënyrë që të lehtësojë aktivitetet operative të OLAF-it, do të jenë:

Snezana Petrovska, Shefe e Njësisë, “*Policia Financiare e Maqedonisë*”

Quai Dimitar Vlahov floor 4 No. 4  
1000 Shkup, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë  
e-mail: [suzana.petrovska@finpol.gov.mk](mailto:suzana.petrovska@finpol.gov.mk)

Drejtori i Njësisë së Inspektimit Financiar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë  
Republika e Shqipërisë  
e-mail: [dfip@financa.gov.al](mailto:dfip@financa.gov.al)

#### Neni 5

##### **Marrëveshjet Kuadër**

Programi i Veprimit do të zbatohet në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes Kuadër ndërmjet Komisionit Evropian dhe ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë mbi marrëveshjet për zbatimin e

ndihmës financiare të Bashkimit për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë nën Instrumentin e Ndhmës së Paraanëtarësimit (IPA II), e cila ka hyrë në fuqi më 24 qershor 2015 dhe në përputhje me dispozitat e Marrëveshjes Kuadër ndërmjet Komisionit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë mbi marrëveshjet për zbatimin e ndihmës financiare të Bashkimit në Shqipëri nën Instrumentin e ndihmës së Paraanëtarësimit (IPA II) që ka hyrë në fuqi më 16 prill 2015 (referuar në vijim si “Marrëveshja/et Kuadër”).

Kjo Marrëveshje Financimi plotëson dispozitat e Marrëveshjeve Kuadër të lartpërmendura. Në rast konflikti, nga njëra anë, e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje financimi dhe, nga ana tjetër, dispozitave të Marrëveshjes Kuadër përkatëse, kjo e fundit do të ketë përparësi.

#### Neni 6 Shtojcat

1. Kjo Marrëveshje Financimi përbëhet nga:
  - a) Këto Kushte të Veçanta;
  - b) Shtojca I: Programi i Veprimit të BNK-së, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë (Vendimi Zbatues i Komisionit C(2015) 5233 i datës 22.7.2015);
  - c) Shtojca IA: IPA II CBC 2014–2020 Programi ndërmjet ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë;
  - d) Shtojca II: Kushtet e Përgjithshme;
  - e) Shtojca III: Raporti Vjetor Model CBC për zbatimin e ndihmës IPA II në përputhje me nenin 80 të Marrëveshjes Kuadër;
  - f) Shtojca IIIA: Raporti Vjetor Tip për zbatimin e ndihmës IPA II në përputhje me nenin 58 të Marrëveshjes Kuadër.
2. Në rast të një konflikti, nga njëra anë, të dispozitave të shtojcave dhe nga ana tjetër, të dispozitave të këtyre Kushteve të Veçanta, këto të fundit do të kenë përparësi. Në rast të një konflikti, nga njëra anë, të dispozitave të shtojcës I dhe shtojcës IA dhe dispozitave të shtojcës II nga ana tjetër, këto të fundit do të kenë përparësi. Në rast konflikti ndërmjet dispozitave të shtojcës I, nga njëra anë dhe dispozitave të shtojcës IA nga ana tjetër, këto të fundit do të kenë përparësi.

#### Neni 7 Hyrja në fuqi

Kjo Marrëveshje Financimi do të hyjë në fuqi ditën që do të nënshkruhet nga pala e fundit.  
Kjo marrëveshje hartohet në gjuhën angleze në tri kopje, një kopje i dorëzohet Komisionit dhe një kopje secilit prej përfituesve të IPA II, jo më vonë se data 31 dhjetor 2018.

Për përfituesit e IPA II:

Bujar Osmani,

Zëvendës Kryeministër për Çështjet Evropiane dhe Koordinatori Kombëtar i IPA-s

Shkup

Datë:

Ditmir Bushati,

Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe

Koordinatori Kombëtar i IPA-s

Tiranë

Datë:

Për Komisionin:

Genoveva Ruiz Calavera

Drejtor pranë Drejtorisë së Përgjithshme, Drejtoria D,

Bruksel

Datë:

**SHTOJCA 1**  
**PROGRAMI I VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR NDËRMJET**  
**ISH-REPUBLIKËS JUGOSLLAVE TË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË**  
**PËR VITET 2015–2017**

**1. Identifikimi**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Përfituesit</b>                                                                                                                                                        | Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë<br>Republika e Shqipërisë                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CRIS/ABAC, Referencat e angazhimit</b><br><b>Kontributi i Bashkimit Buxheti</b>                                                                                        | EURO 1,700,000 22.02.04.01 2016/038-162<br>EURO 1,700,000 22.02.04.01 2016/038-163<br>EURO 1,190,000 22.02.04.01 2016/038-164                                                                                                                                              |
| <b>Mënyra e menaxhimit</b><br><b>Strukturat përgjegjëse</b>                                                                                                               | Menaxhim i drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian<br>Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë: Ministria e Vetëqeverisjes Vendore<br>Në Republikën e Shqipërisë: Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme                                                                |
| <b>Data përfundimtare për mbylljen e Marrëveshjes/ve të Financimit me vendet përfituese (trepalëshe) të IPA II</b>                                                        | Për angazhimin buxhetor të vitit 2015:<br>Në rastin më të vonë deri më 31 dhjetor 2016<br>Për angazhimin buxhetor të vitit 2016:<br>Në rastin më të vonë deri më 31 dhjetor 2017<br>Për angazhimin buxhetor të vitit 2017:<br>Në rastin më të vonë deri më 31 dhjetor 2018 |
| <b>Data përfundimtare për mbylljen e kontratave të prokurimit dhe granteve</b>                                                                                            | 3 vjet pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes së Financimit (nga nënshkrimi i palës së fundit) me përjashtim të rasteve të renditura në nenin 189 (2) të Rregullores Financiare                                                                                          |
| <b>Data përfundimtare për zbatimin operacional</b>                                                                                                                        | 6 vjet pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes së Financimit (nga nënshkrimi i palës së fundit).                                                                                                                                                                          |
| <b>Data përfundimtare për zbatimin e Marrëveshjes financiare</b><br>(data nga e cila ky program duhet të tërhiqet nga detyrimi dhe të mbyllet), pas pranimit të llogarive | 12 vjet pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes së Financimit (nga nënshkrimi i palës së fundit).                                                                                                                                                                         |
| <b>Njësia e Programimit</b>                                                                                                                                               | DG NEAR Njësia D3, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kosova                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Njësia zbatuese / Delegacioni i BE-së</b>                                                                                                                              | Delegacioni i Bashkimit Evropian për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë                                                                                                                                                                                               |

**2. Përshkrim i Programit të Veprimit**

**2.1 PËRMBLEDHJE E PROGRAMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR 2014–2020 DHE PROGRAMI I VEPRIMIT TË BNK-së 2015–2017**

Programi i BNK-së 2014–2020 i ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë - Republika e Shqipërisë (Vendimi Zbatues i Komisionit C(2014) 9674 i datës 11 dhjetor 2014). Programi i miratuar 2014–2020 përbën strategjinë e bashkëpunimit BNK për rajonin kufitar, duke përcaktuar, ndër të tjera, listën e zonave gjeografike të pranueshme, kontekstin e zonës, prioritetet e programit dhe ndarjen e buxhetit për periudhën 7-vjeçare.

2014–2020 Programet BNK shërbejnë, gjithashtu, si referencë për miratimin e programeve të veprimit të BNK-së. Programi i veprimit 2015–2017 i BNK-së synon sigurimin e ndihmës për bashkëpunim ndërkufitar në fushat tematike të parashikuara në programin 2014–2020 (siç tregohet në seksionin 2.2).

- Lista e zonave gjeografike të pranueshme në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë

Zona e Pelagonias: bashkitë e Bitolas, Demir Hisarit, Dolnenit, Krivogastanit, Krusevos, Mogilas, Novacit, Prilepit, dhe Resenit;

Zona e Pologut: bashkitë e Bogovinjes, Brvenicas, Gostivarit, Jegunovces, Mavrovës dhe Rostusas, Tearces, Tetovës, Vrapcistes dhe Zelinës;

Zona Jugperëndimore: bashkitë e Centar Zupas, Debarit, Debarcas, Kicevos, Makedonski Brod, Ohrit, Plasnicas, Strugës dhe Vevcanit.

Në Republikën e Shqipërisë:

Zona e Dibrës: rrethet e Bulqizës, Burrelit dhe Dibrës;  
 Zona e Elbasanit: rrethet e Cërrikut, Elbasanit, Gramshit, Librazhdit dhe Peqinit;  
 Zona e Korçës: rrethet e Devollit, Korçës, Kolonjës dhe Pogradecit.

- Bashkëpunimi ndërkufitar (BNK), konteksti i zonave përfituese.

1. Inkurajimi i turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore.

2. Rritjen e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve.

3. Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutja, parandalimi dhe menaxhimi i riskut

Prioriteti numër 1 bazohet në mundësitë e identifikuar strategjike në lidhje me rëndësinë në rritje të turizmit si një mundësi ekonomike ndërkohë që nxitet shkëmbimi kulturor dhe, promovimi i trashëgimisë natyrore do të ruajë dialogun mes njerëzve dhe dialogun e shoqërisë civile me institucionet.

Prioritet numër 2 nxitet nga nevoja dhe mundësitë dhe kërkon të zgjidhë nivelin e ulët të punësimit në zonën e Programit.

Prioriteti numër 3 synon t'u përgjigjet nevojave specifike të një prej sektorëve të politikave më të neglizhuara; të mjedisit dhe ndryshimit klimatik. Në kontekstin e BNK-së, kjo do të zgjidhë çështjen e nxitjes së ekonomisë së pastër dhe të gjelbër, përdorimin më të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore, elasticitetin e klimës në infrastrukturën e një shkalle të vogël mbështetëse (kundër përmbytjeve dhe zjarreve) dhe erozionit të tokës në zonën kufitare malore.

- Përmbledhje e përvojës së kaluar dhe asaj në vazhdim të BNK-së, përfshirë mësimet e nxjerra.

Rekomandimet kryesore nga vlerësimet e ndërmjetme dhe auditimet e programeve të BNK-së 2007–2013 janë marrë parasysh në zhvillimin e këtij programi. Kështu që, programet e BNK-së 2014–2020 janë më të fokusuar për sa i përket numrit të prioritetëve dhe zonave gjeografike të përfshira, gjë që do të ndihmojë në arritjen e rezultateve më të mira dhe rritjen e ndikimit. Përveç kësaj, zbatimi i programeve të BNK-së është thjeshtuar kryesisht nëpërmjet pasjes së një autoriteti të vetëm kontraktues dhe një zarfi të vetëm financiar për program.

## 2.2 PËRSHKRIMI DHE ZBATIMI I VEPRIMEVE

| Veprimi 1 | Operacionet e Bashkëpunimit Ndërkufitar | 4,590,000 EURO |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|
|-----------|-----------------------------------------|----------------|

### 1. Përshkrimi i veprimit, objektivat, rezultatet e pritshme

**Përshkrimi i veprimit:** Operacionet e Bashkëpunimit Ndërkufitar në rajonin kufitar në fushën e mjedisit; përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjen, parandalimin dhe menaxhimin e riskut; turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore; konkurrencës; zhvillimit të biznesit dhe NVM-ve, tregtisë dhe investimeve.

**Objektivat:** Zhvillimi socio-ekonomik dhe forcimi i marrëdhënieve të fqinjësisë në zonën ndërkufitare përmes implementimit të operacioneve të bashkëpunimit ndërkufitar me qëllim:

a) Mbrojtjen e mjedisit dhe nxitjen e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjen, parandalimin dhe menaxhimin e riskut, ndër të tjera, përmes; veprimeve të përbashkëta për mbrojtjen e mjedisit; nxitjes së përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, eficiencës së burimeve, burimeve të energjisë së rinovueshme dhe ndryshimin drejt një ekonomie të sigurt dhe të qëndrueshme me shkallë ndotjeje sa më të ulët; promovimit të investimeve për shmangien e rreziqeve specifike, duke siguruar elasticitet në raste katastrofash dhe zhvillimin e sistemeve të menaxhimit të fatkeqësive, si dhe gatishmërinë në rastet emergjente;

b) Inkurajimin e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore;

c) Rritjen e konkurrencës; rritjen e mjedisit të biznesit dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme; rritjen e tregtisë dhe investimeve, ndër të tjera, përmes, promovimit dhe mbështetjes së sipërmarrjes, në veçanti ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme; zhvillimin e tregjeve ndërkufitare dhe ndërkombëtarizimin;

### **Rezultatet e pritshme:**

a) Nxitja e ndërgjegjësimit dhe njohurive mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit;

Përmirësim i infrastrukturës që cenohet nga përmbytjet, erozioni i tokës dhe lëndët e djegshme;

b) Rritja e bashkëpunimit të ndërsjellë, mirëkuptimit dhe respektimit të trashëgimisë kulturore dhe vlerave; rritje të mundësive të biznesit për ofruesit e shërbimeve lokale dhe të operatorëve në fushën e turizmit;

c) Kritja e ndërgjegjësimit dhe kapacitetit të NVM-ve dhe fillestarëve për të trokitur në tregje të reja dhe rritja e zinxhirit të vlerave.

Programi i Veprimit BNK 2015–2017 do të kontribuojë në arritjen e objektivave të përgjithshëm dhe të rezultateve të pritshme, të përcaktuara në programin e BNK-së 2014–2020. Për hollësi të mëtejshme shihni seksionin 3.2 të programit BNK 2014–2020 (shtojca 2 e Vendimit Zbatues të Komisionit C (2014) 9674, i datës 11 dhjetor 2014).

## **2. Supozime dhe kushte**

Si një kusht i nevojshëm për menaxhimin efektiv të programit, vendet pjesëmarrëse do të krijojnë një Komitet të Përbashkët Monitorimi dhe të sigurojnë zyrat dhe personelin e përshtatshëm për Sekretariatit e Përbashkët Teknik (që do të krijohet me një Vendim Financimi të veçantë) dhe antenës, në rast se kjo e fundit do të ngrihet.

Dështimi për të përmbushur kërkesat e përcaktuara më sipër mund të çojë në tërheqjen e fondeve të këtij programi dhe/ose ri-alokimin e fondeve në të ardhmen.

## **3. Elementet thelbësore të veprimit**

**Thirrje për propozime - grante: 4,590,000 EURO**

a) Kriteret thelbësore të pranimit:

Aktivitetet e pranueshme janë përcaktuar në nenin 3.2 të shtojcës 2, të vendimit të Komisionit C (2014) 9674, të datës 11 dhjetor 2014. Lista e mëposhtme është një përmbledhje që tregon veprimet /operacionet kryesore të pranueshme:

- Projektimi, zhvillimi dhe promovimi i produkteve të përbashkëta turistike dhe shërbimeve, si dhe investimet e vogla në infrastrukturën publike të turizmit.

- Trajnimet për nxitjen e aftësive në industrinë e mikpritjes/turizmit.

- Restaurimi/rezervimi, ruajtja, pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore dhe historike, si dhe mjedisit rrethues.

- Mbështetja për aktivitete të përbashkëta kulturore.

- Ndihma për NVM-të dhe fillestarët në gjetjen e partnerëve të biznesit dhe internacionalizimin e tyre.

- Investimet në tregun e vogël ndërkufitar dhe lehtësirat në tregti.

- Nxitja dhe mbështetja e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit.

- Nxitja e investimeve në infrastrukturën e vogël për elasticitet në rast fatkeqësish dhe mbrojtjen e mjedisit.

Përfituesit duhet të jenë persona juridikë dhe të vendosur në një vend përfitues të IPA II, pjesëmarrës në programin e BNK-së.

Përfitues potencialë mund të jenë autoritetet vendore, njësitë ligjore të menaxhuara nga qeveritë vendore, shoqata të komunave, agjencitë e zhvillimit, organizatat e mbështetjes së bizneseve vendore, faktorët ekonomikë, si: NVM-të, organizatat kulturore dhe të turizmit, OJQ-të, organet publike dhe private në mbështetje të fuqisë punëtore, institucionet e trajnimit profesional dhe teknik, organet dhe organizatat për mbrojtjen e natyrës, organet publike përgjegjëse për menaxhimin e ujit, shërbimet e zjarrit/emergjencës, shkollat, kolegjet, universitetet dhe institucionet kërkimore, duke përfshirë institucionet e trajnimit teknik dhe profesional, dhomat e tregtisë, shoqatat e banorëve të vendeve të BNK-së, organizatat e fermerëve, ndërmarrjet publike.

b) Kriteri kryesor i përzgjedhjes është kapaciteti financiar dhe operacional i aplikantit.

c) Kriteret kryesore për dhënien e ndihmës janë rëndësia, efektiviteti dhe fizibiliteti, qëndrueshmëria dhe efektiviteti i kostos së veprimit.

d) Shkalla maksimale e bashkëfinancimit nga BE-ja për grante në bazë të thirrjeve është 85% e kostos së veprimit.

e) Shuma treguese e thirrjes/ve: 4,590,000 EURO

Strukturat përgjegjëse mund të vendosin të publikojnë më shumë se një thirrje për propozime. Çdo thirrje për propozime duhet të ketë të njëjtat: objektiva, rezultate, kërkesa thelbësore mbi papranueshmërinë, kritere përzgjedhjeje dhe dhënieje, siç përshkruhet më sipër. Secila kontratë granti do të financohet nga një urdhër buxhetor.

f) Datë treguese për publikimin e thirrjes/ve për propozime: Q3 2015 për urdhrin buxhetor të vitit 2015; Q2 2016 për urdhrat buxhetore të viteve 2016–2017.

### 3. Buxheti

| 2015                 |                         |                                                |                      | 2016                 |                        |                                               |                      | 2017                 |                        |                                               |                      | Vendimi i financimit total |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                      | Kontributi i bashkimit* | Bashkëfinancimi i përfituesit / ve të grantit* | Totali i shpenzimeve |                      | Kontributi i bashkimit | Bashkëfinancimi i përfituesit / ve të grantit | Totali i shpenzimeve |                      | Kontributi i bashkimit | Bashkëfinancimi i përfituesit / ve të grantit | Totali i shpenzimeve |                            |
| Operacionet e BNK-së | 1.700.000               | 300.000                                        | 2.000.000            | Operacionet e BNK-së | 1.700.000              | 300.000                                       | 2.000.000            | Operacionet e BNK-së | 1.190.000              | 210.000                                       | 1.400.000            | 4.590.000                  |
| në %                 | 85                      | 15                                             | 100                  |                      | 85                     | 15                                            | 100                  |                      | 85                     | 15                                            | 100                  |                            |
| <b>TOTALI 2015</b>   | 1.700.000               | 300.000                                        | 2.000.000            | <b>TOTALI 2016</b>   | 1.700.000              | 300.000                                       | 2.000.000            | <b>TOTALI 2017</b>   | 1.190.000              | 210.000                                       | 1.400.000            | <b>5.400.000</b>           |

\* Kontributi i Bashkimit është llogaritur në raport me shpenzimet e lejuara, të cilat bazohen në totalin e shpenzimeve të pranueshme, duke përfshirë shpenzimet publike dhe private. Shkalla e bashkëfinancimit të Bashkimit për çdo prioritet nuk duhet të jetë më pak se 20% dhe jo më e lartë se 85% e shpenzimeve të lejueshme.

\*\* Bashkëfinancimi i prioriteteve do të sigurohet nga përfituesit e granteve. Përfituesit e grantit duhet të kontribuojnë me një minimum prej 15% të kostos totale të lejueshme të projektit.

#### **4. Zbatimi**

##### **4.1 MËNYRA E ZBATIMIT DHE RREGULLAT E PËRGJITHSHME PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT DHE DHËNIES SË GRANTIT**

###### **MENAXHIMI I DREJTPËRDREJTË:**

Ky program do të zbatohet me menaxhim të drejtpërdrejtë nga Komisioni / nga delegacionet e Bashkimit në përputhje me nenin 58 (1) (a) të Rregullores Financiare dhe dispozitave përkatëse të Rregullores së Zbatimit.

Prokurimi do të bëhet në zbatim të dispozitave të pjesës së dytë, titullit IV, kapitullit 3 të Rregullores Financiare nr. 966/2012 dhe pjesën II, titullin II, kapitullin 3 të Rregullores së vet të Zbatimit.

Dhënia e grantit do të bëhet në zbatim të dispozitave të pjesës së dytë, titullit IV, kapitullit 4 të Rregullores Financiare nr. 966/2012 dhe pjesës II, titullit II, kapitullit 4 të Rregullores së vet të Zbatimit.

Sipas Rregullores Financiare pjesa një dhe tre e Rregullores Financiare të zbatohen për veprimet e jashtme, përveç kur parashikohet ndryshe në pjesën e dytë, titulli IV.

Komisioni mund të përdorë, gjithashtu, edhe shërbimet dhe materialet nga kontratat e saj Kornizë të përfunduara sipas pjesës I të Rregullores Financiare.

###### **5. Marrëveshjet e Monitorimit të Performancës**

Si pjesë e kornizës së tij të matjes së performancës, Komisioni do të monitorojë dhe vlerësojë progresin drejt arritjes së objektivave specifike të përcaktuar në Rregulloren e IPA II në bazë të treguesve të paracaktuar, të qartë, të matshëm e transparente. Progres raportet e përmendura në nenin 4 të Rregullores së IPA II do të merren si pikë referimi në vlerësimin e rezultateve të ndihmës IPA II.

Komisioni do të mbledhë nga të gjitha burimet të dhëna mbi performancën (procesin, treguesit e prodhimit dhe rezultateve), të dhëna që do të mbledhen dhe të analizohen në aspektin e matjes së progresit kundrejt objektivave dhe synimeve të përcaktuara për secilin nga veprimet e këtij programi, si dhe në Dokumentin Strategjik Indikativ.

Koordinatorët Kombëtarë të IPA-së (KKIPA-t) do të mbledhin informacion mbi performancën e veprimeve dhe programeve (procesin, treguesit e prodhimit dhe rezultateve) dhe të koordinojë grumbullimin dhe prodhimin e treguesve që vijnë nga burimet kombëtare.

Progresi i përgjithshëm do të monitorohet nëpërmjet mënyrave të mëposhtme: a) Sistem Monitorimi i Orientuar nga Rezultatet (MOR); b) Monitorimi i vetë përfituesve të IPA II; c) Vetëmonitorimi i kryer nga delegacionet e BE-së; d) Monitorimi i përbashkët i Drejtorisë së Përgjithshme të Negociatave të Fqinjësisë dhe Zgjerimit (NEAR) dhe Përfituesit të IPA II, ku pajtueshmëria, koherenca, efektiviteti, efikasiteti dhe koordinimi në zbatimin e ndihmës financiare do të monitorohet rregullisht nga një komision Monitorimi i IPA II, i mbështetur nga Komisioni i Përbashkët i Monitorimit, i cili do të sigurojë një proces monitorimi në nivel programi.



## INSTRUMENTI I NDIHMËS SË PARAANËTARËSIMIT 2014–2020

### PROGRAMI IPA CBC

ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË – REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MIRATUAR MË 11.12.2014

#### Akronime

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CBC    | Bashkëpunimi Ndërkufitar                                                         |
| CfP    | Thirrje për Propozime                                                            |
| CSO    | Organizatë në Mbështetje të Komunitetit                                          |
| DG     | Drejtoria e Përgjithshme                                                         |
| ERE    | Autoriteti Kombëtar Rregullator i Energjisë Elektrike (Republika e Shqipërisë)   |
| EC     | Komisioni Evropian                                                               |
| EU     | Bashkimi Evropian                                                                |
| GBER   | Rregullorja e Përgjithshme e Bllokimit dhe Përjashtimeve (BE)                    |
| GDP    | Prodhimi i Brendshëm Bruto                                                       |
| GfA    | Udhëzimet për Aplikantët                                                         |
| GVA    | Vlera e Shtuar Bruto                                                             |
| HR     | Burimet Njerëzore                                                                |
| ICT    | Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit                                      |
| INSTAT | Instituti Statistikor i Republikës së Shqipërisë                                 |
| IPA    | Instrumenti i Ndihmës së Paraanëtarësimit                                        |
| JTF    | Task-Forca e Përbashkët                                                          |
| JTS    | Sekretariati i Përbashkët Teknik                                                 |
| KPI    | Treguesit Kryesorë të Performancës                                               |
| LFS    | Anketim mbi Fuqinë Punëtore                                                      |
| LP     | Partneri Udhëheqës (Parimi i Partnerit Udhëheqës)                                |
| LSMS   | Studimi për Matjen e Standardeve të Jetesës (Banka Botërore)                     |
| MIS    | Sistemi i Menaxhimit të Informacionit                                            |
| MoU    | Memorandum Mirëkuptimi                                                           |
| NACE   | Klasifikimi Statistikor i Aktiviteteve Ekonomike në Komunitetin Evropian         |
| NATO   | Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior                                      |
| NGO    | Organizatë joqeveritare                                                          |
| NIPAC  | Koordinatori Kombëtar i IPA-s                                                    |
| NSDI   | Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (Republika e Shqipërisë)          |
| NUTS   | Nomenklatura e Njërive Territoriale për Statistikat                              |
| OS     | Struktura Operative                                                              |
| PRAG   | Udhëzime Praktike të Procedurave të Kontraktimit për Veprimet e Jashtme të KE-së |
| RDI    | Kërkimi shkencor, Zhvillimi dhe Inovacioni                                       |
| SBA    | Akti për Biznesin e Vogël (EU)                                                   |
| SME    | Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme, duke përfshirë Firmat e Vogla                  |
| OMC    | Metoda e Hapur e Koordinimit për Mbrojtjen Sociale dhe Përfshirjen Sociale (BE)  |
| SWOT   | Analiza e Pikave të Forta, Pikave të Dobëta, Mundësive dhe Kërcënimeve           |
| TP     | Prioritet Tematik                                                                |

## *cross-border programme*



*the former Yugoslav Republic of Macedonia - Albania*

### **Përmbledhje**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titulli i programit                  | Programi BNK: ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Republika e Shqipërisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zona e programit                     | Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë: Pellagoni, Pollog, Jugperëndimi<br>Republika e Shqipërisë: Dibër, Elbasan, Korçë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objektivi i përgjithshëm i programit | Të stimulojë një zhvillim më të ekuilibruar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në aspektin social-ekonomik, në zonën kufitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prioritetet tematike të programit    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore (TP4)</li><li>2. Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve (TP7)</li><li>3. Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut (TP2)</li><li>4. Asistenca Teknike</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objektivat specifikë të Programit    | <p>TP 1: Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore</p> <p>OS 1: Potenciali i turizmit është zhvilluar nga promovimi i trashëgimisë dhe vlerave kulturore</p> <p>TP 2: Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve</p> <p>OS 2: Kapaciteti produktiv i NVM-ve dhe aksesit i tyre në tregje janë forcuar</p> <p>TP 3: Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut</p> <p>OS 3: Ndërgjegjësimi për një ekonomi të gjelbër, mjedis të pastër dhe ndryshimet klimatike është rritur</p> <p>Asistenca Teknike</p> <p>Zbatimi efektiv, efikas, transparent dhe në kohë i programit, dhe rritja e ndërgjegjësimit</p> |
| Alokimi financiar 2014–2020          | 11 900 000.00 EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metoda e zbatimit                    | Menaxhim i drejtpërdrejtë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autoriteti                           | Delegacioni i Bashkimit Evropian në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Kontraktues

|                                                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoritetet përkatëse nga pjesëmarrësit, përfitues të IPA II | Ministria e Vetëqeverisjes Lokale (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë)<br>Ministria e Integritetit Evropian (Republika e Shqipërisë) |
| JTS/Antena                                                   | JTS në Strugë, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë<br>Antena në Elbasan, Republika e Shqipërisë                                       |

## SEKSIONI 1 PËRMBLEDHJE E PROGRAMIT

Programi për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Malit të Zi (MZ) dhe Shqipërisë (AL) do të zbatohet në kuadrin e Instrumentit të Asistencës së Paraanëtarësimit (IPA II). IPA II mbështet bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, nxitjen e integritetit në Bashkimin Evropian dhe promovimin e zhvillimit social ekonomik. Dispozitat ligjore për zbatimin e tij janë të përcaktuara në pjesët e mëposhtme të legjislacionit:

- Rregullorja (BE) nr. 231/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 2014, për krijimin e Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II);

- Rregullorja (BE) nr. 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 2014, që përcakton rregullat dhe procedurat e përbashkëta për zbatimin e instrumenteve të Bashkimit Evropian për financimin e veprimit të jashtëm;

- Rregullorja Zbatuese e Komisionit të BE-së nr. 447/2014 e datës 2 maj 2014, mbi rregullat specifike për zbatimin e rregullores IPA II.

### 1.1 Përmbledhje e Programit

Ky Program Bashkëpunimi Ndërkufitar mbulon periudhën 2014–2020 dhe lidhet me Perspektivën e Re Financiare të Komunitetit Evropian. Ai është hartuar mbi bazën e një analize të hollësishme të situatës në zonën e programit

Zona kufitare e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë – Republikës së Shqipërisë përbën një nga zonat më të varfra dhe me më pak mundësi dhe kushte të favorshme për zhvillim social-ekonomik në të gjithë kontinentin evropian, për shkak të karakterit rural, malor dhe të largët të Zonës BNK. Përveç kësaj, situata aktuale e zhvillimit të Zonës së Programit është rrjedhojë e një sërë faktorësh historikë, demografikë, politikë, gjeografikë dhe ekonomikë, të cilët nuk mund të kapërcehen në një periudhë kohore të shkurtër.

Ndërhyrja dhe aktivitetet e propozuara rrjedhin nga “grupi i problemeve” e kombinuar me analizën strategjike të bilancit dhe burimet e kufizuara të Programit. Ajo synon të trajtojë nyjat problematike më të rëndësishme dhe mundësitë strategjike të identifikuara nëpërmjet analizës social-ekonomike dhe SWOT, përkatësisht:

1. Nivelet e ulëta të aktivitetit ekonomik së bashku me mospërputhjen e kërkesës dhe ofertës në tregun e punës;

2. Infrastrukturën e pazhvilluar dhe të vjetërsuar; dhe

3. Potencialet në zhvillimin e turizmit dhe shkëmbimin kulturor.

Realisht nuk pritet që **Zona e Programit** të rritet shpejt, edhe pse **po shkon drejt një zhvillimi social-ekonomik më të balancuar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm** përmes testimit të instrumenteve dhe zgjidhjeve reja, duke mësuar nga rajone të tjera dhe duke mobilizuar dhe shfrytëzuar potencialin e brendshëm. Kjo mund të çojë në standarde më të larta të jetesës, vetëbesim dhe siguri sociale.

Programi përqendrohet në tri prioritetet tematike të Rregullores IPA II që rrjedhin nga analiza e nevojave-mundësive. Përkatësisht, këto janë:

1. Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore (i nxitur nga mundësitë);

2. Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve (i nxitur nga nevojat dhe mundësitë);

3. Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut (i nxitur nga nevojat).

Programi BNK përfshin e një prioritet mbi Asistencën Teknike.

### 1.2 Përgatitja e programit dhe përfshirja e partnerëve

Procesi i programimit të këtij Programi IPA II BNK për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë

dhe Republikën e Shqipërisë filloi në korrik të vitit 2013. E gjithë rrjedha e programimit u bazua në përvojën e përbashkët të procesit që ishte zhvilluar në periudhën 2007–2013.

Zhvillimi i këtij dokumenti të Programit u drejtua nga Task-Forca e përbashkët e përbërë nga përfaqësues të dy Strukturave Operative, delegatët e zyrës së NIPAC në të dyja vendet, përfaqësues të rajoneve të Zonës së Programit NUTS-3 dhe disa njësi vetëqeverisëse. Puna e JTF u lehtësua dhe mbështet nëpërmjet Projektit të Asistencës Teknike CBIB+, financuar nga BE-ja, i cili solli praktikën më të mirë ndërkombëtare në këtë proces.

Sesionet e punës së SO dhe JTF u realizuan në të gjithë fazën e programimit, në mënyrë që të siguronin komunikim efektiv për të identifikuar prioritetet tematike për t'u trajtuar në strategjinë e zhvillimit të Zonës së Programit dhe për ngritjen e strukturave të përshtatshme të zbatimit dhe monitorimit. Përveç konsultimeve midis dy OS-ve, në kuadër të lehtësimit të të mësuarit dhe rrjetëzimit nën Projektin CBIB+, u zhvilluan:

| <b>Data/vendi</b>             | <b>Aktiviteti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18.7.2013, Strugë</b>      | Takim i Strukturave Operative: identifikimi i sfidave dhe çështjeve kryesore; shkurtimi fillestar i listës së Prioriteteve Tematike dhe marrëveshja për analizën SWOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>23.9.2013, Shkup</b>       | Takimi i parë me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, Delegacionin e Bashkimit Evropian, ekipin e programimit dhe pikën e kontaktit kombëtare në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>27.9.2013, Tiranë</b>      | Trajnim mbi zhvillimin dhe formulimin e strategjisë: 14 pjesëmarrës (OSs, JTF, JTS, CBIB+): shpjegimi i procesit të programimit të IPA II CBC, diskutimi i mësimave të nxjerra nga programi/et aktual/e, planifikimi hap pas hapi (analiza e situatës, gjetjet kryesore (SWOT, nevojat), bërja e zgjedhjeve strategjike – zgjedhja e prioritetëve, përcaktimi i prioritetëve, treguesit dhe objektivat), kontrolli i logjikës së ndërhyrjes, çështjet horizontale dhe ndërsektoriale. |
| <b>30.9.2013, Shkup</b>       | Trajnim mbi zhvillimin dhe formulimin e strategjisë: 21 pjesëmarrës (OSs, JTF, JTS, CBIB+): shpjegimi i procesit të programimit të IPA II CBC, diskutimi i mësimave të nxjerra nga programi/et aktual/e, planifikimi hap pas hapi (analiza e situatës, gjetjet kryesore (SWOT, nevojat), bërja e zgjedhjeve strategjike – zgjedhja e prioritetëve, përcaktimi i prioritetëve, treguesit dhe objektivat), kontrolli i logjikës së ndërhyrjes, çështjet horizontale dhe ndërsektoriale. |
| <b>4.10.2013, Shkup</b>       | Takim i Task-Forcës së përbashkët: reagime nga analiza SWOT fillestare, takimi me ekipin e Asistencës Teknike, diskutim mbi prioritetet tematike dhe logjikën e ndërhyrjes, hapat për të përfunduar dokumentin e Programit (14 pjesëmarrës).                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24.10.2013, Strugë</b>     | Takim i Task-Forcës së përbashkët: situata përfshirëse dhe analiza SWOT, konfirmimi i prioritetëve tematike dhe përzgjedhja fillestare e aktiviteteve dhe aksioneve; diskutimi mbi treguesit; alokimet financiare.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>7.11.2013, Tiranë</b>      | Takim i Task-Forcës së përbashkët: Diskutimi mbi Strategjinë e Ndërhyrjes së Programit dhe Aktivitetet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>21–22.11.2013, Beograd</b> | Forumi Rajonal Konsultativ CBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6.12.2013, Elbasan</b>     | Konsultim publik: u prezantua Dokumenti i Programit, si dhe procesi i zhvillimit të tij, zgjedhja e prioritetëve tematike dhe hapat e ardhshëm. Zgjedhja e prioritetëve tematike u konfirmua nga palët e interesuara (14 pjesëmarrës).                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11.12.2013, Tiranë</b>     | Takimi i Komitetit Monitorues të përbashkët: një temë e veçantë e rendit të ditës ishte prezantimi i procesit të programimit 2014–2020 midis ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë–Republikës së Shqipërisë para përfaqësuesve të JMC-së nga ministrinë e linjës së të dyja vendeve, përfaqësuesve të pushtetit vendor, EUD dhe OS-ve (36 përfaqësues).                                                                                                                             |
| <b>12.12.2013, Tiranë</b>     | Takim teknik me OS-në, DG ENLARG, EUD dhe CBIB +: u zhvillua diskutim mbi Strategjinë e Programit dhe programe të tjera CBC në zhvillim e sipër.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.12.2013, Pogradec</b> | Seminar i konsultimit publik paraprak: U prezantua Dokumenti i Programit te palët e interesuara, si dhe procesi i zhvillimit të tij, zgjedhja e prioriteteve tematike dhe hapat e ardhshëm. Zgjedhja e prioriteteve tematike u konfirmua nga palët e interesuara (11 pjesëmarrës). |
| <b>13.12.2013, Korçë</b>    | Seminar i konsultimit publik paraprak: u prezantua Dokumenti i Programit te palët e interesuara, si dhe procesi i zhvillimit të tij, zgjedhja e prioriteteve tematike dhe hapat e ardhshme. Zgjedhja e prioriteteve tematike u konfirmua nga palët e interesuara (13 pjesëmarrës). |
| <b>16.12.2013, Dibër</b>    | Seminar i konsultimit publik paraprak: u prezantua Dokumenti i Programit te palët e interesuara, si dhe procesi i zhvillimit të tij, zgjedhja e prioriteteve tematike dhe hapat e ardhshëm. Zgjedhja e prioriteteve tematike u konfirmua nga palët e interesuara (15 pjesëmarrës). |
| <b>14.3.2014, Strugë</b>    | Konferenca e konsultimit publik me pjesëmarrjen e palëve të interesuara nga të dyja vendet: Komenti mbi përmbajtjen teknike të ndërhyrjes së Programit dhe propozimi për ri-formulimin e aktiviteteve të Programit (54 pjesëmarrës).                                               |
| <b>31.3.2014, Strugë</b>    | Takimi i Sekretariatit të Përbashkët Teknik: diskutim mbi përmbajtjen e Programit (drafti i dytë), konsensus për ndërhyrjen, aksionet dhe aktivitetet që kanë vijuar nga aktivitetet e konsultimit publik, të mbajtura deri në këtë moment (20 pjesëmarrës).                       |
| <b>Maj 2014</b>             | Dorëzimi i draftit final të programit te Komisioni Evropian.                                                                                                                                                                                                                       |

Gjithashtu, partnerë të tjerë të rëndësishëm socialë dhe ekonomikë u ftuan të marrin pjesë aktivisht në procesin e programimit për Programin IPA CBC II për periudhën 2014–2020 midis ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë. Qëllimi i kësaj ishte i trefishtë:

1. Të informojë publikun e gjerë mbi gjendjen e përgatitjes së programit për bashkëpunimin ndërkufitar, duke përfshirë fushat orientuese të aktiviteteve të pranueshme për t'u mbështetur në kuadrin e këtij programi;
2. Të kontribuojë për analizën SWOT dhe identifikimin e nevojave dhe mundësive prioritare për ndërhyrjet CBC; dhe
3. T'i ofrojë publikut të gjerë një mundësi për të shprehur mendimet e tyre dhe për të dhënë kontribut të vlefshëm në procesin e programimit. Konsultimi publik është organizuar para finalizimit të dokumentit të Programit.

Krahas atyre, parimi i partneritetit është zbatuar nëpërmjet konsultimeve individuale të koordinuara me mbi 80 organizata të shoqërisë civile, kryesisht për analizën SWOT dhe caktimin e prioriteteve tematike, si edhe nëpërmjet pjesëmarrjes së palëve kryesore të interesuara rajonale dhe lokale në seminarët konsultative.

## SEKSIONI 2 ZONA E PROGRAMIT

Mbulimi gjeografik dhe madhësia e zonës përfituese të Programit rrjedh nga asistenca e mëparshme IPA CBC për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikën e Shqipërisë, dhe mbulon tri rajone NUTS-3 në secilin nga vendet. Këto rajone janë të shënuara më poshtë.

| <b>Rajonet e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë</b> | <b>Madhësia e Zonës së Programit (km<sup>2</sup>)</b> | <b>Zona e Programit si % e madhësisë së shtetit</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pellagonia                                               | 4,717                                                 | 18.3                                                |
| Jugperëndimi                                             | 3,340                                                 | 13.0                                                |
| Pollogu                                                  | 2,416                                                 | 9.4                                                 |
| <b>TOTALI</b>                                            | <b>10,473</b>                                         | <b>40.7</b>                                         |

| <b>Rajonet e Republikës së Shqipërisë</b> | <b>Madhësia e Zonës së Programit (km<sup>2</sup>)</b> | <b>Zona e Programit si % e madhësisë së shtetit</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Korça                                     | 3,711                                                 | 12.9                                                |

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| Dibra         | 2,586        | 9.0         |
| Elbasani      | 3,199        | 11.1        |
| <b>TOTALI</b> | <b>9,496</b> | <b>33.0</b> |

*Burimi: Zyra e Statistikave, INSTAT*

Madhësia e përgjithshme e Zonës Ndërkufitare në të dyja vendet është 19,969 km<sup>2</sup>. Rajonet e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë përbëjnë 52,5% dhe rajonet e Republikës së Shqipërisë përbëjnë 47.5% të madhësisë së zonës së bashkëpunimit ndërkufitar.

Gjatësia e kufirit midis të dyja vendeve që përfaqësojnë zonën e Programit është 191 km. Vija kufitare është e shumëllojshme: 151 km është kufi tokësor, 12 km është kufi në lumin Drin dhe 28 km i kufirit përshkon liqenin e Ohrit dhe Prespës.

Ka 4 pika të vendkalimeve kufitare ndërmjet ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë:

1. Nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, përmes Qafë Thanës, duke çuar në Pogradec, Librazhd dhe Elbasan;
2. Nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, përmes Tushemishtit, në skajin juglindor të liqenit të Ohrit, duke çuar në Pogradec;
3. Nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, përmes Bllatës, duke çuar në Peshkopi, Bulqizë dhe Burrel;
4. Nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, përmes Goricës, duke çuar në brigjet veriore të liqenit të Prespës.

Gjashtë rajonet që përbëjnë zonën e Programit kanë një popullsi prej 1,427,675 banorë, nga të cilët ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë përmban 54% të këtij numri, dhe Republika e Shqipërisë përmban 46% të tyre.<sup>2</sup>

- Rajonet e pranueshme në territorin e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë përfshijnë 27 komuna, ndërsa në territorin e Republikës së Shqipërisë janë 12 rrethe (me 17 komuna) që hyjnë në zonën e Programit. Këto janë të shënuara më poshtë.

Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë:

- **Rajoni i Pellagonisë** përfshin 9 komuna: Manastir, Demir Hisar, Dollnen, Krivogashtan, Krushevë, Mogilla, Novac, Prilep, dhe Resnjë;

- **Rajoni i Pollogut** përfshin 9 komuna: Bogovinjë, Bërvenicë, Gostivar, Jegunovcë, Mavrovë dhe Rostushë, Tearcë, Tetovë, Vrapçisht dhe Zhelinë;

- **Rajoni Jugperëndimor** mbulon 9 komuna: Qendër Zhupë, Dibër, Debarcë, Kërçovë, Brod, Ohër, Plasnicë, Strugë dhe Vevçan.


Në Republikën e Shqipërisë:

- **Qarku i Dibrës** përfshin rrethet: Bulqizë, Burrel dhe Dibër;

- **Qarku Elbasan** përfshin rrethet Cërrik, Elbasan, Gramsh, Librazhd dhe Peqin;

- **Qarku Korçë** përfshin rrethet Devoll, Korçë, Kolonjë dhe Pogradec.

<sup>2</sup> Deri në fund të vitit 2012; burimi: INSTAT dhe Zyra Shtetërore e Statistikave

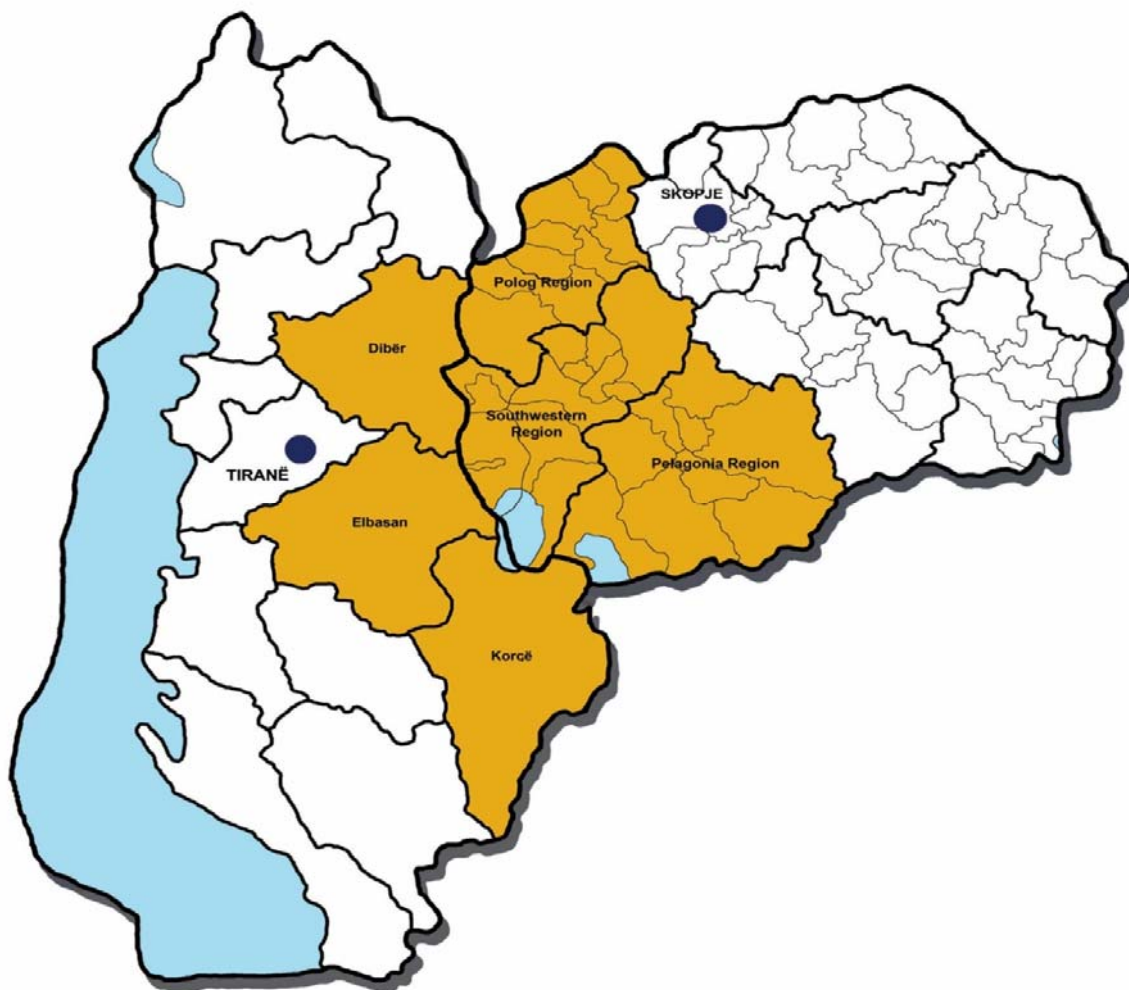

## 2.1 Analiza e Situatës – Përmbledhje

Zona e Programit karakterizohet nga burime të pasura natyrore, diversitet etnik dhe kulturë e ngjashme, por me gjuhë të ndryshme të folura. Megjithatë, më e rëndësishmja është se zonat kufitare në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikën e Shqipërisë shfaqin trashëgimi të ndryshme ekonomike, që përcakton arsyetimin dhe potencialin për bashkëpunim ndërmjet njerëzve dhe institucioneve përtej kufirit për integrim dhe kohezion social dhe ekonomik më të mirë të rajonit.

Kjo përmbledhje bën dallimin ndërmjet aspekteve të përgjithshme dhe demografike, ekonomike dhe sociale të kohezionit, që frymëzojnë Strategjinë për ndërhyrjen e bashkëpunimit ndërkufitar 2014–2020, ndërsa një situatë më e hollësishme dhe analiza SWOT janë bashkëlidhur si shtojca në dokumentin e Programit.

### Aspektet e përgjithshme dhe demografike

**1. Natyra dhe mjedisi janë të pasura me male, fusha kodrinore të kryqëzuara me lumenj, lugina dhe liqene.** Kjo zonë përmban tri rezervuare të mëdha të ujit në rajon: liqenin e Ohrit, Prespës dhe Dibrës, të rrethuar nga një Park Kombëtar duke krijuar kështu **kushte të favorshme për zhvillimin e energjisë hidrike**, në të cilën të dyja vendet kanë investuar tashmë. Zonat ekologjikisht të ndjeshme janë të pajisura me mundësitë e zhvillimit të turizmit dhe **rajoni përmban gati gjysmën e pyjeve të të dyja vendeve.**

**2. Zona e Programit përmban dy korridore të transportit Panevropian:** Korridori VIII dhe Dega D e Korridorit X, të cilat hapin mundësi ekonomike përgjatë dy rrugëve të transportit, por, gjithashtu, krijojnë sfida në aspektin e mirëmbajtjes së mjedisit dhe infrastrukturës.

**3. Të dyja vendet shfaqin një nivel pothuajse të barabartë të zhvillimit ekonomik** dhe gëzojnë përmirësimin e vazhdueshëm në marrëdhëniet dypalëshe, si dhe rritje në shkëmbimin e mallrave dhe

shërbimeve. Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka marrë statusin e vendit kandidat në BE, ndërsa aplikimi i Republikës së Shqipërisë varet nga progresi i mëtejshëm i reformës së administratës publike dhe rishikimi i rregullave dhe procedurave parlamentare.

4. Të dyja vendet gëzojnë norma pozitive të rritjes natyrore, por numri i popullsisë po rritet më shpejt në Republikën e Shqipërisë se sa në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. **Megjithatë, me përjashtim të rajonit të Pollogut dhe atij Jugperëndimor, zona e programit po përjeton tendenca negative.** Të dyja vendet vuajnë nga migrimet e jashtme, të cilët mund të kontribuojnë në shpopullim. Indeksi mesatar i dendësisë së popullsisë është i ngjashëm në të dyja anët e kufirit, por shifra shumë të ulëta të dendësisë së popullsisë janë regjistruar në rrethet (prefekturat) e Dibrës dhe Korçës, të cilat tregojnë karakterin e tyre rural dhe periferik.

5. Popullsia në zonën e programit është relativisht e re (36 vjeç), por **Pellagonia me një moshë mesatare të popullsisë prej 40 vjeç, përbën dallim nga pjesa tjetër e rajonit.**

#### **Kohezioni Ekonomik**

6. Pabarazitë rajonale në të dyja vendet në aspektin e GDP-së për frymë, në përgjithësi konsiderohen të moderuara, por **zona e programit përmban rajone që në mënyrë të qartë mbeten prapa; këto janë: Pollogu në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Dibra në Republikën e Shqipërisë** (përkatësisht 47% dhe 62% e shifrave kombëtare).

7. **Struktura e ekonomisë e përcaktuar nga GVA është e ndryshme në të dyja anët e kufirit.** Ndërsa rajonet e Republikës së Shqipërisë mbështeten në bujqësi, pylltari, peshkim dhe tregjet me shumicë dhe pakicë, rajonet në territorin e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë mbështeten në industri, e cila është më e zhvilluar se në Shqipëri, ndërtim dhe tregjet e shërbimeve. **Megjithatë, këto nuk përkthehen në GDP shumë më të lartë për shifrat kapitale, dhe tregojnë nivele të ulëta të konkurrencës së këtyre sektorëve dhe industrive.**

8. **Konkurrenca e ulët është reflektuar në nivelet e ulëta të ndërkombëtarizimit të ekonomisë së zonës së Programit.** Vetëm Pellagonia në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Elbasani në Republikën e Shqipërisë, dëshmojnë një pozicion të shquar në tregun e jashtëm, kryesisht për shkak të industrisë minerare, ndërsa rajonet e tjera luajnë rol të parëndësishëm.

9. **Sipërmarrja** e dëshmuar nga dendësia e SME-ve në raport me dendësinë e popullsisë është **në nivele shumë të ulëta**, e cila është një çështje e shqetësimit të lartë. **Rregullat administrative** të komplikuar dhe afatgjatë **për tregtinë e jashtme** konsiderohen si burokraci, duke penguar mundësitë e tregtisë.

10. **Shkalla e punësimit është e ulët në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në mënyrë të konsiderueshme më e lartë në Republikën e Shqipërisë**, por për këtë të fundit shkalla e punësimit të lartë rezulton nga niveli minimal i jetesës dhe nga prodhimi bujqësor në shkallë të ulët, i cili siguron një formë të sigurimeve shoqërore për pjesën më të madhe të popullsisë rurale, dhe shërben si amortizator kundër normave të larta të papunësisë së regjistruar.

11. Zona e programit ka **potencial të lartë turistik**, por këto mundësi janë përqendruar kryesisht në anën e kufirit të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë.

12. **Ekonomia rurale është e fragmentuar, por në një shkallë më të lartë në zonën e programit në Republikën e Shqipërisë** dhe pronarët e vegjël bujqësorë kanë vështirësi për të hyrë në treg. Prodhimi është mesatarisht i larmishëm dhe gama e prodhimeve kryesore bujqësore në të dyja anët e kufirit është më shumë plotësuese sesa konkurruese.

13. **Infrastruktura e transportit është e pazhvilluar dhe kjo lidhet si me rrugët lokale, edhe me rrugët kryesore të Korridorit VIII.**

#### **Kohezioni social**

14. **Zona e programit përmban pakica etnike të konsiderueshme: shqiptarë, romë, turq dhe të tjerë.**

15. **Nivelet e papunësisë janë shumë të larta për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe relativisht të ulëta në Republikën e Shqipërisë.** Për këtë të fundit, kjo dukuri është shkaktuar nga punësimi i lartë (kryesisht informal) në pronat bujqësore.

16. **Pagat neto të punonjësve janë në nivele të ngjashme.**

17. **Zona e Programit në Republikën e Shqipërisë përjeton përjashtim digjital.** Përdorimi i kompjuterëve dhe i Internetit është në nivele të ulëta të papranueshme.

18. **Aksesi në arsimin fillor është i balancuar, por ka një sforcim të dëshmuar në arsimin e mesëm në**



rajonin e Dibrës. Kjo prefekturë, gjithashtu, **pëson shkallën më të lartë të largimit të popullsisë me arsim të lartë në të gjithë zonën e Programit.**

**19. Nuk ka të dhëna specifike mbi RDI, por praktikisht mungon bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të arsimit në të dyja vendet dhe fusha e hulumtimit, zhvillimit dhe inovacionit nuk është eksploruar.**

**20. Niveli i ulët i menaxhimit të mbetjeve, i çiftëzuar me intensitetin e lartë të minierave, janë një shqetësim i madh mjedisor.** Kjo lidhet me përdorimin e mbetjeve të ngurta dhe mungesën e trajtimit të ujërave të zeza në pjesën më të madhe të zonës së programit.

21. Organizatat e shoqërisë civile janë të pranishme në zonën e programit, megjithatë pozita e tyre financiare është e dobët. Përveç kësaj, **OJQ-të në Republikën e Shqipërisë** hasin vështirësi me procedurën e regjistrimit, dhe si pasojë **legjitimiteti i tyre është penguar.**

**22. Infrastruktura e kujdesit shëndetësor është e pazhvilluar dhe veçanërisht në zonën e programit të Republikës së Shqipërisë, është e vështirë për të përfituar nga ky shërbim.**

## 2.2 Gjetjet kryesore

**Analiza social-ekonomike e kombinuar me vlerësimin e analizës SWOT identifikoi nyjat kyçe problematike për zonën e programit. Këto janë:**

- Nivele të ulëta të aktivitetit ekonomik (performancës dhe produktivitetit);
- Lidhur me këtë ka mospërputhje të kërkesës dhe ofertës në tregun e punës;
- Qasje e pa strukturuar në investimet publike dhe aktivitetet e përbashkëta për mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimin.

Tre nyjat kryesore problematike janë ndarë më tej në nën-nyja për të reflektuar rrjedhën e marrëdhënies shkak-pasojë që ofron një kontekst strategjik dhe arsyetimin për zonat e ndërhyrjes CBC. Grupi logjik i problemit (ose vendimit) është përshkruar më poshtë.

Përveç këtyre nyjave strategjike, **kapaciteti i ulët institucional i njësive të vetëqeverisjes lokale dhe organizatave të shoqërisë civile paraqitet si një problem thelbësor ndërsektorial dhe çështje shumë problematike, e cila manifestohet në planifikimin e mangët dhe alokimin e burimeve të kufizuara.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| MOSPËRPUTHJE<br>NË TREGUN E<br>PUNËS                                                                                                                                                                                                                                                      | NIVELI ULËT I<br>PERFORMANCËS<br>EKONOMIKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INVESTIM<br>PUBLIK I<br>ULËT DHE I<br>PAFOKUSUAR                                                                                                                                                                                          | KAPACITETE<br>TË ULËTA<br>ADMINISTRATIVE | NYJA<br>PROBLEMATIKE                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Nivel i ulët i edukimit</li><li>- Mungesë universitetesh ose akses i kufizuar në to</li><li>- Mungesë e të mësuarit të vazhdueshëm</li><li>- Aftësi të vjetërsuara</li><li>- Marrëdhënie më të ulëta midis edukimit dhe tregut të punës</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Teknologji e vjetërsuar</li><li>- Mungesë akses në treg</li><li>- Aftësi të ulëta menaxhuese të bizneseve</li><li>- Mbijetesë e ulët e bizneseve të reja</li><li>- Akses i ulët në kapital</li><li>- Përpunim i ulët bujqësor</li><li>- Akses i kufizuar në shërbimet cilësore të biznesit</li><li>- Mungesë ndërgjegjësimi</li><li>- Mungesë e “mendimit sektorial”</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Strategji të pamjaftueshme</li><li>- Proces i pamjaftueshëm i vendim-marrjes</li><li>- Mungesë financimi</li><li>- Mungesë ndërgjegjësimi</li><li>- Vështirësi në hartimin e projekteve</li></ul> |                                          | SHKAQET<br>(PROBLEMET<br>RRËNJËSORE) |
| Infrastrukturë e pazhvilluar --- Rënie e cilësisë së jetesës --- Erozion i imazhit --- Rrezik për destabilitet                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | EFEKTET                              |
| Migrim i fuqisë punëtore                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Territore të prapambetur                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                      |
| Papunësi --- Fuqi e ulët blerëse --- Ekonomi Gri --- Mungesë pune                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |
| Rritje e ulët ekonomike                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |

Shkaqet (ose problemet rrënjësore) në tabelën e mësipërme janë identifikuar përmes analizës së situatës dhe analizës SWOT. Ato njihen si pikat që kanë karakter ndërsektorial apo ndërtematik, dhe kështu lidhen me tri prioritetet tematike për ndihmë për bashkëpunimin territorial siç janë identifikuar

në aneksin III të Rregullores së IPA II:

1. Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve;<sup>3</sup>
2. Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut;

**Përveç problemeve, turizmi dhe trashëgimia kulturore** janë identifikuar si një mundësi e rëndësishme ekonomike dhe një mjet për të rritur më tej kontaktet dhe shkëmbimin njerëz-për-njerëz. Kjo lidhet me një tjetër prioritet tematik për asistencën për bashkëpunim territorial në shtojcën III të Rregullores së IPA II, që është inkurajimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore.

Të gjitha prioritetet tematike janë renditur në mënyrë individuale nga palët e interesuara në procesin e programimit CBC (bashkitë, OJQ-të, ministrinë e linjës, shoqëritë e shërbimeve publike dhe subjektet e tjera publike etj.) sipas rëndësisë së perceptuar të tematikave dhe çështjeve.<sup>4</sup> Renditja paraqet një reagim të rëndësishëm të programimit që pasqyrohet në qasjen nga poshtë-lart dhe është ndërtuar mbi parimin e **partneritetit**. Megjithatë, kjo nuk i merr në konsideratë kufijtë e politikave dhe burimeve, të cilët janë aplikuar vetëm nëpërmjet mekanizmit dhe parimit të **koordinimit** (pjesa 3).

### SEKSIONI 3 STRATEGJIA E PROGRAMIT

Strategjia njeh prioritetet e komunikuar nga palët e interesuara të programit (seksioni 2.2) të cilat më pas janë përpunuar dhe paraqitur nga Strukturat Operative CBC dhe Task-Forca e Përbashkët në krye të përpjekjeve të programimit duke aplikuar parimin e **koordinimit**. Zgjedhjet strategjike janë bërë duke marrë parasysh parimet e mëposhtme mbizotëruese:

**Koherenca** - Prioritetet tematike nuk u ndryshuan dhe janë të njëjtët që janë komunikuar në shtojcën III të Rregullores IPA II, dhe përkatësisht në Dokumentin e Strategjisë Shumëkombëshe;

**Partneriteti** - Prioritetet e përshtatshme janë zgjedhur bazuar në reagimet e marra nga organizatat që përfaqësojnë autoritetet rajonale, lokale, urbane dhe autoritetet e tjera publike, partnerët shoqërorë dhe ekonomikë, si dhe shoqërinë civile, partnerët mjedisorë, organizatat joqeveritare dhe organizatat përgjegjëse për promovimin e barazisë;

**Përqendrimi** - Strategjia ofron një fokus të rëndësishëm dhe efikas të **burimeve të kufizuara** dhe të ndërhyrjes bazuar në specifikat sociale dhe ekonomike të zonës së programit që fokusohet në temat e përzgjedhura, dhe mbi objektivat dhe masat me një rëndësi të veçantë nga kohezioni social-ekonomik dhe perspektiva e dëshiruar e zhvillimit.

**Plotësueshmëria me Programin Kombëtar** – programi plotëson dhe përforcon strategjitë kombëtare, ashtu siç janë përcaktuar në Dokumentet e Strategjisë së Vendit, duke mbështetur bashkëpunimin rajonal dhe territorial.

3.1 Arsyetim - Arsyetimi për strategjinë e zgjedhur të ndërhyrjes

Përmbajtja e Strategjisë së propozuar rrjedh nga:

1. Analiza e situatës dhe analiza SWOT;
2. Nyjat problematike të identifikuara dhe mundësitë strategjike; dhe
3. Renditja e prioritetëve tematike sipas rëndësisë së tyre për zonën e programit: Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore, Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve, dhe Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut.

**Një zhvillim social-ekonomik më i balancuar, gjithëpërfshirës dhe i qëndrueshëm në zonën kufitare stimulohet.** Ky është titulli dhe objektivi i përgjithshëm i programit, duke pasur parasysh perspektivën afatmesme në ndërhyrjen e propozuar.

Programi synon të ketë sinerji me **objektivat specifike të IPA II** dhe **Dokumentet e Strategjisë së Vendit** në lidhje me: përkrahjen për zhvillimin e shoqërisë civile dhe dialogut social, nxitjen e punësimit dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor, përfshirjen sociale dhe ekonomike, dhe bashkëpunimin territorial.

<sup>3</sup> Të lidhura me punësimin (IP1) i cili do të konsiderohet si një çështje ndërsektoriale.

<sup>4</sup> Renditja u krye nëpërmjet pyetësorit individual SWOT që u plotësua nga aktorët kryesorë.

Tabela 1. Pasqyrë sintetike e justifikimit për përzgjedhjen e prioriteteve tematike

| Prioritetet tematike të zgjedhur                                                                                                                           | Justifikimi për zgjedhjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore (TP4, Rregullorja IPA II)</b>                                                                     | Bazohet në mundësitë strategjike të identifikuara që lidhen me rëndësinë në rritje të turizmit si një mundësi ekonomike, ndërsa nxitja e shkëmbimit kulturor dhe promovimi i trashëgimisë natyrore do të mbështesë nismat njerëzit për njerëz dhe dialogun ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve.                                                                                                                                      |
| <b>Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve (TP7, Rregullorja IPA II)</b>                                                                 | Synon të trajtojë nivelet e ulëta të punësimit në zonën e programit. Kjo do të trajtohet nëpërmjet përmirësimit të aksesit në tregje, rritjes së përdorimit të instrumenteve të TIK, duke përfshirë tregtinë elektronike dhe shfrytëzimin më efikas të mundësive të zinxhirit të vlerave në zonën kufitare.                                                                                                                                   |
| <b>Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut (TP2, Rregullorja IPA II)</b> | Synon t'i përgjigjet nevojave specifike të një prej sektorëve më të neglizhuar të politikave. Në kontekstin CBC ky prioritet do të trajtojë çështjet e promovimit të ekonomisë së pastër dhe të gjelbër, përdorimit më të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore, mbështetjen e infrastrukturës së elasticitetit klimatik në shkallë të vogël (kundër përmbytjeve dhe zjarreve) dhe erozionin e tokës në zonën kufitare malore. |

**Asistenca Teknike** do të sigurojë një menaxhim efikas të programit gjatë gjithë ciklit të jetës dhe zhvillimin e kapaciteteve të palëve të interesuara të programit. Alokimi financiar ndaj këtij prioriteti është 10% e buxhetit të programit.

Alokimi i buxhetit indikativ nëpër prioritetet tematike është një konsensus ndërmjet parimit të përqendrimit kombinuar me shpërndarjen e balancuar të fondeve. Rëndësi e veçantë i është dhënë edhe intensitetit të kapitalit të projekteve të mundshme dhe renditjes aktuale të prioriteteve tematike, ku turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore janë temat më të preferuara për mbështetje.

| Prioriteti tematik                                                                                                                 | Shpërndarja e buxhetit të fondeve të BE-së (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore (TP4)                                                                     | 31.5                                           |
| 2. Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve (TP7)                                                                 | 31.5                                           |
| 3. Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut (TP2) | 27.0                                           |
| 4. Asistenca Teknike                                                                                                               | 10.0                                           |
| TOTAL                                                                                                                              | 100                                            |

Parimi i **rritjes së mençur, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse** është i njohur si një çështje **ndërsektoriale** dhe është aplikuar në të gjitha prioritetet tematike të programit dhe në objektivat e tyre.

Gjithashtu, strategjia e propozuar **bazohet në gjetjet kryesore dhe rekomandimet e raportit të vlerësimit të draftit CBC ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë** për vitet 2007–2013. Prandaj, çështjet e mëposhtme merren në konsideratë:

- Mbështetja për projekte të vogla infrastrukturore të përbashkëta që nuk kërkojnë studime dhe projektme të sofistikuara dhe komplekse;
- Asistenca ndaj projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e studimeve dhe projekteve për financim nga burime të brendshme dhe donatorë të tjerë;
- Fokus strategjik për veprime më të fuqishme, të cilët synojnë të sjellin ndikim më të prekshëm;
- Përmirësimi dhe orientimi më strategjik i JTS nën Asistencën Teknike, veçanërisht në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve dhe rritjen e ndërgjegjësimit midis përfituesve të mundshëm të ndodhur në zonën e programit dhe jo jashtë saj, për të siguruar gatishmërinë e tyre për të aplikuar nën parimin e Partnerit Kryesor;
- Forcimi i rolit të koordinimit strategjik të SO-ve;

- Orientimi i JTS-ve drejt rrjeteve dhe ndarjes së përvojës së projektit ndërmjet organizatave nga zona e programit;

- Nxitja e një roli më aktiv të JTS-ve në monitorimin e programit dhe zhvillimin e mjeteve dhe manualeve të brendshme dhe për përdoruesit e jashtëm;

- Përmirësimi i planifikimit dhe zbatimit të operacioneve nga SPT-ja.

Rekomandimet dhe mësimet e nxjerra nga dy vlerësimet e ndërmjetme mbi programet CBC të fokusuara në strukturat qeverisëse dhe në ecurinë e ndihmës, janë marrë në konsideratë<sup>5</sup>:

- Dokumenti i programimit duhet të jetë subjekt i:

1. Konsultimeve publike dhe të pasqyrojë në mënyrë të qartë procesin e konsultimeve, duke përfshirë një pasqyrë të personave që morën pjesë dhe rezultatet e procesit të konsultimit;

2. Të përfshijë çështjet e ndërlidhura në të gjitha dokumentet e programimit; dhe

3. Të kryejë një vlerësim të bazuar në parashikime (që do të përfshihet në dokument).

- Në lidhje me çështjet organizative, strukturat e programimit duhet të:

1. Kryejnë një auditim të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe vlerësimin e nevojave për trajnim;

2. Transferojnë detyrat të JTS-të, duke përfshirë edhe përgatitjen për grantet e Asistencës Teknike;

3. Mbështesin zbatimin e sistemeve të monitorimit dhe vlerësimit.

### 3.2 Përshkrimi i Prioriteteve Tematike të Programit


Përshkrimi i secilit prioritet tematik (TP) është organizuar në formën e Fletës me të dhëna për Prioritet me përmbajtje dhe strukturë të njëjtë për secilin prioritet, ndërsa prioriteti i Asistencës Teknike ka një përbërje të veçantë.

Numërimi i prioritetit tematik të programit është radhitur sipas radhës së rëndësisë së TP, e llogaritur gjatë ushtrimeve të programimit duke iu referuar regjistrimit të caktuar të TP të identifikuar në Rregulloren e IPA II.

Figura e mëposhtme përshkruan logjikën e ndërhyrjes së programit dhe kryqëzimin e prioriteteve individuale me çështjet e ndërthurura dhe horizontale.

---

<sup>5</sup> Vlerësimi i Ndërmjetëm i Programeve të bashkëpunimit ndërkuftar midis vendeve kandidatë / kandidatë të mundshëm (kufijtë e Ballkanit Intraperëndimor) nën Komponentin e Bashkëpunimit Ndërkuftar të IPA; Raporti II - Performanca e ndihmës.

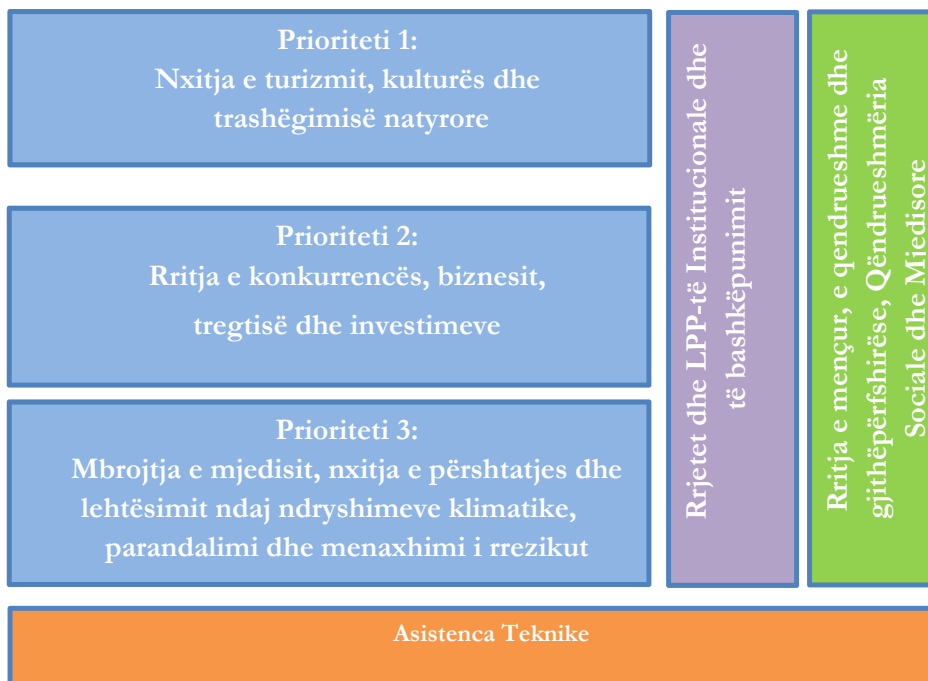

Meqë perspektiva e programimit për vitet 2014–2020 është më e orientuar drejt rezultateve se sa kuadri i IPA 2007–2013, të gjithë treguesit e rezultateve të paraqitur në fletët e të dhënave më poshtë synojnë që të informojnë mbi përzgjedhjen e operacioneve dhe projekteve që do të mbështeten. Këto do të kontribuojnë drejtpërdrejt në përcaktimin e treguesve për Programin.

Përmbajtja e ndërhyrjes e përshkruar më poshtë ka marrë në konsideratë vërejtjet dhe komentet konstruktive të prodhuara gjatë aktiviteteve të konsultimeve publike të zhvilluara në zonën e programit në periudhën dhjetor 2013 – mars 2014.

#### **Prioriteti tematik 1:**

##### **Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore (TP4)**

##### **Përmbledhje e Prioritetit Tematik dhe Referenca Strategjike**

Evropa është destinacioni nr. 1 i turizmit në botë, me turizmin kulturor dhe një numër të madh të vendeve turistike, si dhe me një rrjedhë të fortë të vizitorëve ndërkombëtarë dhe vendas. Politikat e turizmit duhet të përshtaten me këto tendenca dhe të zhvillojnë një ofertë cilësore, duke promovuar kulturat dhe traditat lokale dhe duke i kushtuar vëmendje aspekteve të qëndrueshëm: ruajtja e trashëgimisë, e peizazhit dhe e kulturës lokale. Zona e programit synon të shfrytëzojë mundësitë strategjike që dalin nga potenciali më i gjerë i të gjithë kontinentit, i cili është në përputhje me konceptin e turizmit të qëndrueshëm dhe kulturor të promovuar nga DG Sipërmarrje dhe Industri.

Turizmi ka qenë i njohur si një nga mundësitë ekonomike prioritare që janë me interes për popullsinë në zonën CBC. Edhe pse industria e mikpritjes është e shpërndarë në mënyrë të pabarabartë në zonën e programit, në të dyja vendet industria po rritet. Aktualisht, aktivitetet e lidhura me turizmin janë burimi kryesor i të ardhurave për popullsinë në rajonet e Ohrit dhe Prespës në muajt e verës, por ka shumë potencial të pashfrytëzuar për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm kulturor dhe zbavitës në të gjithë rajonin CBC.

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe organizatave të ndryshme në rajonin CBC është në rritje, por ende ekziston një mungesë praktike e iniciativave të qëndrueshme të përbashkëta në një shkallë më të gjerë. Aktivitetet e përfshira në këtë prioritet tematik do të mbështesin bashkëpunimin midis institucioneve, bazuar në vlerësimin e ofertës heterogjene dhe potencialin e kulturave dhe traditave të ndryshme të pranishme në zonë, si dhe aksionet njerëzit-për-njerëzit. Këto duhet të kontribuojnë për trajtimin e sfidave të tilla si ruajtja e burimeve natyrore dhe kulturore, nxitja e mirëqenies së komuniteteve lokale, përmirësimi i cilësisë së vendeve të punës në fushën e turizmit, kufizimi i ndikimit mjedisor të transportit që lidhet me turizmin etj.

### Objektivi specifik

Objektivi specifik i këtij Prioriteti Tematik synon **të zhvillojë potencialin e turizmit duke promovuar trashëgiminë dhe vlerat kulturore** (SO 1.1).

Prioriteti Tematik do të inkurajojë shumëllojshmërinë e ofrimit të shërbimeve dhe produkteve turistike. Duke mbështetur projekte që promovojnë produkte tematike turistike të qëndrueshme, programi do të forcojë bashkëpunimin trans-nacional në lidhje me turizmin e qëndrueshëm, do të inkurajojë një përfshirje më të madhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të autoriteteve lokale, dhe do të stimulojë konkurrencën e industrisë së turizmit me anë të një fokusimi të përmirësuar mbi shumëllojshmërinë e produkteve tematike të qëndrueshme dhe të turizmit kulturor. Gjithashtu, prioriteti tematik synon të rrisë aftësitë e stafit të angazhuar në industrinë e mikpritjes, duke përfshirë trajnimin profesional për të eliminuar mangësitë në aftësitë për të prezantuar një ofertë të larmishme turistike, p.sh. për guidat turistike dhe trajnerët e specializuar në sportet e dimrit, sportet malore, turizmin rural dhe aventurën, personelet e shërbimit të hoteleve etj.

### Rezultatet e pritshme

Ky prioritet tematik synon të arrijë rezultatet e mëposhtme:

1.1.1 Mundësitë e biznesit për ofruesit lokalë të shërbimeve dhe operatorët në fushën e turizmit janë rritur;

1.1.2 Bashkëpunimi i ndërsjellë, mirëkuptimi dhe respekti për trashëgiminë dhe vlerat kulturore janë zhvilluar më tej.

### Aktivitetet e parashikuara dhe grupet e synuara

Aktivitetet e parashikuara dhe grupet e synuara janë organizuar në tabelën e mëposhtme.

| Aktivitetet e parashikuara                                                                                                                                                     | Grupet e synuara të përfrituesve                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1 Projektimi, zhvillimi dhe promovimi i produkteve dhe shërbimeve të përbashkëta turistike dhe i investimeve në shkallë të vogël në infrastrukturën publike të turizmit. | – Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale;<br>– Ofruesit e shërbimeve turistike;<br>– OJQ-të, OSHC-të;<br>– Parqet kombëtare;<br>– Dhomat e tregtisë;<br>– Rrjetet / grupet e NVM-ve.                                 |
| 1.1.1.2 Trajnim për rritjen e aftësive në industrinë e mikpritjes.                                                                                                             | – Institucionet arsimore e AAP-së;<br>– Institucionet e arsimit të lartë;<br>– Institucione të tjera formale dhe joformale arsimore dhe trajnuese;<br>– OJQ-të, OSHC-të;<br>– Rrjetet/grupet e NVM-ve.                  |
| 1.1.2.1 Restaurimi/rezervimi, ruajtja, pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore dhe historike, dhe e mjedisit të lidhur me këto objekte.                                 | – Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale;<br>– Ofruesit e shërbimeve turistike;<br>– OJQ-të;<br>– Institucionet kulturore (muzetë, bibliotekat, orkestrat etj.);<br>– Operatorët në industrinë e mikpritjes (NVM).   |
| 1.1.2.2 Mbështetje për aktivitete të përbashkëta kulturore.                                                                                                                    | – Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale;<br>– OJQ-të;<br>– Institucionet e arsimit (në të gjitha nivelet);<br>– Institucionet kulturore (muzetë, bibliotekat, orkestrat etj.);<br>– Banorët dhe organizatat e tyre. |

### Treguesit e Performancës së Zbatimit të Prioritetit Tematik

*Rezultati 1.1.1 i objektivit specifik: Mundësitë e biznesit për ofruesit lokalë të shërbimeve dhe operatorët në fushën e turizmit janë rritur*

| Treguesi i kontributit                           | Përshkrimi                                     | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020) | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nr. i shërbimeve/produkteve të reja/përmirësuara | Shërbimet/produktet e reja të përmirësuara     | 0          | 4                     | 10                    | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |
| Nr. i personave të trajnuar                      | Trajnimi i njerëzve në industrinë e mikpritjes | 0          | 50                    | 500                   | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |

| Treguesi i Rezultatit                                     | Përshkrimi                                      | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020) | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nr. i turistëve që përdorin shërbimet e reja/përmirësuara | Turistët përdorin shërbimet e reja/përmirësuara | 0          | 2,000                 | 5,000                 | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |

| Treguesi i Ndikimit                                       | Përshkrimi                                                      | Vlera bazë*                                                                                                          | Vlera e synuar (2020)** | Burimi i të dhënave                     | Intervali i raportimit       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit të turistëve (me fjetje) | Numri mesatar i qëndrimeve me fjetje për turistët e regjistruar | 2,8 net qëndrim me fjetje (të dhënat e 2013, duke përfshirë edhe statistikën nga të dyja vendet në zonat përfituese) | I rritur me 1 natë      | Zyra Statistikore Shtetërore dhe INSTAT | Çdo vit, nga data e zbatimit |

\* Burimi: Zyra Statistikore Shtetërore, [http://www.stat.gov.mk/prikaziPublikacija\\_1.aspx?rbr=483](http://www.stat.gov.mk/prikaziPublikacija_1.aspx?rbr=483). Të dhënat janë marrë nga Anketa Tremujore e Ndërmarrjeve në Shqipëri, 2013.

\*\* Grumbullues.

*Rezultati 1.1.2 i objektivit specifik: Bashkëpunimi i ndërsjellë, mirëkuptimi dhe respekti për trashëgiminë dhe vlerat kulturore janë zhvilluar më tej*

| Treguesi i kontributit                                  | Përshkrimi                                                      | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020)* | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nr. i vendeve të trashëgimisë kulturore të përmirësuara | Përmirësimi i vendeve të trashëgimisë kulturore                 | 0          | 2                     | 4                      | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |
| Nr. i aktiviteteve të organizuara                       | Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta kulturore              | 0          | 10                    | 20                     | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |
| Financimet e reja për libraritë e digjitalizuara        | Financime të reja për koleksione / librari kulturore të krijuar | 0          | 2                     | 5                      | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |

\* Grumbullues.

| Treguesi i rezultatit                               | Përshkrimi                                         | Vlera bazë          | Vlera e synuar (2017)                                             | Vlera e synuar (2020)                                              | Burimi i të dhënave                                    | Intervali i raportimit       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nr. i vizitorëve në vendet e trashëgimisë kulturore | Njerëzit vizitojnë vendet e trashëgimisë kulturore | PËR T'U VEN DOS UR* | I rritur me 7% për vendet dhe subjektet e ndërhyrjes së programit | I rritur me 15% për vendet dhe subjektet e ndërhyrjes së programit | Sistemi i monitorimit Zyra Statistikore Shtetërore dhe | Çdo vit, nga data e zbatimit |



|  |  |  |  |  |        |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|
|  |  |  |  |  | INSTAT |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|

\* Vlera bazë lidhet me performancën e përfituesve/grupeve të synuara para ndërhyrjes; shifrat përkatëse për të matur vlerën bazë, duhet të sigurohen nga aplikanti në formularin e aplikimit për grante.

| Treguesi i ndikimit                            | Përshkrimi                                                                                     | Vlera bazë | Vlera e synuar (2020)                    | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| % e palëve të treta të përfshira në aktivitete | Raporti i palëve të interesuara që u angazhuan në aktivitetet kulturore në kuadër të programit | 1465*      | E rritur me 10% në krahasim me 2007–2013 | Sistemi i monitorimit | Çdo vit, nga data e zbatimit |

\* Raporti Vjetor i Zbatimit (AIR) 2013.

### Modalitetet e zbatimit<sup>6</sup>

Aktivitetet e parashikuara nën këtë prioritet tematik do të zbatohen nëpërmjet modaliteteve të skemës së granteve në bazë të metodologjisë së thirrjeve për projekt propozime brenda regjimit të PRAG.

Aktiviteti që synon përmirësimin e aftësive të personelit të industrisë së mikpritjes duhet të përfshijë përfaqësuesit e industrisë si aktorët kryesorë në secilin projekt propozim.

Në kuadër të këtij prioriteti tematik është parashikuar një gamë e gjerë e përfituesve të mundshëm. Vetëm për Aktivitetin 1.1.2.2 pritet një numër i konsiderueshëm i projekteve të vogla që do të nxisin bashkëpunimin njerëz-për-njerëz dhe institucion-për-institucion.

Aktivitetet 1.1.1.1 dhe 1.1.2.1 do të zbatojnë projekte me ndikim më të rëndësishëm afatgjatë, të tilla si infrastruktura e turizmit në shkallë të vogël dhe renovimi i monumenteve historike dhe kulturore.

Qëllimi i ndërhyrjes në këtë prioritet tematik mund të kryqëzohet pjesërisht me mbështetjen e dhënë nëpërmjet prioritetit tematik 2, veçanërisht në lidhje me sipërmarrjet private, të cilat do të jenë aplikues dhe përfitues të pranueshëm. Në këtë aspekt, është hartuar linja ndarëse në vijim: palët e interesuara të prioritetit tematik (partnerët ose bashkëpunëtorët sipas modaliteteve PRAG) që bien në kategorinë e SME-ve duhet të përfshihen nën seksionin 1 të NACE: Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit.

Dy skenarë janë parashikuar për të siguruar mbështetje granteve:

1. Aktivitetet 1.1.1.1, 1.1.2.1 do të mbështeten në perspektivën afatmesme pasi kërkojnë një mbështetje më të gjerë për lehtësimin, mobilizimin dhe zhvillimin e projektit se sa aktivitetet e tjera. Kështu, ato do të përfshihen vetëm në raundin e dytë dhe të tretë të thirrjeve për projekt propozime, ndërsa Aktivitetet 1.1.1.2 dhe 1.1.2.2 do të mbështeten nëpërmjet raundit të parë dhe të tretë të thirrjeve për projekt propozime.

2. I gjithë prioriteti tematik do të zbatohet nëpërmjet një thirrje për projekt propozime (përfshijmë mund të bëhet për aktivitetin 1.1.2.2 i cili mund të përsëritet në çdo thirrje për projekt propozime, kur është rasti për të reduktuar barrierat e hyrjes për aplikuesit me kapacitet më të ulët financiar).

Një thirrje e vetme për propozime mund të mbulojë më shumë se një prioritet tematik. Kur është e nevojshme dhe e mundur, thirrja për projekt propozime do të përfshijë ndarjet e buxhetit nga alokimet e ndryshme financiare vjetore, në mënyrë që të promovojë projekte në një shkallë më të madhe.

### **Prioriteti Tematik 2: Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve(TP7)**

#### **Përmbledhje e Prioritetit Tematik dhe Referenca Strategjike**

Papunësia e lartë, nivelet e ulëta të punësimit dhe vlerës së shtuar në ekonominë e zonës së programit është një çështje e shqetësimit të lartë. Kështu, nxitja, mbështetja dhe krijimi i vendeve të punës dhe burime alternative të të ardhurave paraqitet si një nga objektivat kryesorë të politikës së zhvillimit social-ekonomik të rajonit CBC në këto rrethana.

Prioriteti tematik do të synojë të mbështesë aksesin në tregjet të operatorëve ekonomikë në të gjithë sektorët kryesorë të ekonomisë në zonën e programit, rritjen e përdorimit të instrumenteve të TIK dhe

<sup>6</sup> Këto janë të natyrës parashikuese, bazuar në supozimin që deri në tre CFP do të organizohen gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit. Modaliteti mund të ndryshojë gjatë zbatimit të programit.



teknologjisë, dhe shfrytëzimin e mundësive të pashfrytëzuara të zinxhirit të vlerave, duke përfshirë ato në ekonominë rurale. Pritet që këto të kontribuojnë në rritjen e konkurrencës, zhvillimin e tregtisë dhe investimet e reja në zonën e programit.

Aktivitetet e këtij prioriteti tematik kanë si qëllim të trajtojnë një numër të kufizuar të mundësive strategjike që lidhen me konkurrencën, e cila mbetet një nga shtyllat kryesore të Strategjisë së Evropës 2020. Qëllimi i ndërhyrjes së propozuar është plotësisht në përputhje me qasjen e sektorit IPA II: Zona A e Politikës - procesi i tranzicionit dhe ndërtimi i institucioneve, sektori: Zhvillimi i Sektorit Privat, dhe objektivi tematik 3 i ndërhyrjes së Fondeve Strukturore: Konkurrueshmëria e SME-ve.

#### Objektivi specifik

Ky prioritet tematik përqendrohet në **forcimin e kapaciteteve prodhuese të SME-ve dhe aksesit të tyre në tregje** (SO 2.1).

Ndërhyrja do të përqendrohet në përmirësimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit mbi mundësitë që rrjedhin nga hapjet e zinxhirit të vlerave ekonomike ekzistuese, mbështetjen në drejtim të produktit dhe procesit të certifikimit të cilësisë të kërkuar në tregjet ndërkombëtare, dhe në përdorimin e gjerë të teknikave të shitjes moderne, duke përfshirë tregtinë elektronike. Në mënyrë që të rritet ekonomia rurale dhe mundësitë e saj strategjike, do të sigurohet një fushatë për të hapur/zhvilluar tregjet e organizuar të prodhimeve të freskëta.

#### Rezultatet e pritshme

Rezultati i pritshëm i lidhur me objektivin specifik të prioritetit tematik është:

2.1.1 Ndërgjegjësimi dhe kapaciteti i SME-ve dhe bizneseve të reja për të hyrë në tregjet e reja dhe zinxhirët e vlerave janë rritur.

#### Aktivitetet e parashikuara dhe Grupet e Synuara

Aktivitetet e parashikuara dhe Grupet e Synuara janë grupuar në tabelën e mëposhtme.

| Aktivitetet e parashikuara                                                                                  | Grupet e Synuara të Përfituesve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1.1 Asistencë për SME-të dhe bizneset e reja për ndërkombëtarizim dhe gjetjen e partnerëve të biznesit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale.</li> <li>Organizatat anëtare të biznesit (p.sh. dhomat e tregtisë/artizanatit).</li> <li>Shoqatat e SME-ve, grupimet dhe rrjetet e tyre.</li> <li>Organizatat RDI dhe institucionet e arsimit të lartë.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.1.2 Investime në tregun e vogël ndërkufitar dhe në objekte tregtare.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale.</li> <li>Qendrat për zhvillim të rajoneve planifikuese</li> <li>Ndërmarrjet publike (në pronësi mbi 50% nga organet publike) - në rast të zhvillimit të tregjeve ndërkufitare dhe objekteve tregtare (përfshirë tregjet e prodhimeve të freskëta).</li> <li>Shoqatat e SME-ve, grupimet e tyre dhe organizatat anëtare të biznesit (p.sh. dhomat e tregtisë/artizanatit).</li> <li>Shoqatat e fermerëve.</li> </ul> |

#### Treguesit e Performancës së Zbatimit të Prioritetit Tematik

| Treguesi i kontributit                                                       | Përshkrimi                                      | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020)* | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. i aktiviteteve të tregtisë së jashtme                                    | Aktivitete që synojnë tregun e jashtëm          | 0          | 5                     | 10                     | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Nr. i bizneseve që marrin pjesë në aktivitete të reja të tregtisë së jashtme | Nr. i bizneseve që përfitojnë nga aktivitetet e | 0          | 30                    | 50                     | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |

|                                                                                     |                                                            |   |   |    |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------|--------|
|                                                                                     | reja të tregtisë së jashtme                                |   |   |    |                       |        |
| Nr. i SME-ve me certifikata të reja të konformitetit të fituara (ISO, HACCP etj.)   | SME-të që kanë çertifikata të reja të konformitetit        | 0 | 8 | 20 | Sistemi i monitorimit | Vjetor |
| Nr. i tregjeve të reja dhe objekteve tregtare të zhvilluara nëpërmjet marrëveshjeve | Nr. i marrëveshjeve me tregje të reja dhe objekte tregtisë | 0 | 1 | 3  | Sistemi i monitorimit | Vjetor |

\* Grumbullues.

| Treguesi i rezultatit                                       | Përshkrimi                                                                           | Vlera bazë        | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020) | Burimi i të dhënave                                               | Intervali i raportimit |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ndarja e vlerës së eksportit të mallrave dhe shërbimeve (%) | Raporti i eksporteve të mallrave dhe shërbimeve në lidhje me tregtinë e përgjithshme | PËR T'U VENDOSUR* | Rritje me 2%          | Rritje me 5%          | Sistemi i monitorimit, Zyra Shtetërore e Statistikave, dhe INSTAT | Vjetor                 |
| Qarkullimi i bizneseve                                      | Rritja e shitjeve totale të një shoqërie për një periudhë të caktuar                 | PËR T'U VENDOSUR* | Rritje me 3%          | Rritje me 8%          | Sistemi i monitorimit, Zyra Shtetërore e Statistikave, dhe INSTAT | Vjetor                 |

\* Vlera bazë lidhet me performancën e përfituesve/grupeve të synuara para ndërhyrjes; shifrat përkatëse për të matur vlerën bazë, duhet të sigurohen nga aplikanti në formularin e aplikimit për grante.

| Treguesi i Ndikimit              | Përshkrimi                                                                                                 | Vlera bazë        | Vlera e synuar (2020)*                 | Burimi i të dhënave                          | Intervali i raportimit |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Vlera bruto e shtuar nga sektori | Përqindje e rritjes së të mirave dhe shërbimeve të prodhuara në sektorin ekonomik brenda zonës gjeografike | PËR T'U VENDOSUR* | Rritje me 2% në krahasim me vitin 2013 | Zyra Shtetërore e Statistikave, dhe INSTAT-i | Vjetor                 |

\* Të dhënat do të llogariten pasi zyrat e statistikave të sigurojnë informacionin e nevojshëm.

### Modalitetet e zbatimit<sup>7</sup>

Të gjitha aktivitetet e prioritetit tematik 2 do të zbatohen nëpërmjet modaliteteve të skemës së granteve.

Ndihma e dhënë për bizneset individuale duhet të jetë në përputhje me ligjet e BE-së: i) ndihma shtetërore e dhënë nën GBER; ose ii) tavan i ndihmës minimale dhe maksimale të jetë deri në 85%, për të siguruar bashkëfinancimin minimal të kërkuar për IPA.

Vija ndarëse e kufirit midis aktiviteteve të realizuara në bazë të këtij prioriteti tematik dhe prioritetit tematik 1 është përcaktuar në bazë të pranueshmërisë së aplikantëve: SME-të dhe rrjetet e tyre që përfitojnë nga ndërhyrjet e prioritetit tematik 2 nuk duhet të bien nën seksionin I të NACE: Aktivitetet

<sup>7</sup> Këto janë të natyrës parashikuese, bazuar në supozimin që deri në tre CFP do të organizohen gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit. Modaliteti mund të ndryshojë gjatë zbatimit të programit.

e akomodimit dhe shërbimeve ushqimore.

Janë parashikuar dy opsione për të ofruar ndërhyrjen në bazë të këtij prioriteti tematik, në varësi të karakteristikave përfundimtare të ofertës financiare:

1. Aktiviteti 2.1.1.1 mund të mbështetet në raundin e parë dhe të tretë të thirrjeve për projekt propozime, ndërsa Aktiviteti 2.1.1.2 gjatë raundit të dytë ose të tretë të thirrjeve për projekt propozime (për të shmangur përplasje në një thirrje për projekte me Aktivitetin 1.1.2.1 që pritet, gjithashtu, të konsumojnë pjesë të mëdha të financimit - këto projekte pritet të jenë të konsiderueshme në madhësi dhe me kohëzgjatje më të madhe se çdo iniciativë tjetër).

2. I gjithë prioriteti tematik mund të zbatohet nëpërmjet një thirrje për projekt propozime.

### **Prioriteti tematik 3: Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut (TP2)**

#### **Përmbledhje e Prioritetit Tematik dhe Referenca Strategjike**

Zona e programit karakterizohet nga një mjedis dhe natyrë e pasur dhe e larmishme, dhe në përgjithësi njihet si një territor i pastër dhe i gjelbër. Megjithatë, në rajon mungon infrastruktura për mbrojtjen e mjedisit, si dhe strategjitë dhe praktikatat për njohjen në kohë, parandalimin dhe menaxhimin e rrezikut. Zona kufitare është e prirur drejt motit të pafavorshëm dhe dukurive klimatike, veçanërisht stuhive të rënda dhe reshjeve që rezultojnë në përmbajtje lokale dhe rrëshqitje të tokës, duke dëmtuar rrugët, pronat private dhe tokën bujqësore. Në stinët e thata, zjarret rrezikojnë dhe dëmtojnë ekonominë rurale dhe prodhimin e të korrave. Kështu, rimëkëmbja prej katastrofave klimatike është një nga çështjet që duhet të trajtohen nëpërmjet këtij prioriteti tematik.

Përveç kësaj, përmirësimi i mbledhjes së mbetjeve të ngurta, menaxhimit të mbetjeve dhe praktikatat e parandalimit të erozionit të tokës, konsiderohen si fusha prioritare të ndërhyrjes në rajonin CBC.

“Të jetosh mirë, brenda kufijve të planetit tonë” është titulli kryesor i Programit të ri të Veprimit për Mjedisin deri në vitin 2020, i propozuar nga Komisioni Evropian. Ky prioritet tematik i programit CBC bazohet në këtë nismë, dhe është në përputhje me politikat e Zonës B të IPA II: Zhvillimi Rajonal, sektori: Mjedi dhe Ndryshimet Klimatike, dhe objektivat tematikë 5 dhe 6 të ndërhyrjes së Fondeve Strukturore: Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalim dhe menaxhimi i rrezikut dhe mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i efikasitetit të burimeve.

Aktivitetet e këtij prioriteti tematik përfshijnë të dyja llojet e projekteve: “projektet e butë” me qëllim përmirësimin e ndërgjegjësimit dhe promovimin e përdorimit më të qëndrueshëm të burimeve, ekonomisë të gjelbër; si dhe mbështetjen e investimeve të vogla në infrastrukturën për mbrojtjen e mjedisit, e cila konsiderohet të ketë një ndikim të rëndësishëm në rajonin ndërkufitar dhe në prodhimin e efektit të demonstrimit. Gjithashtu, ndërhyrja synon të trajtojë kapacitetet e ulëta financiare dhe institucionale të shoqërive të shërbimeve publike, si dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme bujqësore dhe metodave të prodhimit bujqësor.

#### **Objekti i specifik**

Kryetitulli i objektivit specifik të këtij prioriteti tematik (SO 3.1) mbetet **rritja e ndërgjegjësimit për një ekonomi më të gjelbër, mjedis më të pastër dhe ndryshimet klimatike.**

Qartësisht, prioriteti tematik ka një dimension hapësinor që kërkon një qasje të bazuar në vend, pasi territore të caktuara kufitare janë të veçantë nga të tjerët. Ky prioritet tematik do të përqendrohet në ndërtimin e ndërgjegjësimit dhe njohurive, integrimin e komuniteteve dhe grupeve të synuara, dhe në zbatimin e masave reale për të trajtuar çështjet e parashikuara në seksionin e mësipërm. **Fokus i veçantë do të drejtohet ndaj përpunimit të produkteve pyjore drusore dhe furnizimit me ujë.**

#### **Rezultatet e pritshme**

Ky prioritet tematik do të arrijë rezultatet e mëposhtme:

3.1.1 Ndërgjegjësimi dhe njohuritë mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit janë rritur;

3.1.2 Infrastruktura publike në rrezik nga përmbajtjet, erozioni i dherave dhe zjarret është përmirësuar.

#### **Aktivitetet e parashikuara dhe Grupet e Synuara**

Aktivitetet e parashikuara dhe grupet e synuara janë grupuar në tabelën e mëposhtme.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1.1 Promovimi dhe mbështetja e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit                      | –Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale<br>–Qendrat për zhvillim të rajoneve të planifikuara<br>–Shoqëritë e shërbimeve publike<br>–Parqet kombëtare<br>–OSHC-të, OJQ-të<br>–Dhomat e tregtisë<br>–Organizatat RDI<br>–Shoqatat e banorëve në zonat ndërkufitare, kryesisht në zonat rurale<br>–Shoqatat e fermerëve<br>–Institucionet e arsimit primar, dytësor dhe tretësor, dhe ato të hulumtimit<br>–Rrjetet e SME-ve |
| 3.1.2.1 Promovimi i investimeve të vogla në infrastrukturë për rimëkëmbjen nga katastrofat dhe mbrojtjen e mjedisit | –Njësitë e qeverisjes vendore dhe rajonale<br>–Qendrat për zhvillim të rajoneve të planifikuara<br>–Qendrat kombëtare dhe rajonale për menaxhimin dhe monitorimin e fatkeqësive<br>–Shoqëritë e shërbimeve publike<br>–Shoqatat e fermerëve<br>–OSHC-të, OJQ-të<br>–Dhomat e tregtisë<br>–Shoqatat e banorëve në zonat ndërkufitare, kryesisht në zonat rurale                                                               |

### Treguesit e Performancës së Zbatimit të Prioritetit Tematik

*Rezultati 3.1.1 i objektivit specifik: ndërgjegjësimi dhe njohuritë mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit janë rritur*

| Treguesi i kontributit                                                                          | Përshkrimi                                                                                      | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020)* | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. i fushatave ndërgjegjëse mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve dhe të mjedisit           | Fushata të reja publike mbi çështjet e mjedisit në nivel projekti                               | 0          | 5                     | 12                     | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Nr. i sistemeve të menaxhimit të mbetjeve dhe zinxhirëve të vlerave të përmirësuar brenda zonës | Nr. i sistemeve të menaxhimit të mbetjeve dhe zinxhirëve të vlerave të modernizuar brenda zonës | 0          | 3                     | 6                      | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Nr. i aksioneve të pastrimit                                                                    | Nr. i nismave të pastrimit të zbatuara në nivel projekti                                        | 0          | 4                     | 8                      | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |

\* Grumbulluese

| Treguesi i Rezultatit                             | Përshkrimi                          | Vlera bazë                   | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020) | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| % e popullsisë në zonën CBC e ndërgjegjësuare mbi | Norma e popullsisë së informuar mbi | PËR T <sup>U</sup> VENDOSUR* | 1% (rreth 14,000)     | 3.5% (rreth 50,000)   | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |

|                                                                                                                       |                                                                                                            |                   |    |     |                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----------------------|--------|
| përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit në sektorët kyç                                            | përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe çështjet e mjedisit                                      |                   |    |     |                       |        |
| % e të gjitha bizneseve dhe organizatave që marrin pjesë në veprimet e përbashkëta për menaxhimin e ujit dhe mbetjeve | Raporti ndërmjet atyre që marrin pjesë në veprimet e përbashkëta dhe të gjithë organeve ekzistuese në zonë | PËR T'U VENDOSUR* | 5% | 10% | Sistemi i monitorimit | Vjetor |

\* Vlera bazë lidhet me performancën e përfituesve/grupeve të synuara para ndërhyrjes; shifrat përkatëse për të matur vlerën bazë, duhet të sigurohen nga aplikanti në formularin e aplikimit për grante.

| Treguesi i Ndikimit                        | Përshkrimi                                                                                                                | Vlera bazë                                                  | Vlera e synuar (2020)                                 | Burimi i të dhënave                                              | Intervali i raportimit |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Përdorimi i ujit nga familjet dhe bizneset | Përqindja e humbjeve të ujit e reduktuar                                                                                  | PËR T'U VENDOSUR*                                           | Rënie e përdorimit të ujit me 10%                     | Sistemi i monitorimit Zyra Shtetërore e Statistikave, dhe INSTAT | Vjetor                 |
| % e mbetjeve të grumbulluara për riciklim  | Norma e mbetjeve të ricikluara në raport me sasinë e mbledhur                                                             | PËR T'U VENDOSUR*                                           | Rritja e mbetjeve të grumbulluara për riciklim me 15% | Sistemi i monitorimit                                            | Vjetor                 |
|                                            | Norma e numrit të vend-shkarkimeve të paligjshme të mbyllura në raport me numrin fillestar të vend-shkarkimeve ekzistuese | PËR T'U VENDOSUR nga JTS me bashkitë, ministrinë e mjedisit | Ulja e numrit të vendshkarkimeve të paligjshme me 10% | Sistemi i monitorimit                                            | Vjetor                 |

\* Vlera bazë lidhet me performancën e përfituesve/grupeve të synuara para ndërhyrjes; shifrat përkatëse për të matur vlerën bazë, duhet të sigurohen nga aplikanti në formularin e aplikimit për grante.

*Rezultati 3.1.2 i objektivit specifik: infrastruktura publike në rrezik nga përmytjet, erozioni i dherave dhe zjarret është përmirësuar*

| Treguesi i kontributit                                               | Përshkrimi                                                                  | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020)* | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. i projekteve të mbështetur                                       | Nr. total i projekteve të reja të mbështetur nën këtë objektiv              | 0          | 5                     | 12                     | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Nr. i objekteve të siguruara për mbrojtjen nga përmytjet dhe zjarret | Nr. i objekteve të reja të siguruara për mbrojtjen nga përmytjet dhe zjarri | 0          | 0                     | 2                      | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Nr. i fushatave të ndërgjegjësimit                                   | Nr. i fushatave të reja të ndërgjegjësimit                                  | 0          | 2                     | 5                      | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Numri i familjeve                                                    | Numri i familjeve                                                           | 0          | 100                   | 250                    | Sistemi i             | Vjetor                 |

|                                                                          |                                                                          |  |  |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| / fermave dhe organizatave të tjera që përfitojnë nga aktivitetet e reja | / fermave dhe organizatave të tjera që përfitojnë nga aktivitetet e reja |  |  |  | monitorimit |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|

\* Grumbulluese.

| Treguesi i Rezultatit                       | Përshkrimi                                                                                                                      | Vlera bazë | Vlera e synuar (2017) | Vlera e synuar (2020)                     | Burimi i të dhënave                                           | Intervali i raportimit |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gjatësia e rrugëve të mbrojtura             | Nr. i km të rrugëve të ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore të mbrojtura në raport me nr. e km të rrugëve në nevojë për mbrojtje | 0          | 3%                    | 10% e rrugëve të ekspozuara ndaj rrezikut | Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT, Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Madhësia e sipërfaqes bujqësore të mbrojtur | Norma e sipërfaqes së tokës bujqësore të mbrojtur në raport me sipërfaqen totale të tokës në nevojë për mbrojtje                | 0          | 2%                    | 5% e tokës e ekspozuar ndaj rrezikut      | Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT, Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |
| Madhësia e zonave pyjore të mbrojtura       | Norma e sipërfaqes së zonës pyjore të mbrojtur në raport me sipërfaqen totale të zonës pyjore në nevojë për mbrojtje            | 0          | 2%                    | 5% e pyjeve të ekspozuar ndaj rrezikut    | Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT, Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |

| Treguesi i Ndikimit                                                      | Përshkrimi                                                                        | Vlera bazë | Vlera e synuar (2020) | Burimi i të dhënave   | Intervali i raportimit |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Madhësia e zonës së Bashkëpunimit Ndërkufitar të mbuluar nga aktivitetet | Sipërfaqja e pranueshme e programit CBC është mbuluar nga aktivitetet e projektit | 0          | 3%                    | Sistemi i monitorimit | Vjetor                 |

### Modalitetet e zbatimit<sup>8</sup>

Aktivitetet do të zbatohen nëpërmjet financimit me grante, duke ndjekur modalitetet e PRAG për dhënien e granteve.

Zbatimi i prioritet tematik do të kërkojë përfshirjen aktive të grupeve të ndryshme të interesit në nivel lokal dhe rajonal. Pritet që me kalimin e kohës të ketë një ndikim më të ndjeshëm nga motivimi i autoriteteve lokale dhe shoqërive publike komunale në rajonin e Bashkëpunimit Ndërkufitar për të marrë një rol aktiv në zbatimin e programit: investimet e vogla në mjedis do të projektohen në kuadër të mandatit të tyre nëpërmjet procedurave transparente të prokurimit publik, dhe nuk do të kërkohej përgatitja e dokumentacionit të detajuar dhe të shtrenjtë të projektit të financuar nga fondet e

<sup>8</sup> Këto janë të natyrës parashikuese, bazuar në supozimin që deri në tre CFP do të organizohen gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit. Modaliteti mund të ndryshojë gjatë zbatimit të programit.



programit.

Financimi i granteve mund të ofrohet në bazë të skenarëve të mëposhtëm alternativë:

1. Të dyja aktivitetet mund të zbatohen paralelisht.
2. Aktiviteti 3.1.1.1 mund të zbatohet gjatë raundit të parë dhe të tretë të thirrjeve për projekt propozime, ndërsa aktiviteti 3.1.2.1 – në rrjedhën e raundit të dytë të thirrjeve për projekt propozime.

#### **Asistenca Teknike**

Objektivi specifik i Asistencës Teknike është të sigurojë zbatimin efektiv, efikas, transparent dhe në kohë të programit të bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe të rrisë ndërgjegjësimin e komuniteteve në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, dhe në popullsinë e zonës së programit në përgjithësi. Gjithashtu, ai mbështet aktivitete ndërgjegjësimi në nivel kombëtar, me qëllim informimin e qytetarëve në të dyja vendet përfitues të IPA II. Për më tepër, siç ka treguar përvoja në ciklin e programit 2007–2013, ky prioritet do të forcojë kapacitetin administrativ të autoriteteve dhe përfituesve që do të zbatojnë programin, me qëllim për të përmirësuar pronësinë dhe përshtatshmërinë e programit me rezultatet e projekteve.

Alokimi për Asistencën Teknike do të përdoret për të mbështetur punën e Strukturave Kombëtare Operative (OS) dhe të Komitetit të Përbashkët të Monitorimit (JMC), në sigurimin e fillimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit efikas të programeve, si dhe për një përdorim optimal të burimeve. Kjo do të arrihet nëpërmjet krijimit dhe funksionimit të një Sekretariati të Përbashkët Teknik (JTS) me bazë në territorin e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe një Zyrë Antena në Republikën e Shqipërisë. JTS do të jetë në krye të menaxhimit të përditshëm të programit dhe do t'i raportojë mbi ecurinë e tij OS-ve dhe JMC-së.

#### **Rezultatet e synuar:**

***Mbështetja administrative për Strukturat Operative (OS) dhe Komitetin e Përbashkët të Monitorimit (JMC) të programit është rritur.***

Ky prioritet do të sigurojë një zbatim normal të programit gjatë të gjitha fazave të tij. Ai përfshin disponueshmërinë e mjeteve financiare dhe vendosjen e personelit të kualifikuar përgjegjës për të ndihmuar Strukturat Operative dhe Komitetin e Përbashkët të Monitorimit, si dhe krijimin dhe zbatimin e mekanizmave dhe procedurave të menaxhimit, monitorimit dhe kontrollit. Nëse kërkohet, ai, gjithashtu, do të kontribuojë në përgatitjen e ciklit pasardhës financiar (2021–2027).

#### **Treguesit e rezultatit:**

| Treguesi                                                                                       | Njësia    | Baza | Synimi deri më 2022 | Burimi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|--------|
| Përqindja mesatare e përfituesve të kënaqur me mbështetjen nga programi i zbatuar <sup>9</sup> | Përqindje | 0    | 60 %                | Anketë |

#### **Kapaciteti teknik dhe administrativ për menaxhimin dhe zbatimin e programit është rritur.**

Ky prioritet do të ofrojë mundësi për përmirësimin e kompetencave dhe aftësive të strukturave menaxhuese të programeve, si dhe të aplikuesve të mundshëm dhe përfituesve të granteve. Aktivitete specifike për ngritjen e kapaciteteve do të planifikohen dhe zbatohen në bazë të nevojave të identifikuar gjatë zbatimit të programit. Si pjesë e mësimave të nxjerra nga cikli i programit 2007–2013: i) do të pritet një pjesëmarrje në rritje e anëtarëve të KPM-së në detyrat e përcaktuara nën kuadrin ligjor të IPA II; ii) kapaciteti i aplikuesve të mundshëm për zhvillimin e partneriteteve të qëndrueshme ndërkufitare do të rritet; dhe iii) kapaciteti i përfituesve të granteve për të përmbushur detyrimet e kontratave të tyre në mënyrë të kënaqshme, të do të përfordhet.

#### **Treguesit e rezultatit:**

| Treguesi                                                                                                 | Njësia    | Baza  | Synimi deri më 2022 | Burimi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------|
| Rritja mesatare e numrit të propozimeve të marra në kuadër të çdo thirrje të njëpasnjëshme <sup>10</sup> | Përqindje | 123 * | + 45%               | AIR    |

<sup>9</sup> Kërkon një studim të rregullt dhe të thjeshtë duke përdorur një pyetësor standard me pyetje të mbyllura.

<sup>10</sup> Ju lutemi të vini re se në perspektivën financiare 2014–2020, thirrjet e mundshme të përshtatura/ strategjike për propozime janë parashikuar me fokus të qartë dhe/ose kërkesa të caktuara në lidhje me përfituesit e mundshëm. Gjithashtu,

| Treguesi                                                                                  | Njësia    | Baza | Synimi deri më 2022 | Burimi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|--------|
| Rritja mesatare e numrit të koncept ideve që do të kualifikohen për vlerësim të mëtejshëm | Përqindje | 59   | 10 %                | AIR    |

### **Vizibiliteti i programit dhe i rezultateve të tij, garantohet**

Programet CBC kanë qenë shumë të famshëm në zonat përfituese, përveç të tjerave, falë veprimeve të vizibilitetit të ndërmarra gjatë ciklit të programit 2007–2013. Duke parë numrin e aplikuesve në thirrjet pasuese, është vënë re se ka një interes në rritje për iniciativat e bashkëpunimit. Këto arritje duhet të ruhen dhe të përmirësohen edhe gjatë zbatimit të perspektivës financiare 2014–2020. Një shumëllojshmëri e kanaleve të komunikimit dhe mjeteve të publicitetit duhet të zhvillohet për të siguruar informacion të rregullt midis palëve të interesuara të programit dhe një audience më të gjerë.

### ***Treguesit e rezultatit:***

| Treguesi                                                               | Njësia | Baza  | Synimi deri më 2022 | Burimi |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|--------|
| Rritja e numrit të personave që marrin pjesë në aktivitetet promovuese | Numër  | 1398* | 2000                | AIR    |
| Vizitat në faqen e internetit të programit                             | Numër  | 40*   | 700                 | AIR    |

\* AIR 2013

---

Thirrjet për Projekt Propozime mund të përdorin parimin e rotacionit për përzgjedhjen e prioritetëve tematike (TP) dhe objektivave të tyre specifike, dhe në këtë aspekt numri i propozimeve jo domosdoshmërisht mund të rritet. Për këto arsye, rritja e pritshme e numrit të aplikimeve të marra mund të llogaritet për çdo thirrje të njëpasnjëshme në mënyrë individuale, dhe do të ndikohet nga një faktor që mund të llogaritet në bazë, të: 1. Buxheti i përgjithshëm në dispozicion; 2. Prioritetet tematike, objektivat specifike dhe rezultatet e përfshira në Thirrjen për Projekt Propozime; 3. Shumat minimale dhe maksimale të lejuara të granteve; 4. Numri i aplikimeve dhe granteve të lejuara për aplikues / bashkëaplikues / entet e lidhur; dhe 5. Çdo dispozitë tjetër e veçantë që ndikon në kritere të ndryshme të pranueshmërisë, të zbatueshme për një thirrje specifike për projekt propozime.



### Lloji i aktiviteteve:

Një listë joshteruese e aktiviteteve të mundshme të mbuluara nga alokimi i Asistencës Teknike do të përfshijë:

- Ngritja dhe funksionimi i Sekretariatit të Përbashkët Teknik dhe Antena-s së tij.
- Organizimi i aktiviteteve, takimeve, trajnimeve, vizitave studimore apo vizitave të shkëmbimit, për të mësuar nga praktikat më të mira të nismave të tjera të zhvillimit territorial.
- Pjesëmarrja e stafit të strukturave të menaxhimit në forumet e Ballkanit Perëndimor apo të BE-së.
- Përgatitja e manualeve / doracakëve të brendshëm dhe/ose të jashtëm.
- Asistencë për aplikuesit e mundshëm në partneritetet dhe për zhvillimin e projektit (forume për kërkimin e partnerëve etj.).
- Këshilla për përfituesit e granteve mbi çështje lidhur me zbatimin e projektit.
- Monitorimi i zbatimit të projektit dhe programit, duke përfshirë krijimin e një sistemi të monitorimit dhe raportimit përkatës.
- Organizimi i aktiviteteve të vlerësimit, analizave, sondazheve dhe/ose studimeve.
- Informim dhe publicitet, duke përfshirë përgatitjen, miratimin dhe rishikimin e rregullt të një plani vizibiliteti dhe komunikimi, shpërndarjen e informacionit (ditë informimi, mësimet e nxjerra, studimet e rasteve më të mira, artikuj dhe deklarata për shtyp), ngjarje promovuese dhe artikuj të shtypur, zhvillimi i mjeteve të komunikimit, mirëmbajtja, përditësimi dhe përmirësimi i faqes së internetit të programit etj.
- Mbështetje për punën e Task-Forcës së Përbashkët të ngarkuar me përgatitjen e ciklit të programit 2021–2026.

### Grupet e synuara dhe përfituesit përfundimtarë (listë joshteruese)

- Strukturat e menaxhimit të programit;
- Aplikuesit e mundshëm;
- Përfituesit e granteve;
- Përfituesit përfundimtarë të projektit;
- Publiku i gjerë.

### Modalitetet e zbatimit

Plani i vizibilitetit dhe komunikimit duhet të prodhohet në përputhje me kërkesat e përgjithshme të IPA II dhe praktikat më të mira mbi transparencën dhe trajtimin e barabartë.

Përfituesit duhet të informohen në mënyrë korrekte dhe të plotë mbi rregulloret për publicitetin. Kujdes i veçantë i kushtohet rregullave të vizibilitetit edhe gjatë monitorimit të zbatimit të projektit.

Organet e përfshira në zbatimin e programit janë përgjegjëse për të siguruar që përfituesit përfundimtarë të marrin masat për informimin dhe publicitetin mbi aktivitetet e bashkëfinancuara në kuadër të IPA II, në përputhje me udhëzimet e BE-së mbi vizibilitetin.

Tabela 2: Përmbledhje e strategjisë së programit

| Prioriteti Tematik (TP)                                                            | Objektivat specifike                                                                                                                     | Rezultatet                                                                                                                                                                                                            | Treguesit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Llojet e aktiviteteve (shembuj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioriteti Tematik 1: Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore. (IP4) | Objektivi specifik i këtij Prioriteti Tematik synon të zhvillojë potencialin e turizmit duke promovuar trashëgiminë dhe vlerat kulturore | 1.1.1 Mundësitë e biznesit për ofruesit lokalë të shërbimeve dhe operatorët në fushën e turizmit janë rritur;<br>1.1.2 Bashkëpunimi i ndërsjellë, mirëkuptimi dhe respekti për trashëgiminë dhe vlerat kulturore janë | 1.1.1 Nr. i turistëve që përdorin shërbimet e reja/ përmirësuar.<br>Nr. i shërbimeve/ produkteve të reja/përmirësuar.<br>Nr. i personave të trajnuar.<br>Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit të turistëve (me fjetje).<br>1.1.2 Nr. i vizitorëve në vendet e trashëgimisë kulturore.<br>Nr. i vendeve të trashëgimisë kulturore të | 1.1.1.1 Projektimi, zhvillimi dhe promovimi i produkteve dhe shërbimeve të përbashkëta turistike dhe i investimeve në shkallë të vogël në infrastrukturën publike të turizmit.<br>1.1.1.2 Trajnim për rritjen e aftësive në industrinë e mikpritjes.<br>1.1.2.1 Restaurimi / rezervimi, ruajtja, pastrimi dhe mirëmbajtja e objekteve kulturore dhe |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                       | zhvilluar më tej.                                                                                                                                                                                                          | përmirësuar.<br>Nr. i aktiviteteve të organizuara.<br>Nr. i librarive të reja të digjitalizuara.<br>% e palëve të interesuara të përfshirë në aktivitete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | historike, dhe e mjedisit të lidhur me këto objekte.<br>1.1.2.2 Mbështetje për aktivitete të përbashkëta kulturore.                                                                                                     |
| Prioriteti Tematik 2: Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve. (IP7)                                                                 | Forcimi i kapaciteteve prodhuese të SME-ve dhe aksesit të tyre në tregje.                             | 2.1.1 Ndërgjegjësimi dhe kapaciteti i SME-ve dhe bizneseve të reja për të hyrë në tregjet e reja dhe zinxhirët e vlerave janë rritur.                                                                                      | Vlera e eksportit të mallrave dhe shërbimeve (%).<br>Qarkullimi i bizneseve GVA.<br>Nr. i aktiviteteve të tregtisë së jashtme.<br>Nr. i bizneseve që marrin pjesë në aktivitete të reja të tregtisë së jashtme.<br>Nr. i SME-ve me certifikata të reja të konformitetit të fituara (ISO, HACCP etj.).<br>Nr. i tregjeve të reja dhe objekteve tregtare të zhvilluara nëpërmjet marrëveshjeve.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.1.1 Asistencë për SME-të dhe bizneset e reja për ndërkombëtarizim dhe gjetjen e partnerëve të biznesit.<br>2.1.1.2 Investime në tregun e vogël ndërkufitar dhe në objekte tregtare.                                 |
| Prioriteti Tematik 3: Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut. (TP2) | Rritja e ndërgjegjësimit për një ekonomi më të gjelbër, mjedis më të pastër dhe ndryshimet klimatike. | 3.1.1 Ndërgjegjësimi dhe njohuritë mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit janë rritur;<br>3.1.2 Infrastruktura publike në rrezik nga përmbytjet, erozioni i dherave dhe zjarret është përmirësuar. | 3.1.1 Përdorimi i ujit nga familjet dhe bizneset.<br>% e mbetjeve të grumbulluara për riciklim.<br>Nr. i fushatave ndërgjegjëse mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve dhe të mjedisit.<br>Nr. i sistemeve të menaxhimit të mbetjeve dhe zinxhirëve të vlerave të përmirësuar brenda zonës.<br>Nr. i aksioneve të pastrimit.<br>% e popullsisë në zonën CBC e ndërgjegjësuar mbi përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit në sektorët kyç.<br>% e të gjitha bizneseve dhe organizatave që marrin pjesë në veprimet e përbashkëta për menaxhimin e ujit dhe mbetjeve.<br>3.1.2 Gjatësia e rrugëve të mbrojtura.<br>Madhësia e sipërfaqes | 3.1.1.1 Promovimi dhe mbështetja e përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit.<br>3.1.2.1 Promovimi i investimeve të vogla në infrastrukturë për rimëkëmbjen nga katastrofat dhe mbrojtjen e mjedisit. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bujqësore të mbrojtur.<br>Madhësia e zonave<br>pyjore të mbrojtura.<br>Nr. i projekteve të<br>mbështetur.<br>Nr. i objekteve të<br>siguruara për mbrojtjen<br>nga përmbytjet dhe<br>zjarret.<br>Nr. i fushatave të<br>ndërgjegjësimit.<br>Numri i familjeve /<br>fermave dhe<br>organizatave të tjera që<br>përfitojnë nga aktivitetet<br>e reja.<br>Madhësia e zonës së<br>Bashkëpunimit<br>Ndërkufitar të mbuluar<br>nga aktivitetet.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Asistenca<br>Teknike | Të sigurojë<br>zbatimin efektiv,<br>efikas,<br>transparent dhe<br>në kohë të<br>programit të<br>bashkëpunimit<br>ndërkufitar, si<br>dhe të rrisë<br>ndërgjegjësimin e<br>komuniteteve në<br>nivel kombëtar,<br>rajonal dhe lokal,<br>dhe në<br>popullsinë e<br>zonës së<br>programit në<br>përgjithësi.<br>Gjithashtu, ai<br>mbështet<br>aktivitete<br>ndërgjegjësimi në<br>nivel kombëtar,<br>me qëllim<br>informimin e<br>qytetarëve në të<br>dyja vendet<br>përfitues të IPA<br>II. Ky prioritet<br>do të forcojë<br>kapacitetin<br>administrativ të<br>autoriteteve dhe<br>përfituesve që do<br>të zbatojnë<br>programin, me<br>qëllim për të<br>përmirësuar | Mbështetja<br>administrative<br>për Strukturat<br>Operative dhe<br>Komitetin e<br>Përbashkët të<br>Monitorimit të<br>programit është<br>rritur.<br><br>Kapaciteti<br>teknik dhe<br>administrativ<br>për menaxhimin<br>dhe zbatimin e<br>programit është<br>rritur.<br><br>Vizibiliteti i<br>programit dhe i<br>rezultateve të tij,<br>garantohej. | Përqindja mesatare e<br>përfituesve të kënaqur<br>me mbështetjen nga<br>programi i zbatuar.<br><br>Rritja mesatare e numrit<br>të propozimeve të marra<br>në kuadër të çdo thirrje<br>të njëpasnjëshme.<br><br>Rritja mesatare e numrit<br>të koncept ideve që do të<br>kualifikohen për vlerësim<br>të mëtejshëm.<br><br>Rritja e numrit të<br>personave që marrin<br>pjesë në aktivitetet<br>promovuese.<br><br>Vizitat në faqen e<br>internetit të programit. | Ngritja dhe funksionimi i<br>Sekretariatit të<br>Përbashkët Teknik dhe<br>Antena-s së tij.<br><br>Organizimi i aktiviteteve,<br>takimeve, trajnimeve,<br>vizitave studimore apo<br>vizitave të shkëmbimit,<br>për të mësuar nga<br>praktikat më të mira të<br>nismave të tjera të<br>zhvillimit territorial.<br><br>Pjesëmarrja e stafit të<br>strukturave të<br>menaxhimit në forumet e<br>Ballkanit Perëndimor apo<br>të BE-së.<br><br>Përgatitja e manualeve /<br>doracakëve të brendshëm<br>dhe/ose të jashtëm.<br><br>Asistencë për aplikuesit e<br>mundshëm në partneritet<br>dhe për zhvillimin e<br>projektit (forume për<br>kërkimin e partnerëve<br>etj.).<br><br>Këshilla për përfituesit e<br>granteve mbi çështje<br>lidhur me zbatimin e<br>projektit.<br><br>Monitorimi i zbatimit të<br>projektit dhe programit, |

|  |                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pronësinë dhe përshtatshmërinë e programit me rezultatet e projekteve. |  |  | <p>duke përfshirë krijimin e një sistemi të monitorimit dhe raportimit përkatës.</p> <p>Organizimi i aktiviteteve të vlerësimit, analizave, sondazheve dhe/ose studimeve.</p> <p>Informim dhe publicitet, duke përfshirë përgatitjen, miratimin dhe rishikimin e rregullt të një plani vizibiliteti dhe komunikimi, shpërndarjen e informacionit (ditë informimi, mësimet e nxjerra, studimet e rasteve më të mira, artikuj dhe deklarata për shtyp), ngjarje promovuese dhe artikuj të shtypur, zhvillimi i mjeteve të komunikimit, mirëmbajtja, përditësimi dhe përmirësimi i faqes së internetit të programit etj.</p> <p>Mbështetje për punën e Task-Forcës së Përbashkët të ngarkuar me përgatitjen e ciklit të programit 2021-2026.</p> <p>Tjetër.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Çështjet horizontale dhe të ndërthurura

Çështjet horizontale dhe ndërsektoriale kanë të bëjnë me temat e ndërlidhura me modalitetet e zbatimit të prioritetëve tematike të përzgjedhura dhe me politikat e komunitetit të karakterit horizontal.

Programi pranon aksionet **njerëz-për-njerëz** dhe **rrjetet institucionale / të bashkëpunimit për LPP** si modalitete që do të zbatohen në të gjitha prioritetet e zgjedhura tematike.

Përveç kësaj, legjislacioni i BE-së kërkon që çështjet specifike horizontale dhe ndërsektoriale që janë pjesë e politikave të komunitetit, të trajtohen në mënyrën e duhur në të gjitha programet e financuara nga BE. Në këtë kontekst, strategjia ka të bëjë me prioritetet e Evropës 2020 në harmoni me rrethanat rajonale, duke trajtuar një vizion të ekonomisë sociale të tregut në Evropë, duke sjellë kështu nivele të rritura të punësimit, produktivitetit dhe kohezionit social. Kjo strategji është e bazuar në tri prioritetet e përbashkët përforcues: **Rritje e mençur, e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse** për të gjithë. Në këtë kontekst, **qëndrueshmëria sociale** është çështja që integrohet në këtë program të bashkëpunimit ndërkufitar, e cila synon të parandalojë çdo diskriminim në bazë të gjinisë, prejardhjes raciale apo etnike, fesë ose besimit, paaftësisë, moshës ose orientimit seksual. Ndërsa **qëndrueshmëria e mjedisit** do të kërkojë kryesisht pajtueshmërinë me Direktivën e Habitaveve 92 /43/KE, Direktivën për Zogjtë 79/409 / KE dhe direktivat në lidhje me rrjetin evropian të zonave të mbrojtura NATURA 2000. Në krye të kësaj, çështjet mjedisore do marrin në konsideratë drejtpërdrejt aspekte që, ndër të tjera, lidhen me menaxhimin e mbetjeve, efikasitetin e energjisë dhe aftësinë ripërtëritëse ndaj ndryshimeve

klimatike si pjesë e Prioritetit 3.

Çështjet horizontale dhe ndërsektoriale do të trajtohen në mënyrë të dyfishtë:

1. Nëpërmjet operacioneve dhe aktiviteteve të drejtpërdrejta, duke nxitur dhe mbështetur rritjen gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshmërinë sociale dhe mjedisore;

2. Nga përfshirja e tyre si çështje të ndërlidhura që kanë ndikim të tërthortë dhe integrohen në operacionet dhe aktivitetet brenda çdo prioriteti tematik.

Rrjedhimisht, Strukturat Operative janë të nevojshme për të futur dispozita të veçanta në dokumentet që shtrojnë bazat për aktivitetet dhe operacionet, p.sh. skemat e granteve, termat e referencës etj., në mënyrë që të sigurohet që:

- Aktivitetet dhe operacionet të mos vendosin pengesa të lidhura me gjininë, pikëpamjet, orientimin seksual, racor apo origjinën etnike, veçanërisht në lidhje me punësimin dhe politikën e HR të ndjekura ndaj personave të cilët do të jenë të punësuar në kuadër të projekteve të zbatuara nën skemat e granteve ose përmes ndërhyrjeve të asistencës teknike;

- Përshtatshmëria për personat me aftësi të kufizuara të jetë një nga kriteret që duhet të respektohet për zhvillimin e infrastrukturës;

- Përfituesit e granteve të bashkëpunimit ndërkufitar të sigurojnë që përfituesit përfundimtarë të kenë mundësi të barabarta aksesit në të gjitha shërbimet, trajnimet, asetet ose pajisjet fikse ose jomateriale të blera nëpërmjet aktiviteteve dhe operacioneve;

- Aktivitetet dhe operacionet, gjithashtu, duhet të hartohen në përputhje me parimet e një mjedisi të qëndrueshëm dhe promovimit të mbrojtjes së mjedisit, dhe të prodhojnë ndikim pozitiv ose të paktën neutral në mjedis. Që aktivitetet dhe operacionet të kenë ndikim pozitiv, duhet të hartohen me qëllim që, ose të marrin në konsideratë të paktën një nga pikat e mëposhtme:

- Përmirësimin e zinxhirit të menaxhimit të mbetjeve (për mbetjet e ngurta dhe/ose të lëngshme);

- Zvogëlimin e vëllimit të mbetjeve tashmë të krijuara, në fazën e planifikimit dhe projektimit të projektit individual;

- Përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore,

- Elasticitetin klimatik;

- Proceset pjesëmarrëse të planifikimit dhe konsultimit publik për proceset e planifikimit të zhvillimit hapësiror dhe të investimeve.

- Projektet të kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në krijimin e vendeve të punës (duke përfshirë dialogun social), nxitjen e punësimit dhe forcimin e kushteve të punës, si dhe të promovojnë sigurimin e barazisë.

Temat horizontale dhe të ndërlidhura të këtij programi të bashkëpunimit ndërkufitar duhet të harmonizohen edhe nëpërmjet prioritetit të Asistencës Teknike që synon forcimin e efikasitetit dhe efektivitetit të ndërhyrjeve të bashkëfinancimit nga fondet e IPA II me cilësi të lartë dhe menaxhim të shëndoshë në nivel kombëtar, dhe me mbështetje gjithëpërfshirëse në nivel lokal.

Projektet e përgatitura në kuadër të qasjes së Zhvillimit të Bazuar në Zonë (ABD) për të lehtësuar rritjen e qëndrueshme në zonat gjeografike të përcaktuara në rajonet ndërkufitare të Ballkanit Perëndimor, në zona të veçanta rurale që karakterizohen nga probleme të veçanta komplekse zhvillimore, mund të konsiderohen për financim në kuadër të këtij programi të bashkëpunimit ndërkufitar. Puna përgatitore për qasjen ABD tashmë të zbatuar në rajonin ndërkufitar që mbulon ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikën e Shqipërisë, do të merret në konsideratë.

#### SEKSIONI 4 PLANI FINANCIAR

Tabela 1 tregon sasinë vjetore të parashikuar të kontributit të Bashkimit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar për periudhën 2014–2020. Tabela 2 ofron një shpërndarje të parashikuar për alokimet për secilin prioritet tematik, si dhe një parashikim mbi shumën maksimale të bashkëfinancimit të Bashkimit Evropian.

**Tabela 1.** Alokimet e parashikuara financiare në vit për programin e bashkëpunimit ndërkufitar 2014–2020

| Viti | Programi IPA II CBC ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë | Totali (EUR) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                  | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2014–2020  |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Operacionet CBC (të gjitha prioritetet tematike) | 1 190 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 190 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 530 000 | 10 710 000 |
| Asistenca Teknike                                | 510 000   | 0.00      | 0.00      | 510 000   | 0.00      | 0.00      | 170 000   | 1 190 000  |
| <b>Totali (EURO)</b>                             | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 11 900 000 |

**Tabela 2.** Alokimet e parashikuara financiare për prioritet gjatë periudhës 2014–2020 dhe shkalla e kontributit të BE-së

| PRIORITETET                                                                                                                                        | Programi IPA II CBC ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë 2014–2020 |                               |                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                    | Kontributi i BE-së                                                                           | Bashkëfinancimi i përfituesve | Financimi total | Shkalla e kontributit të BE-së |
|                                                                                                                                                    | (a)                                                                                          | (b)                           | (c) = (a)+(b)   | (d) = (a)/(c)                  |
| 1. Prioriteti Tematik 1: Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore                                                                     | 3 750 000.00                                                                                 | 661 764.71                    | 4 411 764.71    | 85%                            |
| 2. Prioriteti Tematik 2: Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve                                                                 | 3 750 000.00                                                                                 | 661 764.71                    | 4 411 764.71    | 85%                            |
| 3. Prioriteti Tematik 3: Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut | 3 210 000.00                                                                                 | 566 470.58                    | 3 776 470.58    | 85%                            |
| 4. Asistenca Teknike                                                                                                                               | 1 190 000.00                                                                                 | 0.00                          | 1 190 000.00    | 100%                           |
| <b>GRANTI TOTAL</b>                                                                                                                                | 11 900 000.00                                                                                | 1 890 000.00                  | 13 790 000.00   |                                |

Kontributi i BE-së është llogaritur në raport me shpenzimet e pranueshme, të cilat bazohen në totalin e shpenzimeve të pranueshme, duke përfshirë shpenzimet publike dhe private. Shkalla e bashkëfinancimit të BE-së në nivel të çdo prioriteti tematik nuk duhet të jetë më pak se 20% dhe jo më e lartë se 85% e shpenzimeve të pranueshme.

Bashkëfinancimi i prioritetëve tematike do të sigurohet nga përfituesit e granteve. Përfituesit e grantit duhet të kontribuojnë me një minimum prej 15% të totalit të shpenzimeve të pranueshme.

Shuma e dedikuar për Asistencën Teknike do të kufizohet në 10% të shumës totale të caktuar për programin. Shkalla e bashkëfinancimit të BE-së do të jetë 100%.

Fondet për prioritetet tematike do të jepen nëpërmjet Vendimeve të Komisionit Zbatues, duke mbuluar alokime një deri në trevjeçare, sipas nevojës. Fondet për Asistencën Teknike do të jepen nëpërmjet një Vendimi të veçantë të Komisionit Zbatues.

## SEKSIONI 5

### DISPOZITAT ZBATUESE

Në kuadër të këtij programi nuk janë parashikuar thirrje për projekte strategjike.

Ashtu siç është parashikuar nën prioritetin e Asistencës Teknike, aplikuesit kanë të drejtë të kenë mbështetje gjatë hartimit dhe zhvillimit të projektit.

Duke pasur parasysh që baza duhet të identifikohet përpara ndërhyrjes së programit, të gjithë aplikuesit duhet të ofrojnë informacionin e kërkuar për të llogaritur vlerën e treguesve bazë. Informacioni duhet të sigurohet për aplikuesin kryesor, të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët.

Për shkak të burimeve të kufizuara financiare, nuk ka asnjë dispozitë për të synuar nën-tema ose aktivitete specifike për thirrje për propozime.

Modalitetet e propozuara të zbatimit janë të detajuara në përshkrimin e çdo prioriteti, të **bazuar në supozimin se gjatë periudhës së zbatimit të programit do të kryhen tri raunde të thirrjeve për projekt propozime** dhe në faktin që nuk është parashikuar asnjë projekt strategjik për zbatim. Tabela e mëposhtme përmbledh këto modalitete bazuar në dy skenarë të hartuar nën paragrafin e modaliteteve të zbatimit të seksionit 3.2. Megjithatë, këta skenarë kanë një natyrë supozuese dhe mund të ndryshojnë në bazë të mundësive të tjera që mund të shqyrtohen gjatë zbatimit të programit dhe me qëllim të ngritjes së efikasitetit dhe rezultateve të prokurimit.

#### Skenari 1

Ky skenar parashikon organizimin e tri rundeve të thirrjeve për propozime me ndarje të barabartë financiare për çdo prioritet tematik, me afërsisht 1/3 e buxhetit total të programit për prioritet. Të gjitha thirrjet do të synojë secilin prioritet dhe aktivitete të zgjedhura.

Të gjitha grupet e synuara do të kenë akses të barabartë në financimin e ofruar nga programi.

| Raundi i thirrjeve për projekt-propozime | Aktivitetet |
|------------------------------------------|-------------|
| I pari                                   | 1.1.1.2     |
|                                          | 1.1.2.2     |
|                                          | 2.1.1.1     |
|                                          | 3.1.1.1     |
| I dyti                                   | 1.1.1.1     |
|                                          | 1.1.2.1     |
|                                          | 2.1.1.2     |
|                                          | 3.1.2.1     |
| I treti                                  | 1.1.1.1     |
|                                          | 1.1.2.1     |
|                                          | 1.1.1.2     |
|                                          | 1.1.2.2     |
|                                          | 2.1.1.1     |
|                                          | 2.1.1.2     |
|                                          | 3.1.1.1     |

#### Skenari 2

Sipas këtij skenari çdo thirrje për projekt propozime do të synojë një prioritet të vetëm, përveç raundit të parë ku Aktiviteti 1.1.2.2 është përjashtuar. Ky aktivitet do të përfshihet në raundin e dytë dhe të tretë të thirrjeve për projekt propozime, në mënyrë të përsëritur.

| Raundi i thirrjeve për projekt-propozime | Aktivitetet |
|------------------------------------------|-------------|
|------------------------------------------|-------------|



|         |                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I pari  | Prioriteti 1, përveç aktivitetit 1.1.2.2 që mund të qarkullojë gjatë gjithë periudhës së zbatimit |
| I dyti  | Prioriteti 2 me aktivitetin 1.1.2.2                                                               |
| I treti | Prioriteti 3 me aktivitetin 1.1.2.2                                                               |

Të gjithë projektet dhe aksionet do të përzgjidhen për mbështetje duke pasur parasysh çështjet horizontale dhe ndërsektoriale të parashikuara në pikën 3.3.

Projektet duhet të projektohen dhe paketojnë në përputhje me parimin e partnerit kryesor.

## LISTA E SHTOJCAVE

### SHTOJCA 1

#### ANALIZA E SITUATËS DHE ANALIZA SWOT

##### Analiza e Situatës së Zonës së Programit

Rajoni kufitar midis ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë karakterizohet nga gjuhë të ndryshme të folura dhe larmi etnike, por kulturë, histori dhe vlera tradicionale të ngjashme. Karakteristikat e mëposhtme kryesore hapësinore dhe klimatike dominojnë zonën e programit:

**Vargu jugor i Alpeve Dinarike** (Dinariket) me pyje dhe kullota të bollshme, natyrë të pasur dhe mjedis të kombinuar me fusha dhe ultësira, pengon aksesin në të gjithë rajonin: diferenca ndërmjet majës më të lartë (Golem Korabi 2.753 m mbi nivelin e detit) dhe zonave fushore të Pellagonisë (130 m mbi nivelin e detit) është më shumë se 2.600 m.

**Liqeni i Ohrit, i Prespës dhe liqeni artificial i Dibrës**, së bashku me Parqet Kombëtare Galiciça dhe Shebenik-Jabllanicë dhe fushat, kanionet dhe livadhet e tyre, sigurojnë kushte të favorshme për faunën dhe florën dhe mundësitë e zhvillimit të turizmit. Pyjet mbulojnë rreth 44% të zonës së programit të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe 37% të zonës së programit të Republikës së Shqipërisë. Liqeni i Ohrit është deklaruar nga UNESCO-ja si vend kulturor dhe natyror i trashëgimisë botërore dhe Liqeni i Prespës është një zonë Ramsar me rëndësi ndërkombëtare;

**Dy korridoret kryesore të transportit mbarë-evropian** nxjerrin në pah vendndodhjen e rëndësishme gjeostrategjike të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë në Evropën Juglindore. **Korridori VIII** (Durrës–Shkup–Sofje–Varna) dhe **Dega D e Korridorit X** (Igoumenicë–Manastir–Prilep–Veles) ndikojnë fuqishëm në dinamikën e zonës së programit, ekonominë, njerëzit dhe mjedisin e saj.<sup>11</sup>



<sup>11</sup> Korridoret e përcaktuara sipas konkluzioneve të Konferencës së Kretës (1994) dhe Konferencës së Helsinkit (1997) mbi korridoret multimodal Pan-Evropian dhe Marrëveshjes së Mirëkuptimit të nënshkruar nga vendet e Ballkanit Perëndimor (2004).



**Zona kufitare është e pasur me minerale, p.sh.:** krom, qymyr, hekur–nikel, bakër, gëlqere, kuarc, rërë dhe mermer.

**Rajoni ndërkufitar karakterizohet nga kushte të ndryshme klimatike:** nga transkontinentale në veri, në transmesdhetare në jug dhe në pjesët qendrore. Megjithatë, në zonat më malore të këtyre rajoneve dimri është i ftohtë dhe i lagësht, ndërsa vera është e nxehtë dhe e thatë. Temperaturat në zonat malore përgjatë kufirit variojnë prej -16 deri në +36 gradë (minimumi dhe maksimumi). Mesatarja vjetore e reshjeve në anën e Republikës së Shqipërisë (+1.400 mm) është më e lartë se sa në anën e kufirit të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë (600 mm).<sup>12</sup>

#### **Aspektet politike**

Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka qenë identifikuar si një kandidat potencial për anëtarësim në BE që në vitin 2003. Vendi ka aplikuar për anëtarësim në BE në mars të vitit 2004 dhe i është dhënë statusi i kandidatit në vitin 2005.

Në mënyrë të ngjashme me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Republika e Shqipërisë u identifikua si një kandidat potencial për anëtarësim në BE në vitin 2003. Në vitin 2009 Republika e Shqipërisë paraqiti kërkesën zyrtare të saj për anëtarësimin në BE. Në vitin 2010, Komisioni vlerësoi se përpara se negociatat e pranimit të mund të hapen formalisht, Republika e Shqipërisë duhet të punonte akoma për të arritur një shkallë të nevojshme të përputhshmërisë me kriteret e anëtarësimit dhe, në veçanti, për të përmbushur 12 prioritetet kyçe të identifikuara nga Opinioni. Më vonë në vitin 2012, Komisioni rekomandoi që Republikës së Shqipërisë t'i jepet statusi i kandidatit të BE-së, duke i lënë si detyrë plotësimin e masave kyçe në fushat e reformës gjyqësore dhe të administratës publike, si dhe rishikimin e rregullave të procedurave parlamentare.

Për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë kuadri udhëzues i referencës politike është informuar nga Plani Kombëtar për Miratimin e *Acquis*, i cili informon politikat kombëtare dhe veprimet e qeverisë. Objektivat kryesorë strategjikë të Programit të Punës së Qeverisë së ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë që kanë të bëjnë me periudhën 2011–2015 përfshijnë:

- 1. Përsheptimi i rritjes ekonomike, punësimit dhe standardit të jetesës së qytetarëve,** duke përfshirë cilësinë e jetesës;
- 2. Integrimi i ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë në BE dhe NATO;**
- 3. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit** dhe zbatimi efikas i ligjit duke ndërmarrë reforma të thella në gjyqësor dhe në administratën publike;
- 4. Mirëmbajtja e marrëdhënieve të mira ndëretnike** bazuar në parimet e tolerancës dhe respektit reciprok dhe zbatimi i Marrëveshjes Kuadër të Ohrit; dhe
- 5. Mbështetja e investimeve në arsim, shkencë dhe teknologji informacioni,** si elementë kryesorë të një shoqërie të bazuar në dije.

Strategjia për Zhvillimin Rajonal 2009–2019 e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë identifikon bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkufitar, si një nga shtyllat dhe objektivat kryesorë të zhvillimit të balancuar social-ekonomik rajonal. Rajonet kufitare, së bashku me zonat rurale dhe malore janë përcaktuar si zona me nevoja të veçanta zhvillimi, duke u bërë kështu një prioritet për ndërhyrje social-ekonomike.

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim e Republikës së Shqipërisë 2014–2020 (NSDI) konsiderohet si kuadri i politikave gjithëpërfshirëse për vendin në kontekstin e integritimit në BE. Ajo përcakton katër shtyllat e politikës strategjike që përcaktojnë themelet për ndërhyrjet sektoriale dhe të bazuara në vend:

- 1. Forcimi i demokracisë dhe shtetit të së drejtës** që trajton aspekte si: sistemi zgjedhor, drejtësia dhe punët e brendshme, të drejtat e njeriut dhe media, qeverisja efektive dhe politikat e jashtme dhe të mbrojtjes;
- 2. Krijimi i kushteve për zhvillim ekonomik konkurrues dhe të qëndrueshëm nëpërmjet përdorimit efikas të burimeve** që mbulojnë: stabilitetin dhe qëndrueshmërinë makroekonomike, ekonominë konkurruese të tregut, përdorimin efikas të burimeve, zhvillimin e integruar rajonal dhe zhvillimin e qëndrueshëm;
- 3. Nxitja e përfshirjes sociale, mirëqenies dhe zhvillimit të tregut të punës,** të cilat synojnë të

---

<sup>12</sup> Burimi: Banka Botërore

promovojnë: politikat e punësimit dhe përfshirjes sociale, politikat sociale;

**4. Zhvillimi i një shoqërie të bazuar në dituri, inovacion dhe teknologji digjitale**, që përfshin ndërhyrjet në fushat në vijim: arsimin e lartë, kërkimin dhe inovacionin, teknologjinë e informacionit dhe komunikimit.

Strategjia Ndërsektoriale e Zhvillimit Rajonal të Republikës së Shqipërisë dallon **zonat kufitare si subjekt të planifikimit të politikave ndërsektoriale** dhe i bën çështjet ndërkufitare pjesë të planifikimit të politikave të zhvillimit në nivel qarku.

Raportet e vitit 2012 nga Komisioni për Parlamentin dhe Këshillin Evropian mbi zbatimin e reformave në kuadër të anëtarësimit në BE për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikën e Shqipërisë theksojnë se marrëdhëniet midis dy vendeve vazhdojnë të përmirësohen dhe ato tregojnë baza të shëndosha për shfrytëzimin e mundësive ekonomike në të dyja anët e kufirit.

#### **Demografia**

Dinamikat në demografi janë të ndryshme në të dyja vendet. Ndërsa norma e popullsisë së përgjithshme të Republikës së Shqipërisë ka pësuar rritje të ndjeshme dhe është dyfishuar në 50 vitet e fundit, popullsia e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë është rritur me mesatarisht 29%.

Në fund të vitit 2012, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Republika e Shqipërisë kishin një popullsi prej përkatësisht 2,061,044 dhe 2,815,749 banorë. Zona e programit përfshin 770,802 banorë në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë (37.4% e popullsisë së përgjithshme të saj) dhe 656,873 banorë në Republikën e Shqipërisë (23.3% e popullsisë së përgjithshme të saj). Një ndarje më e detajuar e nivelit të popullsisë sipas NUTS-3 dhe dendësisë së popullsisë (persona/km<sup>2</sup>) është dhënë më poshtë.

| <b>Zona e Programit</b>                                            | <b>Numri i banorëve</b> | <b>Dendësia e popullsisë</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Pellagonia                                                         | 232,959                 | 49.4                         |
| Pollogu                                                            | 317,003                 | 131.2                        |
| Jugperëndimi                                                       | 220,840                 | 66.1                         |
| <b>Gjithsej në zonën e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë</b> | <b>770,802</b>          | <b>73.6</b>                  |
| Dibra                                                              | 137,811                 | 37.1                         |
| Elbasani                                                           | 297,476                 | 115.0                        |
| Korça                                                              | 221,586                 | 23.3                         |
| <b>Gjithsej në zonën e Republikës së Shqipërisë</b>                | <b>656,873</b>          | <b>69.2</b>                  |

*Burimi: Zyra e Statistikave e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, INSTAT*

Rajoni i Pollogut me kryeqytetin e tij në Tetovë dhe Elbasani me qytetin kryesor të Elbasanit janë njësitë statistikore më të mëdha në zonën e programit në aspektin e popullsisë. Roli i shquar policentrik i qendrave të tyre kryesore urbane është reflektuar në dendësinë e popullsisë së dy rajoneve.

Femrat përbëjnë 49.9% të popullsisë në tri rajonet e pranueshme në territorin e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, e cila pasqyron strukturën e popullsisë sipas gjinisë në të gjithë vendin. Në zonën e programit në Republikën e Shqipërisë femrat përbëjnë 49.5% të popullsisë së saj, që është pak nën mesataren e vendit (49,9%).

Për sa i përket rritjes natyrore të popullsisë, zonat e programit në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë karakterizohen nga rritje pozitive natyrore në rajonin e Pollogut dhe atë jugperëndimor, ndërsa të gjitha zonat përfituese në Republikën e Shqipërisë dhe në Pellagonia në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, po përjetojnë tendenca negative.

Megjithatë, vetëm normat e rritjes natyrore të bashkuara me bilancin e migrimit të kohëve të fundit ilustrojnë tendencat aktuale demografike. Brenda zonës së programit, vetëm rajonet e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë gëzojnë bilanc pozitiv të migrimit, ndërsa të gjithë rajonet në Republikën e Shqipërisë vuajnë nga tendencat negative të migrimit, të cilat kontribuojnë në shpopullimin e zonave të tyre. Bilanci negativ i migrimit në rajonet përkatëse të Republikës së Shqipërisë është shkaktuar nga zhvendosja e kontingjentit të punës të grup-moshës 25–40-vjeçare për të kërkuar për mundësi punësimi në rajone të tjera. Ndërsa largimi i meshkujve është më i përhapur në Dibër dhe Elbasan, Korça paraqet migrimin më të shpejtë të femrave drejt zonave të tjera.

Asnjëri nga të dyja vendet nuk përjeton plakjen e popullsisë. Përkundrazi, mosha mesatare në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë mbetet e njëjtë për dy vitet e fundit (38 vjeç) dhe popullsia në Republikën e Shqipërisë bëhet më e re (me një mesatare prej 36 dhe 35 vjeç përkatësisht).<sup>13</sup> Brenda zonës së programit, mosha më e lartë mesatare e popullsisë është në Pellagoni (40 vjeç) dhe mbetet e qëndrueshme gjatë viteve të fundit, ndërsa rajoni më i ri është ai i Pollogut (35 vjeç), me tendenca të ngjashme me ato të vëzhguara në Republikën e Shqipërisë.

Popullsia e re (grup-mosha 0–14 vjeç) përbën 17.1%, ndërsa popullsia e moshuar (65+ vjeç) përbën 11.9% të popullsisë së përgjithshme të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Në Republikën e Shqipërisë, shifrat përkatëse janë: 20.3% dhe 11.6%, dhe nuk ka mospërputhje të mëdha midis rajoneve të vendit. Përkundrazi, Pollogu dhe Pellagonia regjistrojnë diferencën më të lartë në lidhje me pjesën e popullsisë së tyre të moshuar: përkatësisht 8.5% dhe 15.0%.<sup>14</sup>

Raporti i moshës së të punësuarve është një çështje shqetësuese në Republikën e Shqipërisë. Edhe pse indeksi pësoi një rënie të ngadaltë dhe arriti në 47 në vitin 2012 ndërsa për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë është përcaktuar në 41, rritja natyrore e bashkuar me rritjen e parashikuar të jetëgjatësisë mund të ndikojë negativisht në ekonomi. Në zonën e programit, Pellagonia është rajoni më i prekur nga plakja e popullsisë (shkalla e moshës së të punësuarve është 43) ndërsa në Republikën e Shqipërisë është Korça (mesatarisht 50%).<sup>15</sup>

### **Kohezioni ekonomik**

Të dyja vendet shfaqin nivel të ngjashëm të zhvillimit dhe janë klasifikuar si ekonomi me të ardhura mbi mesataren nga Banka Botërore. Megjithatë niveli i Brendshëm i të Ardhurave Bruto i tyre thjesht e kalon vijën ndarëse midis ekonomive të tyre dhe të vendeve me të ardhura të ulëta – të mesme.

### **Prodhimi i Brendshëm Bruto**

Duke pasur parasysh faktin se analizat janë kryer mbi nivelin NUTS-3 dhe GDP-ja për frymë tregon pozitë të shquar të kryeqyteteve të të dyja shteteve, si të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe të Republikës së Shqipërisë, në vendet e tjera pasuria është e shpërndarë në mënyrë të moderuar në të dyja shtetet, me pabarazi më të larta të vërejtura në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, në krahasim me Republikën e Shqipërisë. Në vitin 2011, GDP-ja për frymë arriti në 3,631 € në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe 3,214 € në Republikën e Shqipërisë. Tabela e mëposhtme ilustron pabarazitë ndërmjet rajoneve të zonës së programit dhe treguesit e performancës së dy vendeve.

<sup>13</sup> Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave; llogaritja e bazuar në të dhënat e papërpunuara të INSTAT-it.

<sup>14</sup> Burimi: *si më lart*.

<sup>15</sup> Burimi: *si më lart*.

| Zona e Programit                             | GDP për frymë (EURO) | Indeksi (për vend = 100) |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pellagonia                                   | 3,702                | 102                      |
| Pollogu                                      | 1,719                | 47                       |
| Jugperëndimi                                 | 2,638                | 73                       |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>3,631</b>         | <b>100</b>               |
| Dibra                                        | 1,999                | 62                       |
| Elbasani                                     | 2,796                | 87                       |
| Korça                                        | 2,526                | 79                       |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>3,214</b>         | <b>100</b>               |

Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT

Rajoni i Pollogut është më i pazhvilluari në të gjithë zonën e programit dhe Dibra mbetet prapa në zonën e Republikës së Shqipërisë. Në të vërtetë, rajoni i Dibrës është më i varfri në aspektin e performancës ekonomike në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Të dyja rajonet janë në kufi me njëri-tjetrin.

Në vitin 2012, GDP-ja e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë u tkurr me 0.2%, ndërsa Republika e Shqipërisë ka shënuar një rritje të ulët prej 0.7%.


#### Vlera e Shtuar Bruto sipas sektorëve

GVA ilustron strukturën e ekonomisë së zonës së programit dhe kjo është e qartë nga të dhënat statistikore që tregojnë se struktura e ekonomisë së ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë është i ndryshëm nga struktura e ekonomisë së Republikës së Shqipërisë.

Republika e Shqipërisë mbështetet në tregjet me shumicë dhe pakicë që përbëjnë 31% të GVA-së së vendit, por ky sektor është i një rëndësie më të vogël në prefekturat e zonave të programit në Republikën e Shqipërisë. Këto janë rajone kryesisht bujqësore me prodhimin bujqësor të Dibrës dhe Korçës që kontribuojnë në 1/3 e GVA-së në këto rajone. Bujqësia në rajonet e zonës së programit në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë ka kontribut më të vogël në GVA-në rajonale, duke pasur si sektorë kryesorë për gjenerimin e vlerës së shtuar në ekonominë e vendit industrinë dhe shërbime të tjera. Miniera dhe industria e Pellagonisë është faktori më i rëndësishëm që kontribuon në pasurinë e këtij rajoni. Në të vërtetë, vlera e saj e shtuar industriale në shifra absolute pothuajse e barazon vlerën e shtuar bruto industriale të të gjitha rajoneve të tjera në zonën e programit të të dyja vendeve.

Kontributi në GVA nga sektorë të ndryshëm është përshkruar në figurën më poshtë.

Burimi: llogaritje bazuar në Zyrën Shtetërore të Statistikave; INSTAT

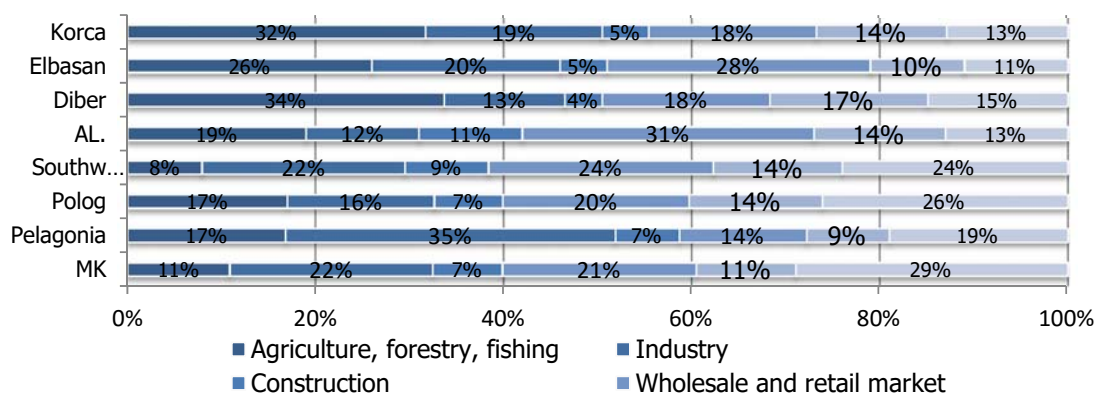

#### Tregtia e jashtme

Të dhënat mbi tregtinë e jashtme ilustrojnë potencialin ekonomik të çdo territori dhe është e qartë se zona e programit karakterizohet nga nivele të ulëta të aktivitetit ekonomik dhe konkurrencës ndërkombëtare. Në mënyrë të qartë, Pellagonia në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Elbasani në Republikën e Shqipërisë luajnë rolin më të rëndësishëm në ndërkombëtarizimin e ekonomisë në zonën e programit (tabela më poshtë).

| Zona e Programit                             | Aksionet në Eksport (%) | Aksionet në Import (%) |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pellagonia                                   | 6.4                     | 3.9                    |
| Pollogu                                      | 2.7                     | 2.9                    |
| Jugperëndimi                                 | 1.9                     | 1.8                    |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>100</b>              | <b>100</b>             |
| Dibra                                        | 1.4                     | 0.1                    |
| Elbasani                                     | 9.9                     | 7.1                    |
| Korça                                        | 3.2                     | 2.6                    |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>100</b>              | <b>100</b>             |

*Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë), Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (Republika e Shqipërisë)*

### Minierat dhe energjia

Zona kufitare ndërmjet dy vendeve është e pasur me minerale dhe burime natyrore. Ndërsa miniera e qymyrit është më e rëndësishmja për zonën kufitare të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë në basenet e Kërçovës dhe Pellagonisë, zona kufitare e Republikës së Shqipërisë, përveç qymyrit, shfrytëzon hekurin, bakrin dhe kromin. Brezi ndërmjet Bilishtit dhe Librazhdit ka depozita të konsiderueshme të hekurit dhe nikelit mineral. Prefekturat e Dibrës dhe Elbasanit janë të pasura me krom, me minierën e kromit në Bulqizën veriore që ka një rëndësi strategjike. Qymyri shfrytëzohet në Korçë, megjithatë depozitat e qymyrit në këtë zonë përbëjnë vetëm rreth 10% të të gjitha depozitave të qymyrit në Republikën e Shqipërisë.

Depozitat e qymyrit në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikën e Shqipërisë janë linjit me vlerë relativisht të ulët në kalori dhe me përmbajtje të lartë të lagështirës dhe të hirit nga epokat gjeologjike të Pliocenit dhe Miocenit.

Minerale të tjera përfshijnë: titan-magnez, talk, granit, mermer, gurë gëlqerorë, dolomite dhe gurë të tjerë dekorativë karbonatikë.

Rajonet Pollog dhe ai jugperëndimor në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë përmbajnë 9 termocentrale hidroelektrike, ndërsa në Pellagoni ndodhet një impiant i energjisë diellore. Zona kufitare e Republikës së Shqipërisë përmban 41 hidrocentrale, kryesisht në lumenjtë Drin dhe Devoll. Kapaciteti i përgjithshëm i prodhimit të energjisë elektrike të instaluar ilustron avantazhin e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, edhe pse është Republika e Shqipërisë ajo që prodhon energji elektrike të gjelbër në sajë të impianteve të saj hidroelektrike.

Rajonet në zonën e programit të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë prodhojnë 60% të energjisë elektrike të përgjithshme në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ndërsa rajonet në Republikën e Shqipërisë përbëjnë 47% të kapacitetit të impianteve të energjisë së vendit.

| Zona e Programit                             | Kapaciteti (MW) |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Pellagonia                                   | 685             |
| Pollogu                                      | 190             |
| Jugperëndimi                                 | 258             |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>1,889</b>    |
| Dibra                                        | 39.7            |
| Elbasani                                     | 18.9            |
| Korça                                        | 32.0            |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>195.8</b>    |


*Burimi: Zyra e Statistikave (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë), Enti Rregullator i Energjisë Elektrike (Republika e Shqipërisë), 2012*

### Sipërmarrja

Zona e programit karakterizohet nga veprimtari ekonomike nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Megjithatë rëndësia e tyre në ekonominë rajonale është më e ulët sesa në rajonet e tjera të të dyja vendeve. Vetëm 32% e SME-ve të përgjithshme të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe 17% e SME-ve të përgjithshme të Republikës së Shqipërisë ndodhen në zonën e programit, dhe këto vlera konsiderohen shumë të ulëta në raport me numrin e popullsisë në rajonet kufitare.

Pabarazitë rajonale tashmë të theksuara ndikojnë edhe në disproporcionin e intensitetit të SME-ve në secilin rajon të pranueshëm. Nga e gjithë zona e programit, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë më të përhapura në Pellagoni në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Korçë në Republikën e Shqipërisë. Siç përshkruhet në grafikun e mëposhtëm, rrethet e tjera përmbajnë një numër më të ulët të SME-ve.

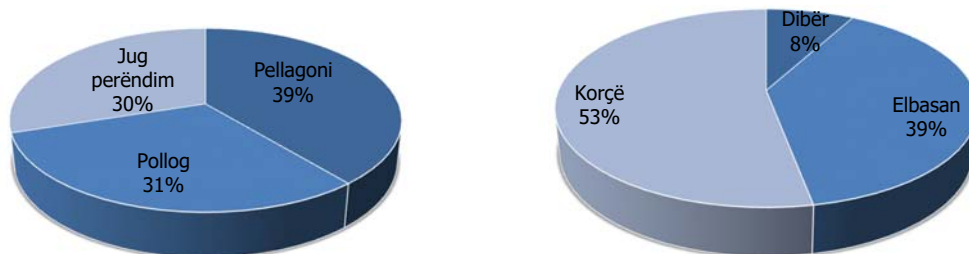

*Burimi: Llogaritje bazuar në Zyrën Shtetërore të Statistikave; INSTAT*

Ndërsa minierat dhe industritë e lidhura me to në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë janë në gjendje të tërheqin bizneset e vogla dhe të krijojnë mundësi për zinxhirin e vlerave, industritë e rënda në Republikën e Shqipërisë prodhojnë pak efekt përhapje dhe shumë pak mundësi ekonomike për bizneset e vogla.

Zakonisht, në zonat kufitare bizneset shfrytëzojnë mundësitë e tregtisë ndërkombëtare, por tregtia midis dy vendeve dhe të tretëve është e kufizuar nga pengesat administrative, kryesisht në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa gëzojnë përparësi të lartë krahasuese të kostove të importit dhe eksportit të mallrave, SME-të në Republikën e Shqipërisë operojnë në një nga kuadret më të pafavorshme administrative në Evropë për ndërkombëtarizimin e biznesit. Aspektet kryesore të këtij problemi janë paraqitur në tabelën e mëposhtme (në bazë të të dhënave të SBA-së).

| Faktori                                         | Republika e Maqedonisë | Republika e Shqipërisë |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kostot e kërkuara për të importuar (USD)        | 1,380                  | 710                    |
| Koha e kërkuar për të importuar (ditë)          | 11                     | 18                     |
| Nr. i dokumenteve të kërkuara për të importuar  | 6                      | 9                      |
| Kostot e kërkuara për të eksportuar (USD)       | 1,376                  | 725                    |
| Koha e kërkuar për të eksportuar (ditë)         | 12                     | 19                     |
| Nr. i dokumenteve të kërkuara për të eksportuar | 6                      | 7                      |

*Burimi: të dhënat e SBA, Ndërmarrja DG*

Barra administrative dhe konkurrenca e varfër rezultojnë në deficit të konsiderueshëm të tregtisë së jashtme midis dy vendeve, në disfavor të Republikës së Shqipërisë.

### **Punësimi**

Bazuar në gjetjet e LFS-së, në fillim të vitit 2012 dhe 2013, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Republika e Shqipërisë kishin përkatësisht 56.5% dhe 63.2% popullsi në moshë pune (grupmosha 15–64 vjeç) ekonomikisht aktive, me pabarazi të mëdha nëpër rajonet e të dyja vendeve. Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë përqindja më e lartë (60.9%) ishte regjistruar në rajonin Juglindor, dhe më e ulëta në rajonin e Pollogut (44.3%). Edhe pse shifrat rajonale nuk janë në dispozicion për Republikën e Shqipërisë, vlerësohet se rajoni i Tiranës regjistron normat më të larta të aktivitetit, në krahasim me pjesën tjetër të vendit. Zonat e kufirit të Republikës së Shqipërisë përmbajnë norma të aktivitetit nën mesataren e vendit.



Shkalla e punësimit prej 44% në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë është më e ulët se ajo në Republikën e Shqipërisë (50.1%). Në zonën kufitare CBC Pellagonia ka normën më të lartë (46.9%) ndërsa Pollogu dhe jugperëndimi – përkatësisht 29.3% dhe 32.4%. Rajonet e bashkëpunimit ndërkufitar në Republikën e Shqipërisë kanë norma punësimi më të larta, ku të gjithë e kalojnë mesataren e vendit: Dibra 55%, Elbasani 55.7% dhe Korça 53.8%. Këto norma të larta të punësimit rezultojnë nga niveli minimal i jetesës dhe nga prodhimi bujqësor në shkallë të ulët, i cili siguron një formë të sigurimeve shoqërore për pjesën më të madhe të popullsisë rurale, dhe shërben si një amortizator kundër normave të larta të papunësisë së regjistruar.

| Norma e punësimit | ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë | Republika e Shqipërisë |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Meshkuj           | 52.4                                  | 56.6                   |
| Femra             | 35.3                                  | 43.7                   |

*Burimi: LFS nga Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT*

Nivelet e punësimit sipas gjinisë, gjithashtu, përshkruajnë pabarazi të mëdha midis dy vendeve. Për Republikën e Shqipërisë, si meshkujt ashtu edhe femrat janë më aktivë në tregun e punës dhe gjejnë më shpesh mundësi për të bërë të ardhura se sa homologët e tyre në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Megjithatë, këto pabarazi rezultojnë kryesisht nga pjesa e lartë e punësimit në sektorin e bujqësisë, ku punojnë 40% e meshkujve dhe 60% e femrave ekonomikisht aktivë.

Në bazë të sektorëve, pjesën më të madhe të kontributit në krijimin e punësimit në Republikën e Shqipërisë e ka bujqësia (duke përfshirë peshkimin dhe pyjet), e cila punëson rreth 48.7% të popullsisë ekonomikisht aktive, ndërsa në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë kë sektor përbën 17.3% të të gjithë të punësuarve. Prodhimi industrial, industria dhe ndërtimi është punëdhënësi më i madh në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe përbën 29.9% të të gjithë të punësuarve. Në Republikën e Shqipërisë ky sektor kontribuon vetëm në 16% të mundësive për punësim.

Nuk ka të dhëna specifike mbi punësimin sipas sektorëve në nivel rajonal, por vlerësohet se sektori i shërbimeve është kontribuuesi kryesor në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe sektori i bujqësisë në Republikën e Shqipërisë.

### **Turizmi**

Natyra, trashëgimia kulturore dhe historike janë themelet kryesore të zhvillimit të turizmit në zonën kufitare. Potenciali turistik është i rëndësishëm në zonën kufitare, por ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë e ka më të zhvilluar industrinë e turizmit dhe i shfrytëzon mundësitë e zinxhirit të vlerave në shkallë shumë më të madhe se Republika e Shqipërisë. Kjo ilustron nga numri i qëndrimeve me fjetje në qendra akomoduese: ndërsa ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka regjistruar më shumë se 2,1 milionë në vitin 2012, Republika e Shqipërisë regjistroi vetëm 0.8 milion qëndrime turistike me fjetje. Turizmi familjar në Republikën e Shqipërisë përbën 55.6%, ndërsa në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë 62.2% të të gjithë industrisë së turizmit. Me më shumë se 26.8 mijë dhoma në qendrat akomoduese, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka kapacitet më të lartë strehimi se sa Republika e Shqipërisë (me vetëm 18.9 mijë dhoma).

Megjithatë, ka dallime strukturale dhe rajonale midis dy vendeve: ndërsa destinacionet turistike prioritare në Republikën e Shqipërisë janë në bregdetin Adriatik dhe Jon, infrastruktura e turizmit të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë përqendrohet në rajonin jugperëndimor. Në të vërtetë, trafiku i turizmit në jugperëndim është më i madhi i të gjitha rajoneve të vendit dhe përbën 45.1% të numrit të përgjithshëm të turistëve në vend, me zonat kryesore turistike rreth liqeneve të Ohrit dhe Prespës. Trafiku i turizmit në zonën e programit të Republikës së Shqipërisë është relativisht i parëndësishëm kur krahasohet me zonës ndërkufitare të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, edhe pse për shkak të mungesës së të dhënave specifike rajonale mbi këtë temë nuk mund të nxirren konkluzione të mëtejshme.

### **Ekonomia rurale**

Lartësia e tokës në zonën e programit krijon kushte të favorshme për pylltarinë dhe janë pikërisht zona Jugperëndimore dhe Pellagonia në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe të gjitha rajonet CBC në Republikën e Shqipërisë, zonat ku mbulimi i pyjeve është mbi mesataren e të dyja vendeve. Në të vërtetë, Republika e Shqipërisë përmban një ndër pjesët më të vogla të tokës së punueshme në të

gjitha tokat bujqësore në Evropë. Lartësia e tokës ndikon negativisht në ekonominë rurale të komuniteteve të zonës kufitare dhe zvogëlon mundësitë bazike ekonomike dhe të të ardhurave që rrjedhin nga shfrytëzimi i tokës.

Megjithatë, ekonomia rurale dhe bujqësia është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë në të dyja vendet, edhe pse Republika e Shqipërisë mbështetet në prodhimin e ushqimit në shkallë shumë më të madhe se sa ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë. Tabela e mëposhtme jep faktet thelbësore të potencialit ekonomik rural lidhur me tokën bujqësore (shifrat në '000 ha nëse nuk citohet ndryshe).

| Shteti / Rajoni                       | Tokë e përgjithshme bujqësore | Tokë e punueshme dhe kopshte | Tokë e punueshme si % e tokës bujqësore | Madhësia mesatare e fermës (ha) |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë | 1,268                         | 510                          | 40                                      | 1.60                            |
| Pellagonia                            | 263                           | 112                          | 43                                      | 2.90                            |
| Pollogu                               | 169                           | 43                           | 25                                      | 4.10                            |
| Jugperëndimi                          | 136                           | 50                           | 37                                      | 3.00                            |
| Republika e Shqipërisë                | 2,875                         | 696                          | 24                                      | 1.20                            |
| Dibra                                 | 249                           | 41                           | 16                                      | 0.72                            |
| Elbasani                              | 327                           | 73                           | 22                                      | 1.26                            |
| Korça                                 | 371                           | 91                           | 25                                      | 1.27                            |

*Burimi: INSTAT, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë) dhe: llogaritje të bazuara në të dhënat e Bankës Botërore për madhësinë e fermës në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, 2012*

Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë toka e punueshme përbën 40% të të gjithë tokës bujqësore, ndërsa në Republikën e Shqipërisë ky raport është 24%. Mesatarisht, në zonën e programit të të dyja vendeve pjesa e tokës së punueshme në raport me madhësinë e përgjithshme të tokës bujqësore është nën mesataren e vendit, duke sjellë kushte të pafavorshme për ekonominë rurale. Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë prodhimi bujqësor ka kushte më të favorshme natyrore për kulturat bujqësore dhe prodhimin blegtoral.

Ekonomia rurale e të dyja vendeve është e fragmentuar. Në Republikën e Shqipërisë madhësia mesatare e fermës është 1.2 ha dhe vetëm rajoni i Dibrës është nën mesataren e vendit. Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë madhësia mesatare e fermës është 1.6 ha, por zona e programit përmban fermat më të mëdha bujqësore në krahasim me çdo zonë tjetër të vendit.

Prodhimet bimore kryesore në zonën e programit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme. Prodhimet bujqësore janë radhitur në bazë të prodhimit të përgjithshëm për vendin dhe rajonin.

| Shteti / Rajoni                       | Prodhimi kryesor bujqësor                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë | <b>Gruri, perimet, patatet, misri, tërfili</b>                                 |
| Pellagonia                            | Gruri, perimet, patatet, frutat, jonxha, duhani                                |
| Pollogu                               | Misri, patatet, perimet, jonxha, tërfili                                       |
| Jugperëndimi                          | Patatet, gruri, misri, jonxha, perimet, frutat                                 |
| Republika e Shqipërisë                | <b>Gruri, misri, perimet, fasulet, patatet, tërshëra</b>                       |
| Dibra                                 | Misri, gruri, perimet                                                          |
| Elbasani                              | Gruri, misri, perimet, tërshëra, fasulet, patatet, bagëtitë, frutat dhe rrushi |
| Korça                                 | Gruri, misri, perimet, fasulet, elbi                                           |

*Burimi: përpunimi në bazë të INSTAT-it, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (Republika e Shqipërisë) dhe Zyra shtetërore e statistikave (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë), 2012*

Ndërsa zona CBC e Republikës së Shqipërisë është e specializuar në drithëra, perime, fasule dhe prodhimin e tërshërës, ekonomia rurale e ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë është më e larmishme dhe rajonet janë të specializuara në varietete të kulturave. Rajonet e Jugperëndimit dhe Elbasanit janë shembuj ku të ardhurat janë të larta dhe prodhimi është i larmishëm, ndërsa Korça dhe Pollogu kanë të ardhura më të ulëta në prodhimin bujqësor.

Ekonomia rurale në zonën e programit ndikohet negativisht nga erozioni i tokës. Lartësia e tokës,



veçanërisht në zonat ku alternohen malet, kodrat dhe luginat me karakterin e rrëmbyeshëm të reshjeve, kontribuon në humbjet e përshpejtuara të tokave. Nuk ka të dhëna specifike rajonale mbi erozionin e tokës, por në nivel kombëtar Republika e Shqipërisë është vlerësuar të ketë një humbje prej më shumë se 16 t/ha në vit, ndërsa për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, kjo shifër është vlerësuar të kalojë 18 t/ha.<sup>16</sup>

### Infrastruktura e transportit

Të dhënat kryesore mbi infrastrukturën dhe transportin janë përshkruar në tabelën e mëposhtme.

| Treguesi                                    | Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë | Republika e Shqipërisë |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Hekurudha (km)                              | 696                                   | 399                    |
| Rrugë në total (km)                         | 13,983                                | 18,000                 |
| Lokomotiva                                  | 52                                    | 53                     |
| Transport hekurudhor për mallra ('000 t-km) | 478,925                               | 8,333                  |
| Makina të pasagjerëve                       | 313,084                               | 300,974                |
| Mjete për transportin e mallrave            | 27,917                                | 71,278                 |
| Autobusë                                    | 2,636                                 | 6,698                  |

*Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë), INSTAT, Ministria e Punëve Publike dhe Transportit (Republika e Shqipërisë), 2012*

Nuk ka të dhëna që ilustrojnë ndarjen rajonale të infrastrukturës së transportit, por për të dyja vendet rruga e interesit të përbashkët të transportit është Korridori VIII Perëndim–Lindje dhe për zonën kufitare është një seksion i rrugës Elbasan–Kafasan–Shkup. Autostrada Tiranë–Elbasan e përfunduar kohët e fundit është një përmirësim i rëndësishëm në këtë rrugë ndërkombëtare, e cila përmirëson kushtet e sigurisë së transportit rrugor dhe aksesin në të.

Transporti rrugor duket si mënyra më e rëndësishme e transportit, pasi nuk ka asnjë hekurudhë që lidh të dyja vendet - linja Shkup–Kërçovë nuk shtrihet më tej në drejtim të Ohrit dhe në kufi.

### Kohezioni social

Ky seksion përshkruan tiparet kryesore të kapacitetit të zonës së programit për të siguruar mirëqenien e popullit të saj duke minimizuar dallimet dhe duke shmangur marginalizimin.

### Papunësia

Sipas metodologjisë LFS, shkalla e papunësisë përfaqëson pabarazi të mëdha ndërmjet dy vendeve kufitare. Në mënyrë të qartë, papunësia është një çështje shumë shqetësuese dhe problematike në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ndërsa në Republikën e Shqipërisë pjesa më e madhe e fuqisë punëtore thithet nga ekonomia e fragmentuar rurale.

| Zona e Programit                             | Papunësia (%) |
|----------------------------------------------|---------------|
| Pellagonia                                   | 25.3          |
| Pollogu                                      | 34.2          |
| Jugperëndimi                                 | 42.3          |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>31.0</b>   |
| Dibra                                        | 8.7           |
| Elbasani                                     | 6.0           |
| Korça                                        | 10.4          |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>13.4</b>   |

*Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT, LFS 2012*

### Të ardhurat

Pagesa mesatare neto për të punësuarit në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë arrin në 335 € dhe në Republikën e Shqipërisë deri në 356 €. Pra, njerëzit në Republikën e Shqipërisë fitojnë 7% më shumë se sa ata që jetojnë në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Pagat neto ndryshojnë në

<sup>16</sup> Burimi: Qendra e përbashkët kërkimore, Komisioni Evropian

rajone të ndryshme në të dyja vendet, por në zonat përfituese të programit nuk ka pabarazi të konsiderueshme në nivelin e të ardhurave neto.

| Zona e Programit                             | Paga neto, për vend = 100 |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Pellagonia                                   | 91.7                      |
| Pollogu                                      | 95.6                      |
| Jugperëndimi                                 | 90.8                      |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>100</b>                |
| Dibra                                        | 97.0                      |
| Elbasani                                     | 95.7                      |
| Korça                                        | 100.3                     |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>100</b>                |

*Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave, llogaritje në bazë të të dhënave të INSTAT-it*

### Teknologjia e informacionit

Zona e programit karakterizohet nga pabarazi të larta në aksesin dhe përdorimin e teknologjisë së informacionit, e cila është një nga forcat kryesore lëvizëse të zhvillimit ekonomik bashkëkohor. Pabarazitë lidhen me diferencat ndërmjet dy vendeve dhe midis rajoneve të pranueshëm të Republikës së Shqipërisë.

| Zona e Programit                             | Përdorimi i kompjuterëve | Përdorimi i internetit |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Pellagonia                                   | 61.0                     | 55.0                   |
| Pollogu                                      | 64.0                     | 64.0                   |
| Jugperëndimi                                 | 64.0                     | 57.0                   |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>64.0</b>              | <b>58.0</b>            |
| Dibra                                        | 15.5                     | 6.5                    |
| Elbasani                                     | 16.8                     | 8.3                    |
| Korça                                        | 14.5                     | 11.0                   |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>20.2</b>              | <b>14.1</b>            |

*Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave, INSTAT, LSMS 2012*

Të dhënat e mësipërme ilustrojnë një ndarje digjitale ndërmjet ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, ku familjet dhe bizneset shqiptare janë padyshim të ekspozuar ndaj përjashtimit digjital. Kjo dukuri përbën një shqetësim kritik, pasi nuk rezulton nga paaftësia apo mosha e njerëzve. Për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë normat krahasimore janë të larta, por prapë mbeten më të ulëta se në të gjithë shtetet anëtare të BE-së, me afërsisht 30% nën mesataren.

### Arsimi

Në të dyja vendet shkalla e arsimit është konsideruar e lartë: 96% për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe 97% për Republikën e Shqipërisë. Nuk ka devijime të mëdha rajonale nga mesatarja kombëtare apo pabarazi ndërmjet rajoneve që përbëjnë zonën e programit.

### Edukimi dhe shkollimi

Shkollimi dhe arsimimi janë strukturat dhe instrumentet qendrore për të zhvilluar dhe për të formësuar kapitalin njerëzor, i cili ka një rol themelor në ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme të bazuar në dije, konkurrencës, kohezionit social dhe qëndrueshmërisë.

Ndërsa aksesin në arsimin fillor është relativisht i ekuilibruar dhe shkollat nuk janë të mbipopulluara, arsimi i mesëm është disi më i sforcuar, veçanërisht në Republikën e Shqipërisë, me qarkun e Dibrës të ekspozuar kryesisht ndaj infrastrukturës së pamjaftueshme të shkollave. Në këtë rajon, numri mesatar i nxënësve për mësues është dukshëm më i lartë se mesatarja për vendin (shih tabelën më poshtë).

| Zona e programit | Nr. i nxënësve për | Nr. i nxënësve për | Nr. i studentëve të |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|

|                                              | mësues (arsimi fillor) | mësues (arsimi i mesëm) | diplomuar në 1,000 banorë |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Pellagonia                                   | 11                     | 14                      | 118                       |
| Pollogu                                      | 12                     | 13                      | 71                        |
| Jugperëndimi                                 | 10                     | 13                      | 92                        |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>12</b>              | <b>13</b>               | <b>103</b>                |
| Dibra                                        | 15                     | 21                      | 39                        |
| Elbasani                                     | 14                     | 16                      | 63                        |
| Korça                                        | 13                     | 15                      | 77                        |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>16</b>              | <b>16</b>               | <b>94</b>                 |

*Burimi: llogaritja e bazuar në të dhënat e papërpunuara nga Zyra Shtetërore e Statistikave dhe INSTAT, 2011*

Shekulli i 21<sup>te</sup> karakterizohet nga emigrimi i personave me arsim të lartë, e cila është një dukuri e përhapur me rritjen e rolit të qyteteve dhe qendrave urbane, duke thelluar ndarjen urbane-rurale. Ky fenomen ndikon seriozisht në zonën e programit, me përjashtim të rajonit të Pellagonisë. Në vendet e tjera problemi është i përhapur (më shumë në Republikën e Shqipërisë), me kulmin negativ në Dibër, ku përqindja e njerëzve me arsim universitar është më e ulët në mbarë territorin e programit CBC.

#### **Furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve**

Në zonën e programit, rreth 97% e familjeve nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë janë të lidhura me sistemet individuale ose publike të furnizimit me ujë dhe 95% - me sistemin e kanalizimeve të ujërave të zeza. Përkatësisht, në Republikën e Shqipërisë, këto shifra janë: 95% dhe 87%.

Nuk ka statistika mbi vëllimin e trajtimit të ujërave të zeza, por vlerësohet se të paktën deri në 10% të mbetjeve të lëngshme trajtohen. Përveç shfrytëzimit të pakontrolluar të plehrave kimike në bujqësi, mungesa e trajtimit të ujërave të zeza është arsyeja kryesore për eutrofikimin e përsheptuar të pjesës më të madhe të ekosistemeve ujore në zonën e programit (liqene dhe lumenj).

Për sa u përket mbetjeve të ngurta, 70% e mbetjeve të gjeneruara në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë është mbledhur, por për Republikën e Shqipërisë kjo pjesë është vlerësuar në nivele të konsiderueshme më të ulëta.

Tabela e mëposhtme përshkruan statistikat mbi mbetjet e ngurta të grumbulluara në zonën e programit.

| Zona e programit                             | Tonë ('000)  | Ndarja (%), për vend=100 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Pellagonia                                   | 72           | 13.0                     |
| Pollogu                                      | 59           | 10.6                     |
| Jugperëndimi                                 | 49           | 8.8                      |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>555</b>   | <b>100</b>               |
| Dibra                                        | 33.1         | 2.9                      |
| Elbasani                                     | 81.1         | 7.1                      |
| Korça                                        | 62.1         | 5.4                      |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>1,137</b> | <b>100</b>               |

*Burimi: Zyra Shtetërore e Statistikave (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë), Ministria e Mjedisit (Republika e Shqipërisë), 2012*

Në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, kapaciteti i vend-grumbullimeve të mbetjeve të ngurta është i shpërndarë në mënyrë të arsyeshme nëpër rajone dhe korrespondon në mënyrë të kënaqshme me vëllimin e mbetjeve të gjeneruara. Ndërsa për Republikën e Shqipërisë nuk disponohen të dhëna lidhur me këtë aspekt.

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta është një çështje shqetësuese për shkak të raportit të ulët të mbetjeve të krijuara dhe atyre të mbledhura. Përveç kësaj, ndarja gjatë depozitimit të mbetjeve është pothuajse joekzistuese, e cila rrit koston e menaxhimit të mbetjeve dhe ndikon në mjedis.

#### **Infrastruktura e kujdesit shëndetësor**

Infrastruktura e kujdesit shëndetësor përmban paparazi domethënëse përgjatë kufirit. Mesatarisht, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ofron mundësi më të mira të trajtimit të specializuar mjekësor dhe Pellagonia ka infrastrukturën më konkurruese të kujdesit shëndetësor në të gjithë zonën e

programit. Edhe pse territori CBC në anën e Republikës së Shqipërisë mund të ofrojë më shumë shtretër në spitale se mesatarja për të gjithë vendin, Shqipëria ka hyrë në marrëveshje strategjike me ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, sipas së cilës qytetarët e Republikës së Shqipërisë me sëmundje kronike mund të përdorin spitalet dhe klinikat në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë për një trajtim më të specializuar. Kjo ndodh për shkak të pranisë së kufizuar të pajisjeve moderne apo aksesit të vështirë fizik të infrastrukturës shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, kryesisht në zonat më të largëta.

| Zona e programit                             | Nr. i spitaleve | Nr. i shtretërve të spitaleve | Nr. i shtretërve të spitaleve për 1,000 banorë |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Pellagonia                                   | 3               | 1,419                         | 6,1                                            |
| Pollogu                                      | 7               | 646                           | 2                                              |
| Jugperëndimi                                 | 5               | 815                           | 2                                              |
| <b>Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë</b> | <b>73</b>       | <b>9,076</b>                  | <b>4,4</b>                                     |
| Dibra                                        | 3               | 508                           | 3,7                                            |
| Elbasani                                     | 6               | 1,020                         | 3,4                                            |
| Korça                                        | 4               | 752                           | 3,4                                            |
| <b>Republika e Shqipërisë</b>                | <b>44</b>       | <b>8,410</b>                  | <b>3</b>                                       |

*Burimi: Ministria e Shëndetësisë (ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, Republika e Shqipërisë)*

### Analiza SWOT

Kjo analizë SWOT ndjek logjikën e prioriteteve tematike të asistencës IPA II dhe përshkruan pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe kërcënimet duke marrë parasysh karakterin apo efektin e tyre strategjik (cilësia e nevojës ose e mundësisë). Kjo analizë SWOT mbulon vetëm ato tema që janë konsideruar për përfshirjen në ndërhyrjen strategjike dhe shton analizën e grupit të problemeve të përshkruar në seksionin 2.2 të dokumentit të programit.<sup>17</sup>

SWOT është hartuar në bazë të pyetësorëve individualë të plotësuar nga palët e interesuara të programit, reagimet nga Strategjitetë ekzistuese të Zhvillimit Rajonal në rajonet e NUTS-3 në zonën kufitare, dhe konkluzionet e ekspertëve mbi profilin social-ekonomik të rajonit.

Analiza më poshtë ndjek rendin sipas rëndësisë së prioriteteve tematike të zgjedhura për Programin IPA II CBC 2014–2020.

### Turizmi dhe trashëgimia kulturore dhe natyrore (TP4)

Aktualisht, niveli i pabarabartë i zhvillimit të infrastrukturës turistike në rajonin ndërkufitar e bën rajonin e përgjithshëm jotërheqës për një ofertë gjithëpërfshirëse turistike, veçanërisht në anën e Republikës së Shqipërisë. Kështu, format alternative të turizmit mund të përdoren si bazë për ndërtimin e një imazhi të zonës së programit si një destinacion tërheqës turistik.

Trashëgimia e pasur kulturore nuk është e ruajtur dhe paraqitur mirë. Kështu, iniciativat për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet njerëzve dhe institucioneve nga rajoni CBC duhet të intensifikohen në të ardhmen.

<sup>17</sup>Në korrik 2013 Strukturat Operacionale arritën në përfundimin se lista e TP-ve duhet të ngushtohet para hyrjes në fazën e konsultimeve më të gjera të programimit për shkak të burimeve të kufizuara financiare të programit. Më pas, TP-të janë renditur sipas rëndësisë së tyre dhe janë përfshirë në ndërhyrjen për vitet 2014–2020.

| Pikat e forta                                                                                                                                                 | Pikat e dobëta                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Efekt) Ofertë e pasur turistike bazuar në shfrytëzimin e burimeve natyrore, trashëgiminë kulturore, monumentet fetare, ujërat termale, sportin dhe argëtimin | (Dobësi strategjike) Nuk ka nivel të balancuar të infrastrukturës së turizmit (akomodim, sporte, terrene) dhe mungesa e strategjisë për ofertë të qëndrueshme turistike të rajonit CBC |
| (Pikë e fortë strategjike) Eksperienca në pritjen e mysafirëve vendas dhe ndërkombëtarë                                                                       | (Efekt) Mungesa e njohjes ndërkombëtare të të gjithë rajonit CBC si destinacion atraktivistik                                                                                          |
| (Pikë e fortë strategjike) Një pjesë e territorit CBC rrit njohjen e tij si destinacion turistik i rëndësishëm për turizmin familjar                          | (Efekt) Mirëmbajtja e papërshtatshme e monumenteve historike dhe kulturore                                                                                                             |
| Mundësitë                                                                                                                                                     | Kërcënimet                                                                                                                                                                             |
| (Efekt) Ofertë turistike e integruar, e bazuar në kulturë, sport, kohë të lirë, aventurë, turizmin spa (të llixhave)                                          | (Efekt) Mungesa e strategjisë së integruar të zhvillimit të turizmit dhe masave të përkushtuara për rajonin CBC                                                                        |
| (Mundësi strategjike) Shkëmbim më efikas dhe i integruar i përvojave ndërmjet dy vendeve dhe operatorëve                                                      | (Kërcënim strategjik) Investime të pa balancuara në infrastrukturën e turizmit                                                                                                         |
| (Mundësi strategjike) Plani i përbashkët për hartëzimin, mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e monumenteve kulturore dhe historike                                     | (Efekt) Imazhi i papërshtatshëm i rajonit CBC                                                                                                                                          |
| (Mundësi strategjike) Aktivitete të përbashkëta kulturore                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |

#### Konkurrenca, biznesi, tregtia dhe investimet (TP7)

SME-të, sipërmarrja dhe ekonomia rurale paraqiten si një nga forcat kryesore lëvizëse të zhvillimit ekonomik në zonën e programit. Ato janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të politikës dhe të tregut, kryesisht për shkak të konkurrencës së kufizuar dhe orientimit të tregut të tyre. Kështu, industritë e lehta, sektorët e qëndrueshëm të bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit janë konsideruar si një potencial për rritje më të qëndrueshme ekonomike të rajonit CBC në tërësi.

| Pikat e forta                                                                                                                  | Pikat e dobëta                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Pikë e fortë strategjike) Baza ekzistuese e SME-ve në rajonin e përgjithshëm me aktivitete të shumëllojshme                   | (Dobësi strategjike) SME-të janë të karakterit mikro dhe jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj ndryshimeve politike, fiskale apo të tregut           |
| (Pikë e fortë strategjike) Prodhimi i larmishëm bujqësor dhe ekonomia rurale në të gjithë rajonin                              | (Dobësi strategjike) Mungesa e specializimit, vlerës së shtuar, hulumtimit dhe orientimit të plotë të tregut                                    |
| (Efekt) Bizneset e mesme të qëndrueshme dhe konkurruese, veçanërisht në rajonet e Pollogut, Elbasanit dhe Pellagonisë          | (Efekt) Konkurrenca e kufizuar e produkteve në nivel rajonal dhe kombëtar, nivelet e ulëta të GVA                                               |
|                                                                                                                                | (Dobësi strategjike) Bujqësia e karakterizuar nga fragmentim i madh, produktivitet i kufizuar dhe mungesë e orientimit në treg                  |
|                                                                                                                                | (Dobësi strategjike) Burimet natyrore në dispozicion të bujqësisë konkurruese dhe praktikave të prodhimit të ushqimit, të pashfrytëzuara        |
|                                                                                                                                | (Kërcënim strategjik) Ofertë e kufizuar e produkteve gjysmë-të gatshme me sasi të qëndrueshme                                                   |
| Mundësitë                                                                                                                      | Kërcënimet                                                                                                                                      |
| (Efekt) Zhvillimi ekonomik i bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve të disponueshme natyrore dhe zinxhirët e vlerave | (Efekt) Mospërputhje të mëdha në nivelin e zhvillimit dhe aktivitetet ekonomike midis rajoneve të ndryshme në zonën e bashkëpunimit ndërkufitar |
| (Mundësi strategjike) Specializimi i SME-ve dhe fuqizimi i tyre përmes shtimit të vlerës së produkteve të tyre                 | (Efekt) Aktivitete të pamjaftueshme të eksportit                                                                                                |
| (Mundësi strategjike) Identifikimi i produkteve që mund të njihen në nivel ndërkombëtar                                        | (Efekt) Mikrosipërmarrjet jorezistuese ndaj ndryshimeve të tregut                                                                               |
| (Mundësi strategjike) Prodhimi bujqësor dhe përpunimi i ushqimit organik, ose të paktën i qëndrueshëm organik                  | (Kërcënim strategjik) Prodhimi bujqësor i gjerë me tërheqje të kufizuar të tregut                                                               |
| (Mundësi strategjike) Bashkëpunim dhe tregti më të zhvilluara midis shoqërive në rajonin e Bashkëpunimit                       | (Kërcënim strategjik) Erozioni i lartë i tokës për shkak të lartësisë së tokës                                                                  |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ndërkufitar</b>                                                                                                                                   |  |
| (Mundësi strategjike) Zhvillimi i infrastrukturës së biznesit dhe rrjeteve të biznesit (inkubatorët, qendrat mbështetëse të biznesit, shoqatat etj.) |  |

**Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut(TP2)**

Pavarësisht minierave intensive në territorin e kufizuar, rajoni i bashkëpunimit ndërkufitar është perceptuar si “zonë e gjelbër” e përshtatshme për zhvillimin ekonomik të bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, për shkak të pyjeve të bollshme, lumenjve dhe liqeneve. Megjithatë, rajoni nuk ka asnjë sistem për monitorimin e mjedisit apo për parandalimin e rrezikut. Për më tepër, mungesa e infrastrukturës mjedisore minimale të kërkuar (trajtimi i mbetjeve ujore, grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta etj.) mund të çojë në ndotjen e mëtejshme të pakontrolluar në rajon dhe në rënien e tërheqjes nga aktivitetet e biznesit të bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.

| <b>Pikat e forta</b>                                                                                                                                                                           | <b>Pikat e dobëta</b>                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Pikë e fortë strategjike) Prania e burimeve të shumëllojshme natyrore (uji, pyjet, flora dhe fauna, klima)                                                                                    | (Dobësi strategjike) Mungesa e planeve për mbrojtjen e mjedisit, monitorimin dhe sistemet e parandalimit të rrezikut për çdo lloj të ndotjes në rajon dhe parandalimin e erozionit të tokës |
| (Efekt) “Zonë e pastër”, pa ndotje të mëdha industriale                                                                                                                                        | (Dobësi strategjike) Mungesa e kontrollit të shfrytëzimit të burimeve natyrore (minierat, pyjet)                                                                                            |
| (Pikë e fortë strategjike) Prania e zonave të ndryshme klimatike (malore, kontinentale dhe mesdhetare) mundëson prodhimin më të specializuar të bujqësisë dhe zhvillimin e turizmit alternativ | (Efekt) Ndërgjegjësimi i ulët i popullsisë për mbrojtjen e mjedisit                                                                                                                         |
| <b>Mundësitë</b>                                                                                                                                                                               | <b>Kërcënimet</b>                                                                                                                                                                           |
| (Efekt) Zhvillimi i strategjisë së përbashkët për mbrojtjen e mjedisit të rajonit CBC, monitorimin, njohjen e hershme dhe parandalimit e rrezikut                                              | (Efekt) Rajonet e vogla me një kërcënim për ndotje që mund të rrezikojë zhvillimin e aktiviteteve të tjera ekonomike / turistike                                                            |
| (Mundësi strategjike) Zhvillimi i programeve të përbashkëta për trajtimin e mbetjeve                                                                                                           | (Kërcënim strategjik) Mungesa e stimujve dhe investimeve në mbrojtjen e mjedisit dhe/ose teknologjive më miqësore                                                                           |
| (Mundësi strategjike) Hartimi dhe zhvillimi i projekteve, studimeve të fizibilitetit për mbrojtjen e ujërave ndërkombëtare dhe ujërave nëntokësore                                             | (Kërcënim strategjik) Ujërat ndërkombëtare me rrezik të lartë të ndotjes                                                                                                                    |

## SHTOJCA II KUSHTET E PËRGJITHSHME

Përmbajtja

Pjesa e parë: Dispozita të përgjithshme

Neni 1. Periudha e ekzekutimit, periudha e zbatimit operacional dhe afati kontraktues

Neni 2. Përfituesit e IPA II dhe detyrat e tyre të përbashkëta

Neni 3. Kërkesat e raportimit

Neni 4. Vizibiliteti dhe komunikimi

Neni 5. Të drejtat e pronësisë intelektuale

Neni 6. Pranueshmëria e shpenzimeve

Pjesa e dytë: Dispozitat e zbatueshme të menaxhimit të tërthortë nga përfituesi i IPA II

Neni 7. Parime të përgjithshme

Neni 8. Procedurat e dhënies së prokurimit dhe granteve

Neni 9. Kontrollat paraprake mbi procedurat e granteve dhe prokurimeve dhe kontrollat paraprake të kontratave dhe granteve që do të kryhen nga komisioni

Neni 10. Llogaritë bankare, sistemet e kontabilitetit dhe kostot e njohura

Neni 11. Dispozita për pagesat e kryera nga Komisioni për përfituesit IPA II që është Autoriteti Kontraktues

Neni 12. Ndërprerja e pagesave

Neni 13. Mbulimi i fondeve

Pjesa e tretë: Dispozitat përfundimtare

Neni 14. Konsultimi mes përfituesve të IPA II dhe Komisionit

Neni 15. Amendimi i kësaj marrëveshjeje financimi

Neni 16. Pezullimi i kësaj marrëveshjeje të financimit

Neni 17. Përfundimi i kësaj marrëveshjeje financiare

Neni 18. Masat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

## PJESA E PARË DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

### **Periudha e ekzekutimit, periudha e zbatimit operacional dhe afati kontraktues**

1. Periudha e ekzekutimit është periudha gjatë së cilës Marrëveshja e financimit është zbatuar dhe përfshin periudhën operative të zbatimit, si dhe një fazë të mbylljes. Kohëzgjatja e periudhës së ekzekutimit është përcaktuar në nenin 2 (1) të Kushteve të Veçanta, dhe do të fillojë me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje Financimi.

2. Periudha e zbatimit operacional është periudha në të cilën kanë përfunduar të gjitha aktivitetet operative të mbuluara nga prokurimi dhe kontratat e grantit të Programit të Veprimit. Kohëzgjatja e kësaj periudhe është përcaktuar në nenin 2 (2) për Kushtet e Veçanta dhe do të fillojë me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje Financimi;

3. Periudha operationale e zbatimit dhe ekzekutimit duhet të respektohet nga Autoriteti Kontraktues në përmbajtje dhe zbatim të prokurimit dhe kontratave të granteve, në kuadër të kësaj marrëveshjeje financiare.

4. Kostot që lidhen me operationet e Programit të Veprimit do të jenë të pranueshme për financimin e BE-së vetëm nëse janë shkaktuar gjatë periudhës së zbatimit operativ.

5. Kontratat e grantit dhe të prokurimit do të përfundojnë e shumta brenda tre vjetëve nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes Financiare, përveç:

a) në ndryshimet në kontratat tashmë të lidhura;

b) kur kontratat individuale të prokurimit përfundojnë pas një ndërprerjeje të parakohshme të kontratës ekzistuese të prokurimit;

c) kontratave që lidhen me auditimin dhe vlerësimin, të cilat mund të jenë të nënshkruara pas zbatimit

operacional;

d) kur ndryshimi i entitetit është i ngarkuar me detyra të besuara.

6. Kur një kontratë granti ose prokurimi, nuk ka sjellë asnjë pagesë brenda dy viteve të nënshkrimit të saj, do të ndërpritet automatikisht dhe fondet e saj do të bllokohen.

#### Neni 2

### **Përfituesit e IPA II dhe detyrat e tyre të përbashkëta**

1. Siç parashikohet në nenin 76 (3) të kuadrit të marrëveshjeve përkatëse, përfituesit e IPA II do të bashkëpunojnë ngushtë dhe duhet të përmbushin bashkërisht në veçanti funksionet e mëposhtme dhe të marrin përsipër përgjegjësitë e mëposhtme:

a) Përgatisin programet e bashkëpunimit ndërkufitar në përputhje me nenin 68 të Marrëveshjeve Kuadër përkatëse ose rishikimet e tyre;

b) Sigurojnë pjesëmarrjen në Komitetin e Përbashkët të Monitorimit (KPM), mbledhje dhe takime të tjera dypalëshe;

c) Emërojnë përfaqësuesin e tyre në KPM;

d) Krijojnë Sekretariatit e Përbashkët Teknik (SPT) dhe sigurojnë që ka personel të mjaftueshëm;

e) Përgatisin dhe zbatojnë vendimet strategjike të KPM-së;

f) Mbështesin punën e KPM-së dhe sigurojnë informacionin e kërkuar për të kryer detyrat e veta, në veçanti të dhënat që lidhen me ecurinë e programit operativ në arritjen e objektivave specifike dhe synimeve për prioritet tematike, si ngritja e programit të bashkëpunimit ndërkufitar;

g) Krijojnë një sistem për të mbledhur informacion të besueshëm mbi zbatimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar;

h) Hartojnë raportet vjetore dhe finale të zbatimit siç janë përmendur në nenin 80 të Marrëveshjes Kuadër përkatëse në përputhje me nenin 3;

i) Të përgatisin dhe të zbatojnë një plan koherent për komunikim dhe vizibilitet;

j) Të hartojnë një plan vjetor të punës për Sekretariatit e Përbashkët Teknik, të miratuar nga KPM-ja.

#### Neni 3

### **Kërkesat e raportimit**

1. Për qëllimet e kërkesave të raportimit të përcaktuara në nenin 80 (1) të marrëveshjeve përkatëse Kuadër, strukturat operuese do të përdorin modelin e parashikuar në shtojcën III të kësaj marrëveshjeje financimi.

2. Për qëllim të kërkesave të përgjithshme të raportimit në Komision, të përcaktuar në nenin 58 të Marrëveshjes Kuadër dhe kërkesat specifike të raportimit nën menaxhimin e tërthortë, të përcaktuar në nenin 59 (1) të Marrëveshjes Kuadër përkatëse në raportin vjetor për zbatimin e ndihmës IPA II, NIPAC do të përdorë modelin e dhënë në shtojcën IIIA të kësaj marrëveshjeje financimi.

3. Për qëllim të kërkesave specifike të raportimit sipas menaxhimit të tërthortë të përcaktuar në pikën (a) të nenit 59 (2) të Marrëveshjes Kuadër mbi raportin vjetor financiar apo deklaratat, NAO si përfitues i IPA II që është Autoriteti Kontraktues do të përdorë modelin e parashikuar në shtojcën IV të kësaj marrëveshjeje financimi.

4. Për qëllim të nenit 59 (4) të Marrëveshjes Kuadër, NIPAC (KKIPA) si përfitues i IPA II që është Autoriteti Kontraktues, do t'i paraqesë Komisionit një raport përfundimtar mbi zbatimin e ndihmës së IPA II të Programit të Veprimit, jo më vonë se katër muaj pas disbursimit (pagesës) të fundit për kontraktuesit e saj ose përfituesit e granteve.

5. Për qëllim të nenit 59 (6) të Marrëveshjes Kuadër NOA (ZKA) si përfitues i IPA II që është Autoriteti Kontraktues, do të sigurojë deri më datë 15 janar të vitit financiar vijues, në format elektronik, një kopje të të dhënave të mbajtura në sistemin e kontabilitetit, themeluar sipas nenit 10 (5). Kjo duhet të mbështetet nga një raport i nënshkruar i paaudituar përmbledhës financiar, në përputhje me pikën (c) të shtojcën IV.

#### Neni 4

### **Vizibiliteti dhe komunikimi**

1. Siç parashikohet në dispozitat e nenit 24 (1), 76 (3) (k), dhe nenit 78 (f) të Marrëveshjes Kuadër përkatëse, përfituesit e IPA II duhet të përgatisin një plan koherent të aktiviteteve të vizibilitetit dhe të



komunikimit, të cilat do t'i paraqiten Komisionit për një marrëveshje, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje Financimi.

2. Këto aktivitete të vizibilitetit dhe komunikimit duhet të jenë në përputhje me Manualin e Komunikimeve dhe Vizibilitetit për veprimet e jashtme të BE-së, të përcaktuara dhe të publikuara nga Komisioni, në fuqi në kohën e aktiviteteve.

#### Neni 5

### **Të drejtat e pronësisë intelektuale**

1. Kontratat e financuara sipas kësaj marrëveshjeje financiare duhet të garantojnë që përfituesit e IPA II të fitojnë të gjitha të drejtat e nevojshme të pronësisë intelektuale në lidhje me teknologjinë e informacionit, studimet, skicat, planet, publicitetin dhe çdo material tjetër të bërë për qëllime të planifikimit, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit.

2. Përfituesi IPA II që është Autoriteti kontraktues, do të garantojë që Komisioni, ose dikush apo personi i autorizuar nga Komisioni, dhe përfituesit e të tjerë të IPA II, do të kenë qasje dhe të drejtën për të përdorur një material të tillë. Komisioni do ta përdorë një material të tillë vetëm për qëllimet e veta.

#### Neni 6

### **Pranueshmëria e shpenzimeve**

1. Shpenzimet e mëposhtme nuk do të jenë të pranueshme për financim sipas kësaj marrëveshjeje financiare:

- a) Borxhet dhe pagesat e shërbimit të borxhit (interesi);
- b) Dispozitat për humbje ose detyrime të mundshme në të ardhmen;
- c) Kostoja e deklaruar nga përfituesi dhe financiar nga një veprim apo program pune, që merr një grant nga Unioni;
- d) Humbjet e këmbimit të monedhës;
- e) Kreditë për palët e treta;
- f) Gjobat, sanksionet financiare dhe shpenzimet e procesit gjyqësor.

2. Blerja e tokës që nuk është e ndërtuar dhe e tokës me ndërtim në shumën deri në 10% të totalit të shpenzimeve të lejueshme për aktivitetin në fjalë, do të jetë e pranueshme për financim sipas ndihmës për bashkëpunim ndërkufitar IPA II, nëse ajo është e justifikuar nga natyra e veprimit dhe të dhënat në shtojcën I.

#### PJESA E DYTË

### **DISPOZITAT E ZBATUESHME TË MENAXHIMIT TË TËRTHORTË NGA PËRFITUESI IPA II**

#### Neni 7

### **Parime të përgjithshme**

1. Qëllimi i pjesës së dytë është të vendosë rregullat për zbatimin e Programit të Veprimit nën menaxhimin të tërthortë dhe në veçanti rregullat që lidhen me detyrat që i janë besuar zbatimit të buxhetit, siç përshkruhet në shtojcën I dhe për të përcaktuar të drejtat dhe detyrimet e përfituesit të IPA II që është Autoriteti Kontraktues dhe Komisioni në kryerjen e këtyre detyrave.

2. Siç parashikohet në pikën (b) të nenit 76 (3) të Marrëveshjes Kuadër përkatëse, përfituesit e IPA II, bashkërisht, duhet të përgatisin një marrëveshje dypalëshe dhe të sigurojnë zbatimin e saj.

3. Përfituesi i IPA II që nuk është Autoritet Kontraktues do të bashkëpunojë me përfituesin e IPA II që është Autoritet Kontraktues, për të siguruar se detyrat në vijim janë plotësuar:

- a) Të kryejnë ndjekjen operative dhe menaxhimin e operacioneve, siç parashikohet në pikën (b) të nenit 76 (4) të Marrëveshjes Kuadër;
- b) Të kryejnë verifikime në përputhje me nenin 76 (5) të Marrëveshjes Kuadër;
- c) Të mbrojnë interesin financiar të Unionit, siç parashikohet në nenin 51 të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 8

### **Procedurat e dhënies së prokurimit dhe granteve**

1. Detyrat e përmendura në nenin 7 (3) duhet të kryhen nga përfituesi i IPA II që është Autoritet Kontraktues, në përputhje me procedurat dhe dokumentet standarde të përcaktuara dhe të publikuara nga Komisioni për dhënien e prokurimit dhe kontratave të granteve, në veprimet e jashtme, në fuqi në kohën e fillimit të procedurës në fjalë (PRAG), si dhe në përputhje me standardet e kërkuara të Vizibilitetit dhe Komunikimit, të përmendura në nenin 4 (2).

2. Në përputhje me nenin 18 (2) të Marrëveshjes Kuadër, Komisioni do të pajisë përfituesin e IPA-II që është Autoritet Kontraktues, me udhëzime të mëtejshme, për përshtatjen e procedurave dhe dokumenteve standarde, të përcaktuara dhe të publikuara nga Komisioni për dhënien e kontratave të prokurimit dhe granteve në veprimet e jashtme, në rastin specifik të bashkëpunimit ndërkufitar.

3. Përfituesi IPA II që është Autoritet Kontraktues do të kryejë procedurat e prokurimit dhe dhënies së grantit, të lidhë kontratat që pasojnë dhe të sigurojë që të gjitha dokumentet përkatëse për gjurmët e auditimit janë në gjuhën e kësaj marrëveshjeje financimi.

4. Përfituesit e IPA II do të bashkëpunojnë plotësisht në vendosjen e komisioneve të vlerësimit, siç parashikohet në pikën (a) të nenit 76 (4) të Marrëveshjes përkatëse Kuadër.

5. Përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues do të informojë Komisionin, kur një kandidat, ofertues ose aplikant, është në një situatë përjashtimi nga pjesëmarrja në procedurat e dhënies së prokurimit dhe grantit, ose është konstatuar në shkelje të rëndë të detyrimeve të tij kontraktuale.

Në raste të tilla, pa qenë në kundërshtim me fuqinë e Komisionit për të marrë masa kundër një subjekti të tillë në bazë të Rregullores Financiare të zbatueshme, dënimet financiare të përmendura në dispozitat për dënimet administrative dhe financiare të Kushteve të Përgjithshme të prokurimit dhe kontratave të granteve, të lidhura nga përfituesi i IPA II që është Autoritet Kontraktues, mund të vendosen për kontraktuesit dhe përfituesit e granteve nga ky përfitues i IPA II, nëse kjo lejohet nga ligji i tij kombëtar.

Sanksionet e tilla financiare do të informohen pas një procedure opoence, duke siguruar të drejtën e mbrojtjes së kontraktuesit ose përfituesit të grantit. Përfituesi IPA II që është Autoritet Kontraktues, do të marrë parasysh informacionin që përmban Central Exclusion Database (Baza Qendrore e të Dhënave për Përjashtimin), gjatë dhënies së kontratave të prokurimit dhe granteve. Aksesit në informacione mund të sigurohet përmes pikës së ndërlidhjes (s) ose nëpërmjet konsultimeve me *Komisionin*<sup>18</sup> (Komisioni Evropian, Drejtoria e Përgjithshme për Buxhetin, nëpunësi i kontabilitetit të Komisionit, BRE2- 13/505, B-1049 Bruksel, Belgjikë dhe nga email-i: [BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu](mailto:BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu) së bashku me adresën e Komisionit, të identifikuar në nenin 3 të Kushteve të Veçanta).

6. Përfituesi i IPA II, që është Autoritet Kontraktues, do të mbajë të gjitha dokumentet ndihmëse financiare dhe kontraktuale përkatëse, nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje Financiare ose nga një datë më e hershme, në rast se procedurat e prokurimit, thirrjet për propozime ose procedurat e dhënies së granteve të drejtpërdrejta kanë nisur para hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje të Financimit:

**a. Për procedurat e prokurimit në veçanti:**

- a) Njoftim i mëparshëm me dëshminë e publikimit të njoftimit të prokurimit dhe të çdo korrigjimi;
- b) Caktimi i panelit të zgjedhur;
- c) Raporti i listës së të përzgjedhurve (përfshirë anekset) dhe aplikimet;
- d) Dëshmi e publikimit të njoftimit të listës së përzgjedhurve
- e) Letra e kandidatëve që nuk janë përzgjedhur;
- f) Ftesë për tender ose ekuivalentin e saj;
- g) Dosja e tenderit, duke përfshirë anekset, sqarimet, procesverbalet e mbledhjeve, dëshmitë e publikimit;
- h) Caktimi i komisionit të vlerësimit;
- i) Raporti për hapjen e tenderave, duke përfshirë anekset;
- j) Raporti i vlerësimit / negocimit, duke përfshirë anekset dhe ofertat e pranuar;<sup>19</sup>
- k) Letra e lajmërimit;
- l) Shkresë për dorëzimin e kontratës;
- m) Letrat për kandidatët pasuksesshëm;

<sup>18</sup> Përfituesi IPA II, do të lejohet që të ketë qasje të drejtpërdrejtë në Bazën Qendrore të të Dhënave të Përjashtimit (Central exclusion database) përmes një pikë ndërlidhëse, kur përfituesi i vërteton shërbimit të komisionit përgjegjës se ajo zbaton masat e mjaftueshme për mbrojtjen e të dhënave, siç parashikohet në Rregulloren (KE) Nr. 45/2001 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 18 dhjetor 2000, mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga institucionet dhe organet e Komunitetit dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave (OJ L 8, 12.1.2001, fq. 1).

<sup>19</sup> Eliminimi i ofertave të pa-suksesshme pesë vjet pas mbylljes së procedurës së prokurimit.

- n) Çmimi / njoftimi i anulimit, duke përfshirë edhe dëshminë e publikimit;
- o) Kontratat e nënshkruara, ndryshimet, dispozitat shtesë, raportet e zbatimit, dhe korrespondenca përkatëse.

**b. Për thirrjet për propozime dhe dhënien e drejtpërdrejtë të granteve në veçanti:**

- a) Emërimi i komisionit të vlerësimit;
- b) Raporti i hapjes dhe raporti administrativ, duke përfshirë shtojcat dhe aplikimet e marra;<sup>20</sup>
- c) Letrat për aplikantët e suksesshëm dhe të pasuksesshëm, pas vlerësimit të konceptit idesë;
- d) Raporti i vlerësimit të hartimit të shënimit;
- e) Raporti i vlerësimit të aplikimit të plotë, ose raporti i negocimit me shtojcat përkatëse;
- f) Kontrolli i pranueshmërisë dhe dokumentet e tjera shoqëruese;
- g) Letrat për aplikantët e suksesshëm dhe të pasuksesshëm me listën e aprovuar rezervë, pas vlerësimit të plotë të aplikimit;
- h) Shkresa për dorëzimin e kontratës së grantit;
- i) Dhënia / njoftimi i anulimit, me dëshmi të publikimit;
- j) Kontratat e nënshkruara, ndryshimet, dispozitat shtesë dhe korrespondencat përkatëse.

Përveç kësaj, dokumentet financiare dhe kontraktuale përmendur në paragrafin 6 (a) dhe (b) të këtij neni, do të plotësohet nga të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese përkatëse siç kërkohen nga procedurat e përmendura në pikën 1 të këtij neni, si dhe të gjithë dokumentacionin përkatës në lidhje me pagesat, rikuperimin dhe shpenzimet operative, për shembull raportet e projektit dhe raportet e kontrolleve të vendeve, pranimi i furnizimeve dhe punëve, sigurimet dhe garancitë, raportet e inxhinierëve të mbikëqyrjes. Të gjitha dokumentet përkatëse financiare dhe kontraktuale do të mbahen për të njëjtën kohëzgjatje, në përputhje me nenin 49 të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 9

**Kontrollet paraprake mbi procedurat e granteve dhe prokurimeve dhe kontrollet paraprake të kontratave dhe granteve që do të kryhen nga komisioni**

1. Komisioni mund të ushtrojë kontrolle paraprake (*ex ante*) për tenderimin e kontratave, hapjen e thirrjeve për propozime dhe dhënien e kontratave dhe granteve për fazat e mëposhtme të prokurimit ose dhënies së granteve:

- a) Për miratimin e njoftimeve të kontratës për prokurim, programet e punës për thirrjet për propozime dhe çdo korrigjim të tij;
  - b) Për miratimin e dosjeve të tenderit dhe udhëzimeve për aplikantët për grante;
  - c) Për miratimin e përbërjes së komisioneve të vlerësimit;
  - d) Për miratimin e raporteve të vlerësimit dhe vendimet e dhënies së kontratës<sup>21</sup>;
  - e) Për miratimin e dosjeve të kontratës dhe shtesa e kontratës.
2. Në lidhje me kontrollin paraprak, komisioni duhet të vendosë:
- a) Të kryejë kontrolle paraprake për të gjitha dosjet, ose
  - b) Të kryejë kontrolle paraprake në një përzgjedhje e këtyre dosjeve, ose
  - c) Të heqë dorë plotësisht nga kontrollet paraprake.

3. Nëse Komisioni vendos për të kryer kontrolle paraprake në përputhje me paragrafin 2, shkronjat (a) ose (b) të këtij neni, ai duhet të informojë përfituesin e IPA II që është Autoriteti Kontraktues i dosjeve të përzgjedhura për kontrollet paraprake. Ky përfitues i IPA II do të japë të gjithë dokumentacionin dhe informacionin e nevojshëm për Komisionin, pasi të informohet se një dosje është përzgjedhur për kontroll paraprak së fundi në kohën e dorëzimit të njoftimit të kontratës ose programit të punës për publikim.

4. Komisioni mund të vendosë për të kryer kontrolle të mëpasshme (*ex-post*), duke përfshirë auditimet dhe kontrollet e çastit, në çdo kohë, për ndonjë kontratë ose grantet e dhëna nga përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues, që rrjedh nga kjo marrëveshje financimi. Ky përfitues i IPA II do të të vërë në dispozicion të gjithë dokumentacionin dhe informacionin e nevojshëm për Komisionin pasi të informohet se kjo dosje është përzgjedhur për kontroll të mëpasshëm (*ex post*). Komisioni mund të autorizojë një person ose njësi ekonomike për të kryer kontrolle *ex post* në emër të saj.

<sup>20</sup> Eliminimi i aplikacioneve të pasuksesshme tre vjet pas përfundimit të procedurës së grantit.

<sup>21</sup>Për kontratat e shërbimit këto hapa që përfshijnë kontrollet paraprake, lidhen me miratimin e listës së përzgjedhur.

**Llogaritë bankare, sistemet e kontabilitetit, dhe kostoja e njohur**

1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje Financimi, Fondi Kombëtar dhe struktura operative e përfituesit të IPA II, që është Autoriteti Kontraktues për Programin e Veprimit, duhet të hapë të paktën një llogari bankare në Euro. Bilanci i përgjithshëm bankar për Programin e Veprimit do të jetë shuma e bilanceve në të gjitha llogaritë bankare të Programit të Veprimit, të mbajtura nga Fondi Kombëtar dhe të gjitha strukturat pjesëmarrëse që operojnë te përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues.

2. Përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues, do të përgatisë dhe të dorëzojë në Komision planet e parashikimit të disbursimit për kohëzgjatjen e periudhës së zbatimit të Programit të Veprimit. Këto parashikime duhet të përditësohet për raportin vjetor financiar të përmendur në nenin 3 (2) dhe për çdo kërkesë për fonde. Parashikimet do të bazohen në një analizë të dokumentuar dhe të detajuar (duke përfshirë edhe kontraktimin e planifikuar dhe orarin e pagesave sipas kontratës për dymbëdhjetë muajt në vijim), të cilat do të jenë në dispozicion të Komisionit në bazë të kërkesës.

3. Plani fillestar i parashikimit të disbursimit duhet të përmbajë përmbledhjen e parashikimit vjetorë të disbursimit për të gjithë periudhën e zbatimit dhe parashikimet mujore të disbursimit për dymbëdhjetë muajt e parë të Programit të Veprimit. Planet e mëvonshme duhet të përmbajnë përmbledhjen vjetore të parashikimeve të disbursimit për bilancin e periudhës së zbatimit të Programit të Veprimit dhe parashikimet mujore disbursimit për katërmëdhjetë muajt në vijim.

4. Përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues është i detyruar të krijojë dhe mirëmbajë një sistem të kontabilitetit në përputhje me pikën 2 (3) (b) të shtojca A të Marrëveshjes Kuadër, i cili do të mbajë të paktën informacionin për kontratat që menaxhohen nën Programin e Veprimit të përcaktuar në shtojcën V.

5. Kostoja e njohur në sistemin e kontabilitetit e mbajtur nën seksionin 4 të këtij neni, duhet të jetë e bërë, e paguar dhe e pranuar dhe të korrespondojë me kostot aktuale të provuara nga dokumentet mbështetëse dhe të përdoret kur është e përshtatshme për të nisur parafinancimin e paguar nga përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues sipas kontratave lokale.

6. Kostoja e njohur në sistemin e kontabilitetit do të shfrytëzohet nga Komisioni për njohjen e të përkohshme të kostos së saj, gjatë zbatimit të Programit të Veprimit (duke përfshirë autorizimin e parafinancimit që i paguhet përfituesit të IPA II, që është Autoriteti Kontraktues), për procesin e miratimit për pagesat, për autorizimin përfundimtar të procedurës së llogarive në fund të Programit të Veprimit, për praktikat vjetore të ndërprera dhe çdo zbatim tjetër të menaxhimit dhe të shqyrtimeve të performancës.

7. Përfituesi i IPA-II që është Autoriteti Kontraktues, do t'i sigurojë Komisionit raportet në vijim:

- a) Raporti Përmbledhës - siç është përcaktuar në nenin 3 (5);
- b) Raportet vjetore siç janë përcaktuar në paragrafët 2 deri 4, të nenit 3;
- c) Kërkesa për raportet e fondeve, siç përmenden në nenin 11.

**Dispozita për pagesat e bëra nga Komisioni për përfituesit IPA II që është Autoriteti Kontraktues**

1. Përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues, duhet të paraqesë parashikimin e tij fillestarë të disbursimit (pagesës) për Programin e Veprimit, të përgatitur në përputhje me nenin 10 (2), me kërkesën e parë për pagesë të parafinancuar. Pagesa e parë e parafinancimit do të bëhet për 100% të pagesës së parashikuar për vitin e parë të planit të parashikuar për disbursim.

2. Përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues, do të paraqesë kërkesa të vazhdueshme të pagesës së parafinancimit kur bilanci i përgjithshëm bankar për Programin e Veprimit bie nën pagesën e parashikuar për pesë muajt në vazhdim të Programit të Veprimit.

3. Çdo kërkesë për parafinancim shtesë do të mbështetet nga raportet e mëposhtme, në përputhje me pikat (a), (b) dhe (d) të shtojcës IV:

- a) Një deklaratë përmbledhëse e të gjitha pagesave të bëra për Programin e Veprimit;
- b) Balancat bankare për Programin e Veprimit në datën e caktuar të kërkesës;
- c) Një parashikim i pagesave për Programin e Veprimit për katërmëdhjetë muajt në vijim në datën e përcaktuar të kërkesës.

4. Përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë për çdo parafinancim pasues

shumën e totalit të disbursimeve të parashikimit për katërmëdhjetë muaj, pas datës së përcaktuar të kërkesës, pa balancat e referuara në nenin 3 (b) të këtij neni në datën e përcaktuar të kërkesës për fondet e rritura nga ndonjë shumë e financuar nga përfituesi IPA II, sipas paragrafit 5 të këtij neni, dhe që nuk është rimbursuar ende.

Komisioni gëzon të drejtën për të reduktuar çdo pagesë pasuese të parafinancimit, nëse tepricat totale bankare të mbajtura nga përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues në bazë të këtij programi dhe në të gjitha programet e tjera të IPA I apo të IPA II, të cilat menaxhohen nga përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues, tejkalon parashikimin e disbursimit për katërmëdhjetë muajt e ardhshëm.

5. Në rastet kur pagesa është reduktuar sipas paragrafit 4 të këtij neni, përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues duhet ta financojë programin nga burimet e veta, deri në shumën e reduktimit. Përfituesi i IPA II që është Autoriteti kontraktues më pas mund të kërkojë rimbursimin e këtij financimi, si pjesë e kërkesës së ardhshme për fonde të përcaktuara në paragrafin 4 të këtij neni.

6. Komisioni ka të drejtë për të rimarrë balancat e tepërta bankare, të cilat kanë mbetur të papërdorura për më shumë se dymbëdhjetë muaj. Para se të ushtrojë këtë të drejtë, Komisioni e fton përfituesin e IPA II që është Autoriteti Kontraktues, për të dhënë arsyet e vonës në disbursimin e fondeve dhe të demonstrojë nevojën për to në vazhdim gjatë dy muajve të ardhshëm.

7. Nuk duhet të jetë shkak interesi i gjeneruar nga parafinancimi bilanceve bankare të Programit të Veprimit.

8. Sipas nenit 33 (4) të Marrëveshjes Kuadër, kur ndërprerja e afatit për kërkesën për pagesë tejkalon dy muaj, përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë një vendim nga Komisioni nëse ndërprerja e afatit duhet vazhdojë.

9. Deklarata financiare përfundimtare e përmendur në nenin 37 (2) të Marrëveshjes Kuadër do të dorëzohet nga NOA (ZKA) jo më vonë se 16 muaj pas përfundimit të periudhës së zbatimit operativ.

#### Neni 12

##### **Ndërprerja e pagesave**

1. Pa cenuar pezullimin ose përfundimin e kësaj Marrëveshjeje Financimi sipas neneve 16 dhe 17 përkatësisht dhe krahas nenit 39 të Marrëveshjes Kuadër, Komisioni mund të ndërpresë pagesat pjesërisht ose plotësisht, në qoftë se:

a) Komisioni ka vendosur, ose paraqet shqetësime serioze, pasi përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues, ka bërë gabime të konsiderueshme, ka parregullsi apo mashtrime që vënë në dyshim ligshmërinë ose rregullsinë e transaksioneve në fjalë, në zbatimin e Programit të Veprimit, ose ka dështuar të përmbushë detyrimet e tij sipas kësaj marrëveshjeje financiare;

b) Komisioni ka vendosur, ose paraqet shqetësime serioze, nëse përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues ka kryer gabime sistematike ose të përsëritura, ose ka parregullsi, mashtrime, apo shkelje të detyrimeve, në këtë ose në të tjera marrëveshje financimi, me kusht që ato gabime, parregullsi, mashtrime, ose shkelje të detyrimeve të kenë një ndikim material në zbatimin e kësaj marrëveshjeje financiare apo vënë në dyshim besueshmërinë e sistemit të kontrollit të brendshëm të përfituesit të IPA II, ose ligshmërinë dhe rregullsinë e shpenzimeve bazë;

#### Neni 13

##### **Mbulimi i fondeve**

1. Përveç rasteve të përmendura në nenin 41 të Marrëveshjes Kuadër, Komisioni mund të rimarrë fondet nga përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues, siç parashikohet në rregulloren financiare, veçanërisht në rast se:

a) Komisioni vendos se objektivat e Programit të Veprimit të përcaktuara në shtojcën I nuk janë arritur;

b) shpenzimet janë të papërshtatshme;

c) shpenzimet janë shkaktuar si rezultat i gabimeve, parregullsive, mashtrimeve apo shkeljeve të detyrimeve në zbatimin e Programit të Veprimit, në veçanti në procedurën e dhënies së prokurimit dhe granteve.

2. Në përputhje me ligjin kombëtar, përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues, do të rimarrë kontributin e Unionit që i paguhet përfituesit të IPA II që është Autoriteti Kontraktues nga marrësit të cilët janë në një prej situatave të përcaktuara në paragrafin 1 pika b) ose c) të këtij neni ose të referuara në nenin

41 të Marrëveshjes Kuadër. Fakti se përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues nuk ka sukses në kthimin e të gjithë ose një pjese të fondeve, nuk do ta pengojë Komisionin për rikuperimin e fondeve nga përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues.

3. Përfituesi i IPA II që nuk është Autoriteti Kontraktues, do të bëjë përpjekje maksimale për të mbështetur përfituesin e IPA-II që është Autoriteti Kontraktues, në rimëkëmbjen e saj, kur përfituesi vendoset në territorin e tij. Marrëveshja për rikuperimin do të parashikohet në një marrëveshje dypalëshe, e cila do të lidhet në përputhje me nenin 69 të Marrëveshjeve Kuadër përkatëse.

4. Shumat e paguara padrejtësisht apo të mbuluara nga përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues, shumat e garancive financiare, performancës dhe parafinancimit, të paraqitura në bazë të prokurimit dhe dhënies së procedurave të granteve, shumat nga gjobat e vendosura nga përfituesi IPA II që është Autoriteti Kontraktues për kandidatët, ofertuesit, aplikantët, kontraktuesit ose përfituesit e granteve, paguar për përfituesit e IPA II që është Autoriteti Kontraktues ose do të ri-përdoren për Programin e Veprimit, ose do t'i kthehen Komisionit.

## PJESA E TRETË DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

### Neni 14

#### **Konsultime ndërmjet përfituesve të IPA II dhe Komisionit**

1. Përfituesit e IPA II dhe Komisioni do të konsultohen me njëri tjetrin para se të krijojnë mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin ose interpretimin e mëtejshëm të kësaj Marrëveshjeje Financimi në përputhje me nenin 18 të këtyre Kushteve të Përgjithshme.

2. Kur Komisioni vihet në dijeni për problemet në kryerjen e procedurave që lidhen me zbatimin e kësaj Marrëveshjeje Financimi, ai duhet të krijojë të gjitha kontaktet e nevojshme me përfituesit e IPA II për të korrigjuar situatën dhe të ndërmarrë hapat që janë të nevojshëm.

3. Konsultimi mund të çojë në një ndryshim, në pezullimin ose përfundimin e kësaj marrëveshjeje financimi.

4. Komisioni do të informojë rregullisht përfituesit e IPA II për zbatimin e aktiviteteve të përshkruara në shtojcën I, të cilat nuk përfshihen në pjesën e dytë të këtyre Kushteve të Përgjithshme.

### Neni 15

#### **Ndryshimi i kësaj Marrëveshjeje Financimi**

1. Çdo amendament i kësaj marrëveshjeje financiare, duhet të bëhet me shkrim.

2. Nëse përfituesit e IPA II kërkojnë një amendament, kërkesa duhet t'i paraqitet bashkërisht Komisionit të paktën gjashtë muaj para se ndryshimi që kërkohet të hyjë në fuqi.

3. Komisioni mund të amendojë *Dokumentet Model* në shtojcën III, IIIA, IV dhe V, pa nevojën e një amendamenti të kësaj marrëveshjeje financiare. Përfituesit e IPA II do të informohen me shkrim për çdo amendament të tillë dhe për hyrjen e tij në fuqi.

### Neni 16

#### **Pezullimi i kësaj Marrëveshjeje Financimi**

1. Zbatimi i kësaj marrëveshjeje financiare mund të pezullohet në rastet e mëposhtme:

a) Nëse ndonjë përfitues IPA II shkel një detyrim sipas kësaj marrëveshjeje financiare.

b) Nëse përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues shkel ndonjë detyrim të përcaktuar në bazë të procedurave dhe dokumenteve standarde të përmendura në nenin 18 (2) të Marrëveshjes Kuadër përkatëse, pa cenuar dispozitat në nenin 8 (2).

c) Nëse përfituesi i IPA II që është Autoriteti Kontraktues nuk i plotëson kërkesat e për zbatimin e detyrave të buxhetit të besuar.

d) Nëse përfituesit e IPA II nuk i përmbushin bashkërisht funksionet dhe përgjegjësitë e përmendura në nenin 2 (1) dhe kur është e mundur edhe menaxhimin të tërthortë sipas nenit 7 (3).

e) Nëse ndonjë përfitues i IPA II vendos të pezullojë ose të ndërpresë procesin e pranimit të anëtarësimit në BE.

f) Nëse ndonjë përfitues i IPA II shkel një detyrim në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut,

parimet demokratike dhe shtetin ligjor, si dhe në raste të rënda të korrupsionit.

g) Në rastet e forcës madhore, siç përcaktohet më poshtë. "Forcë Madhore" do të thotë çdo situatë e paparashikueshme dhe e jashtëzakonshme, ose ngjarje përtej kontrollit të palëve, e cila pengon secilën prej tyre në përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve të tyre, gjë që nuk i atribuohet gabimit ose pakujdesisë nga ana e tyre (ose pjesës së kontraktuesve të tyre, agjentëve ose të punësuarve) dhe vërteton mosrregullimin e situatës, pavarësisht se janë bërë përpjekjet e duhura. Defektet në pajisje ose materiale, ose vonesat e tyre të mundshme, mosmarrëveshjet e punës, grevat ose vështirësitë financiare, nuk mund të përdoren si forcë madhore. Një palë nuk duhet të konsiderohet si shkelëse e obligimeve të saj nëse ajo është penguar nga përmbushja e tyre për shkak të një force madhore, për cilën pala tjetër është informuar siç duhet. Një palë që përballet me një forcë madhore duhet ta informojë palën tjetër pa vonesë, duke deklaruar natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektet e parashikueshme të problemit, si edhe të marrë çdo masë për të minimizuar dëmet e mundshme.

Asnjëra prej palëve nuk do të konsiderohet përgjegjëse për shkelje të detyrimeve të veta sipas kësaj Marrëveshjeje Financiare, nëse është penguar nga përmbushja e tyre nga forca madhore, me kusht që ajo palë të marrë masa për të minimizuar dëmtimet e mundshme.

2. Komisioni mund ta pezullojë këtë Marrëveshje Financimi pa njoftim paraprak.

3. Komisioni mund të marrë masat e duhura parandaluese para se të bëhet pezullimi.

4. Kur pezullimi është njoftuar, duhet të tregohen pasojat e prokurimit dhe kontratave të granteve në vazhdim dhe marrëveshjet e delegacionit për këto kontrata si dhe marrëveshjet që duhen nënshkruar për këto kontrata.

5. Pezullimi i kësaj marrëveshjeje të financimit nuk e cenon ndërprerjen e kësaj marrëveshjeje financimi nga Komisioni, në përputhje me nenin 17.

6. Palët do të rifillojnë zbatimin e Marrëveshjes Financiare sapo kushtet ta lejojnë, me miratimin paraprak me shkrim të Komisionit. Kjo nuk cenon asnjë amendim të kësaj marrëveshjeje financiare që mund të jenë të nevojshme për të përshtatur Programin e Veprimit për kushtet e reja zbatuese, duke përfshirë, nëse është e mundur, zgjatjen e periudhës së zbatimit, ose përfundimin e kësaj marrëveshjeje financiare në përputhje me nenin 17.

#### Neni 17

### **Përfundimi i kësaj marrëveshjeje financiare**

1. Nëse çështjet të cilat çuan në pezullimin e Marrëveshjes së Financimit nuk janë zgjidhur brenda një periudhe maksimale prej 180 ditëve, secila palë mund ta përfundojë Marrëveshjen Financiare në njoftimin prej 30 ditësh.

2. Kjo Marrëveshje Financimi do të ndërpritet automatikisht, në qoftë se brenda një periudhe prej dy vjet që prej nënshkrimit të saj:

a) Nuk është bërë asnjë pagesë;

b) Nuk është nënshkruar asnjë kontratë zbatimi apo marrëveshje delegacioni.

3. Kur ndërprerja është njoftuar, duhet të tregohen pasoja e prokurimeve dhe kontratave të granteve në vazhdim dhe kontratat ose grantet e tilla që duhen nënshkruar.

4. Përfundimi i kësaj marrëveshjeje financiare nuk do të përjashtojë mundësinë e Komisionit që të bëjë korrigjime financiare në përputhje me nenet 43 dhe 44 të Marrëveshjes Kuadër.

#### Neni 18

### **Masat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve**

1. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me Marrëveshjen e Financimit që nuk mund të zgjidhet brenda një periudhe gjashtëmujore nga konsultimet midis palëve, të parashikuara në nenin 14 mund, të zgjidhet nga arbitrazhi, me kërkesën e njëres prej palëve.

2. Secila palë do të caktojë një gjyqtar brenda 30 ditëve nga data e kërkesës për arbitrazh. Nëse kjo nuk arrihet, secila palë mund t'i kërkojë Sekretarit të Përgjithshëm të Gjykatës së Përhershme të Arbitrazhit (Hagë) të caktojë një gjyqtar të dytë. Të dy gjyqtarët nga ana e tyre caktojnë një gjyqtar të tretë brenda 30 ditëve. Nëse kjo nuk arrihet, secila palë mund t'i kërkojë Sekretarit të Përgjithshëm të Gjykatës së Përhershme të Arbitrazhit të caktojë gjyqtarin e tretë.

3. Përveç kur arbitrat vendosin ndryshe, do të zbatohen procedurat e parashikuara në Gjykatën e

Përhershme të Arbitrimit, rregullat opsionale për Arbitrazhin që përfshijnë organizatat ndër-kombëtare dhe shtetet.

4. Secila palë do të jetë e detyruar të marrë masat e nevojshme për zbatimin e vendimit të gjyqtarëve.

**MODEL**  
**i Raportit Vjetor të BNK-së mbi zbatimin**  
**e Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II ndërmjet përfituesve të IPA II**  
**(neni 80 i Marrëveshjes Kuadër)**

**1. Identifikimi**

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMI NDËRKUFITAR        | Titulli i Programit:<br>Programi ndërkufitar <vendi A> – <vendi B><br><viti>/<viti>     |
|                             | Përfitimi për vitin 20xx:                                                               |
|                             | Përfitimi për vitin 20xx:                                                               |
|                             | Përfitimi për vitin 20xx:                                                               |
|                             |                                                                                         |
| RAPORTI VJETOR MBI ZBATIMIN | Viti i Raportimit (nga 1 janari 20xx deri 31 dhjetor 20xx)                              |
|                             | Përgatitur nga:<br>– <struktura operative, vendi X><br>– <struktura operative, vendi Y> |
|                             | Data e shqyrtimit të raportit vjetor nga Komiteti i Përbashkët Monitorues               |

Baza ligjore: neni 80 i Marrëveshjes Kuadër të IPA II

**2. Përmbledhje mbi zbatimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar**

*2.1 Arritjet dhe analiza e progresit*

- Përmbledhje mbi zbatimin e programit gjatë periudhës së mbuluar (aktivitetet e kryera, thirrjet e bëra, forumet për të kërkuar partnerë, takimet mbi KGM (Komunikimin me Gazetarët dhe Median) etj.).

- Nëse dubet, të përfshihet edhe informacion mbi përgatitjen apo rishikimin e programit 2014–2020

*2.2 Progresi në zbatimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar (neni 80.1a IPA II FWA)*

Progresi i bërë në zbatimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar dhe në veçanti në arritjen e objektivave specifike për çdo prioritet tematik (si dhe për prioritetin e Asistencës Teknike), duke përfshirë edhe elementet cilësore dhe sasiorë që tregojnë përparim në lidhje me objektivat.

*2.2.1 Analiza sasiorë*

- Informacion mbi progresin e bërë në zbatimin e programit ndërkufitar, me përcaktimet sasiorë kur është e mundur, duke përdorur objektivat dhe treguesit që përfshihen në program (**plotësoni shtojcën 1**).

*Analizë e arritjeve sipas matjeve nga treguesit fizikë dhe financiarë. Treguesit do të ndahen sipas gjinisë, kur është e mundur.*

*Nëse shifrat (të dhënat) nuk janë vënë akoma në dispozicion, dubet të jepet informacion se kur do të vihen në dispozicion dhe kur do të përfshihen në raportin vjetor mbi zbatimin. Gjithashtu, informacioni mund të paraqitet grafikisht.*

*2.2.2. Analiza cilësore*

- Analiza cilësore e progresit të bërë në zbatimin e programit ndërkufitar, duke përfshirë një analizë të ndikimit të programit në zonën e programit

*2.3 Informacione të hollësishme për ekzekutimin financiar të programit të bashkëpunimit ndërkufitar (neni 801 (d) IPAll*



FWA)<sup>22</sup>

- Informacion mbi kontraktimin dhe ndarja e përfitimeve vjetore (**\*\*\* plotësoni shtojcën 2).**

- Analiza e faktorëve të mëposhtëm:

- Statusi financiar;

- Informacion mbi bashkëfinancimet;

- Faktorët që kanë penguar dhe/ose vonuar zbatimin financiar;

- Faktorët që kanë pasur ndikim pozitiv në zbatimin financiar.

2.4 Informacion mbi hapat e ndërmarra nga strukturat operuese dhe/ose Komiteti i Përbashkët Monitorues për të siguruar cilësinë dhe efektivitetin e zbatimit:

#### 2.4.1 Monitorimi dhe vlerësimi

- Masat monitoruese të ndërmarra nga strukturat operuese ose Komiteti i Përbashkët Monitorues përfshijnë marrëveshjet për mbledhjen e të dhënave.

- Në programet e zbatuara me masa të tërthorta të vlerësimit të menaxhimit të ndërmarra nga struktura operuese aty ku ndodhet Autoriteti kontraktues (neni 57 i FWA-së).

#### 2.4.2 Problemet e hasura dhe veprimet korrigjuese

- Përmbledhje e çdo problemi të rëndësishëm të hasur në zbatimin e programit dhe çdo veprimi korrigjues të ndërmarrë.

- Rekomandime për veprime (të mëtejshme) korrigjuese.

#### 2.5 Vizibiliteti dhe publiciteti

- Masat e marra për të siguruar dukshmërinë dhe reklamimin e programit (planin e vizibilitetit), duke përfshirë shembuj të praktikave më të mira dhe duke theksuar ngjarjet e rëndësishme.

#### 2.6 Shfrytëzimi i Asistencës Teknike

- Shpjegim i detajuar i shfrytëzimit të Asistencës Teknike

- Përmbledhje e çdo problemi të rëndësishëm të hasur në zbatimin e buxhetit TA

#### 2.7 Ndryshimet në kuadër të zbatimit të programit ndërkufitar (nëse ka)

- Përshkrimi i çdo elementi i cili edhe pse nuk rrjedh drejtpërdrejt nga ndihma, ka një ndikim të drejtpërdrejtë në zbatimin e programit (p.sh. ndryshimet ligjore, ndryshimet socio-ekonomike përkatëse etj.).

\*\*\* - përfshini një aneks 2 - listën e projekteve dhe një përmbledhje të shkurtër.

Periodha e mbuluar nga raporti: 01/01/20XX-31/12/20XX

Raport i lëshuar më XX/XX/20XX

Raport vjetor mbi zbatimin e ndihmës IPA II nën menaxhim të tërthortë nga ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, i paraqitur nga Koordinatori Kombëtar i IPA-së

#### I. Përmbledhje ekzekutive

1. Referencë e objektivave të Dokumenteve Strategjike të Vendit dhe një pasqyrë e shkurtër e sfidave të sektorëve

2. Përfshirja në programim

3. Marrëdhëniet me Komisionin Evropian.

4. Problemet që hasen në përmbushjen e kushteve të nevojshme për zbatimin dhe në sigurimin e qëndrueshmërisë, në lidhje me masat e marra/të planifikuara, rekomandimet për veprime të mëtejshme.

5. Çështje të rëndësishme që rrjedhin nga pjesëmarrja e përfituesit të IPA II në komitetin monitorues të IPA-së dhe në komisionet sektoriale të monitorimit (duke përfshirë Komitetin e Përbashkët të Monitorimit për BNK-në), nëse ka.

6. Përfshirja në veprimet shumë-vendëshe dhe çdo çështje që lidhet me to.

7. Aktivitete monitorimi dhe vlerësimi, mësimet kryesore që janë nxjerrë dhe ndjekja e rekomandimeve.

8. Aktivitetet mbi komunikimin dhe vizibilitetin.

9. Koordinimi i donatorëve

Në rastet e menaxhimit të tërthortë, përmbledhja ekzekutive duhet të përmbajë gjithashtu:

10. Zbatimin e gjithanshëm të asistencës së IPA-së nën menaxhim të tërthortë (maksimumi një faqe).

11. Problemet kryesore horizontale të hasura në zbatimin e asistencës së IPA-së dhe masat përkatëse të marra/planifikuara (maksimumi gjysmë faqe).

<sup>22</sup> Ky paragraf do të përfshihet në raporte vetëm në rastin e menaxhimit të tërthortë.

12. Rekomandimet për veprime të mëtejshme (maksimumi gjysmë faqe).
13. Auditimet – gjetjet kryesore, rekomandimet dhe veprimet korrigjuese të ndërmarra.

## II. Informacion sipas sektorëve

Titulli i sektorit<sup>23</sup>: [*Transporti*]

Pjesa përshkruese: përmbledhje mbi sektorin, duke përfshirë informacionin e mëposhtëm:

1. Përfshirja në programim
2. Përmbledhje e rezultateve gjatë lëvizjes drejt një qasjeje të sektorit me të drejta të plota (d.m.th. objektivat e arritur sipas treguesve të sektorit në dokumentin e planifikimit të Sektorit).
3. Koordinimi me instrumente të tjera dhe /ose donatorë / IFI-të brenda sektorit
4. Ndikimi i veprimeve të IPA II brenda sektorit mbi zhvillimin e kapaciteteve përkatëse kombëtare administrative në atë sektor, në planifikimin strategjik dhe buxhetimin.

*Nën menaxhim të tërthortë duhet të përfshihet dhe informacioni i mëposhtëm:*

5. Struktura/t operative dhe ndryshimet që lidhen me to, nëse ka: [*Ministria e Transportit*];
6. Informacion mbi zbatimin e programeve në atë sektor;
7. Arritjet kryesore në atë sektor;
8. Çdo problem i rëndësishëm që haset gjatë zbatimit të detyrave të besuara p.sh. vonesat në kontraktim dhe masat të marra/planifikuara në vijim;
9. Rekomandime për veprime të mëtejshme;
10. Aktivitetit monitoruese dhe vlerësuese të kryera, auditimet - gjetjet kryesore dhe mësimet e nxjerra, rekomandimet, ndjekja dhe veprimet korrigjuese të ndërmarra.

**Titulli i sektorit: bashkëpunimi ndër-kufitar<sup>24</sup>**

1. Përfshirja në programim, sipas rastit;
2. Progresi i bërë në zbatimin e Programit Ndërkufitar dhe në veçanti në arritjen e objektivave specifike sipas prioritetëve tematike (duke përfshirë edhe elemente sasiore dhe cilësore që tregojnë progres në lidhje me objektivat);
3. Një përmbledhje e problemeve të hasura në zbatimin e programit të BNK-së dhe çdo veprim korrigjues i ndërmarrë, si dhe rekomandime për veprime të mëtejshme korrigjuese;
4. Monitorimi, duke përfshirë edhe marrëveshjet e grumbullimit të të dhënave dhe kur është e zbatueshme, edhe aktivitetet e vlerësimit;
5. Aktivitetet mbi komunikimin dhe vizibilitetin;
6. Koordinimi me vendin partner.

*Nën menaxhim të tërthortë, duhet të përfshihet edhe informacioni i mëposhtëm:*

1. Struktura operative ekzistuese dhe ndryshimet që lidhen me të, nëse ka;
2. Çdo problem i rëndësishëm që haset në zbatimin e detyrave të besuara, p.sh.: vonesat në kontraktim dhe masat pasuese të ndërmarra/të planifikuara;
3. Rekomandime për veprime të mëtejshme;
4. Auditimet e kryera - gjetjet kryesore dhe rekomandimet, si dhe masat korrigjuese të ndërmarra.

<sup>23</sup> Sipas sektorëve në Dokumentet treguese të Strategjisë.

<sup>24</sup> Për Bashkëpunimin Ndërkufitar kërkohet raportim specifik.

II a. Treguesit e performancës në sektorin [*p.sh. transporti*] që mbulon menaxhimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë:  
Treguesit<sup>25</sup> për program

| Marrëveshja e Financimit /Programi referues <sup>26</sup> | Treguesi për sektor [ <i>Transporti</i> ]                                                                               | Burimi | Linja bazë | Objektivi (2017) | Objektivi (2020) | Vlera (2014 <sup>27</sup> ) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>2014 Programi i vendit</i>                             | <i>Reduktimi i koshës mesatare të udhëtimit për udhëtarët ndërmjet qendrave kryesore urbane nga lloji i transportit</i> |        |            |                  |                  |                             |
| <i>2014-20xx Programi shumëvjeçar</i>                     | <i>Kosto të reduktuara transporti për njësi produkti</i>                                                                |        |            |                  |                  |                             |

II b. Përmbledhje në nivel veprimi për sektorin [*p.sh. transportin*]

| Marrëveshja e Financimit /Programi referues | Veprimi                                                          | Gjendja / Progresi për një veprim të caktuar (p.sh. po përgatiten Termat e Referencës, tenderi është shpallur, kontraktuar, po zbatohet, është përfunduar)                                                       | Arritjet kryesore dhe vlerësimi i tyre | Probleme të rëndësishme të hasura në zbatimin e detyrave të besuara dhe masat e marra / të planifikuara për kapërcimin e tyre                                              | Zhvillimet që ndikojnë në zbatimin në të ardhmen                                                       | Rekomandime për veprime të mëtejshme korrigjuese |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>[2014 Programi i vendit]</i>             | <i>Elektrifikimi i linjës bekurudhore nga xxx në kuqi me xxx</i> | <i>p.sh. Kontratë shërbimi për përgatitjen e Termave të Referencës për punimet që kontrata është nënshkruar dhe po zbatohet, tender për kontratën e punëve që do të fillojnë tremujorin e dytë të vitit 2015</i> |                                        | <i>p.sh. Kontrata e shërbimit për përgatitjen e Termave të Referencës për punime që kontrata është vonuar, meqë procedura e negocimit dështoi dhe u nevojit të ribëhej</i> | <i>p.sh. ndryshimi i ligjit të vendit, si dhe qasja dhe zbatimi i paketës së katërt të bekurudhave</i> |                                                  |

<sup>25</sup> Ky duhet të jetë kryesisht rezultati, si dhe treguesit përkatës të zgjedhur të produktit

<sup>26</sup> Ai duhet të jetë në përputhje me mënyrën e programimit (vjetore, shumëvjeçare me ose pa detyra të ndara), si dhe me raportin e NAO-s

<sup>27</sup> Numri i kolonave duhet të përshtatet për të gjitha vitet, nga viti 2014 deri në vitin e periudhës së raportimit. Vlerat duhet të jenë kumulative.

*Nën menaxhim të tërthortë duhet të sigurohen dhe shtojcat e mëposhtme:*

### **Shtojca 1**

Përmbledhje mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit dhe menaxhimit (duke përfshirë ndryshimet në strukturën institucionale) (maksimumi një faqe).

Aktivitetet mbi transparencën, vizibilitetin, informacionin dhe komunikimin, në përputhje me FWA-në (maksimumi një faqe).

### **Shtojca 2**

Historitë e suksesshme (Kujdes! Ky seksion mund të përdoret për raportin vjetor të asistencës financiare të përgatitur nga Komisioni Evropian).

### **Shtojca 3**

Plani vjetor i prokurimit

*Si për menaxhimin e drejtpërdrejtë dhe atë të tërthortë, duhet të paraqitet shtojca e mëposhtme.*

### **Shtojca 4**

Udhërrëfyes i Qasjes Sektoriale - arritjeve (duke theksuar nëse janë përmbushur apo jo objektivat e planifikuar).
